

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TRIWULAN II
2018



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN II TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI	1
TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG	3
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5
▪ <i>STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)</i>	7
BADAN PENGUSAHAAN BATAM	11
▪ <i>DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT</i>	13
KEMENTERIAN AGAMA	15
▪ <i>THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)</i>	17
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	21
▪ <i>VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME</i>	23
▪ <i>VILLAGE INNOVATION PROJECT</i>	25
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	27
▪ <i>SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT</i>	29
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33
▪ <i>IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II</i>	35
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	37
▪ <i>ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)</i>	41
▪ <i>REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)</i>	44
▪ <i>DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT</i>	48
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT</i>	51
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II</i>	53
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG</i>	55
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU</i>	57
▪ <i>TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT</i>	58
▪ <i>WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)</i>	60
▪ <i>EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT</i>	65
▪ <i>IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS</i>	67
▪ <i>METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)</i>	69
▪ <i>METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA</i>	72
▪ <i>METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)</i>	74
▪ <i>NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015</i> ..	77
▪ <i>NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT</i>	79
▪ <i>NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)</i>	82

▪ NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2).....	84
▪ RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREAS DEVELOPMENT (RISE II)	86
▪ SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA	87
▪ SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II).....	90
▪ SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III).....	92
▪ SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANTS FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER).....	94
▪ BALI BEACH CONSERVATION PROJECT (PHASE 2).....	99
▪ CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT	100
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I.....	102
▪ COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II.....	104
▪ DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II	105
▪ FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN	107
▪ INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP).....	109
▪ JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)	111
▪ KOMERING IRRIGATION PROJECT (PHASE 3)	114
▪ RENTANG IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT.....	115
▪ UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT	116
▪ URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES.....	118
▪ URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II.....	120
▪ WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II).....	121
▪ NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)	125
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	127
▪ THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I.....	129
▪ JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I	131
▪ PATIMBAN PORT DEVELOPMENT PROJECT (I).....	132
▪ PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)	133
▪ RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I.....	134
KEMENTERIAN PERTANIAN	137
▪ INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP).....	139
▪ RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE (READSI).....	142
▪ SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)	144
▪ SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)	146
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	149
▪ PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV	151

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.....	153
▪ DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY III.....	155
▪ DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA.....	158
▪ DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY WITH SOCIO ENTREPRENEURIAL SPIRIT AT UNIVERSITAS GAJAH MADA.....	160
▪ HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT.....	161
▪ POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT.....	163
▪ THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT.....	166
▪ THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT.....	168
▪ THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1).....	171
▪ RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO).....	175
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	177
▪ FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE.....	179
▪ INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE.....	181
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.....	183
▪ CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI).....	185
PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII).....	187
▪ INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF).....	189
PT. PERTAMINA.....	191
▪ GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT.....	193
▪ LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT.....	194
PT. PLN.....	197
▪ ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT III.....	199
▪ ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION.....	201
▪ GDAP (HULULAIS GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)).....	202
▪ INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I).....	203
▪ INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S).....	206
▪ JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT.....	208
▪ JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT.....	211
▪ PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT.....	213
▪ PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT.....	215
▪ PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT.....	217
▪ SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II).....	219
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3.....	223
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7.....	225
▪ SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8.....	227
▪ STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID.....	229
▪ WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT.....	230
▪ TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT.....	233
▪ TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S).....	235

▪	UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)	237
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI).....		239
▪	ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT	241
▪	REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)	242
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.....		243
▪	CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT.....	245
▪	CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE II	247
LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING.....		249
KEMENTERIAN PERTAHANAN		251
▪	PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	253
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA		255
▪	PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	257
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI.....		259
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		261
▪	BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM..	263
▪	FOREST PROGRAMME I.....	265
▪	FOREST PROGRAMME II.....	267
▪	FOREST PROGRAMME III	269
▪	SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO.....	271
▪	COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1).....	274
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....		275
▪	ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)	277
▪	SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)	280

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

- 1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 2 Badan Pengusahaan Batam
- 3 Kementerian Agama
- 4 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 5 Kementerian Ketenagakerjaan
- 6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 7 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 9 Kementerian Perhubungan
- 10 Kementerian Pertanian
- 11 Kementerian PPN/Bappenas
- 12 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 14 Kepolisian Republik Indonesia
- 15 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 16 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)
- 17 PT. PERTAMINA
- 18 PT. PLN
- 19 PT. Sarana Multi Infrastruktur
- 20 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 21 Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing

TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG

No.	Mata Uang	Kode	Nilai *
			29 Juni 2018
1.	Australian Dollar	AUD	1,36
2.	Euro	EUR	0,86
3.	Indonesian Rupiah	IDR	14.404
4.	Japanese Yen	JPY	110,48
5.	Korean Won	KRW	1.119,19

**) Kurs Tengah Bank Indonesia*



BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)
Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2927-INO	19/02/2013 s/d 31/03/2019	USD	57,8	53,7	93,0	4,1	5,3	10,1	7,7	76,1



Pertemuan tim STAR dan ADB dengan Pengelola Program Studi di Universitas Sumatera Utara

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Improve capacity of government internal auditors and public finance officers
- Development of e-learning system and module
- Institutional strengthening through system improvement

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Usulan perpanjangan pinjaman dari sebelumnya tutup pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi 31 Maret 2019 telah disetujui oleh ADB. Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2019 meliputi penguatan *output* STAR dan penyelesaian penutupan pinjaman. Proses persiapan penutupan pinjaman sudah dapat dimulai, termasuk untuk kalkulasi pinjaman dan penyusunan *Project Completion Report* (PCR).

Pelaksanaan Komponen Kegiatan. Secara rinci, kemajuan pelaksanaan kegiatan STAR hingga Triwulan II 2018 adalah sebagai berikut:

1. In-Country Degree Programme

Jumlah peserta kegiatan Program Gelar yaitu sebanyak 3.475 orang yang terdiri dari 823 orang peserta program S1 dan 2.652 orang peserta program S2. Dari total tersebut, sebanyak 3.391 peserta telah lulus sehingga target *output* lulusan sebanyak 2.500 orang telah tercapai.

2. Non Degree Programme (Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi)

Capaian kegiatan secara kumulatif dari tahun 2013 sampai dengan Triwulan II 2018 mencapai 19.416 peserta diklat JFA (10.596 orang), Non JFA (754 orang), dan Teknis Substansi (8.066 orang), melebihi target 9.800 orang.

3. Center of Excellence (CoE)

Penandatanganan MoU antara BPKP dengan 8 Perguruan Tinggi dan Pemda telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017. Pemda yang terlibat dalam Pengembangan CoE ini yaitu sebanyak 23 Pemda yang meliputi 14 Pemerintah Kota/Kabupaten dan 9 Pemerintah Provinsi.

4. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT)

Secara kumulatif, jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan ini mencapai 717 orang, yang terdiri atas 305 orang (21 kegiatan) peserta *overseas training/benchmark* dan 412 orang (3 kegiatan) peserta ToT.

5. Pengembangan E-Learning

Pemanfaatan *e-learning* selama Triwulan II 2018 sudah digunakan oleh 3.376 peserta diklat. Sebanyak 115 paket modul dan buku kerja metode *blended learning* telah dihasilkan. Untuk keberlanjutan pemanfaatan *e-learning*, BPKP akan mengembangkan *corporate university* dimana *e-learning* akan menjadi salah satu komponen dalam proses belajar mengajar. BPKP juga akan melakukan pengembangan modul agar dapat diakses dari berbagai perangkat dimanapun dan didukung oleh pengembangan sistem yang memadai. Pengembangan ini akan dibiayai, tidak hanya melalui APBN, tetapi dari sumber lainnya pula.

6. New Adults Learning Methodology

Telah dilaksanakan diklat *New Adults Learning Methodology* (NALM) dengan jumlah peserta sebanyak 217 orang dari target sebanyak 200 orang, yang terdiri dari Dosen, Alumni STAR yang berasal dari Pemda/KL, BPKP Pusat, dan Perwakilan BPKP. BPKP selanjutnya akan mengembangkan standar pelaksanaan NALM dalam bentuk pedoman dan kurikulum diklat.

7. Management Information System on Accountability (SIMA)

SIMA telah operasional di internal BPKP untuk menudukung bisnis proses BPKP dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT), pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan. Pengadaan infrastruktur pendukung operasionalisasi SIMA telah selesai sehingga pegawai sudah dapat memanfaatkan perangkat yang disediakan untuk menggunakan SIMA. BPKP akan melakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti Bappenas dan BPS, untuk pengayaan *database* yang dapat diakses melalui SIMA.

8. Cross-Sectoral Program Evaluation

Telah ditetapkan Peraturan Kepala BPKP No. 9 Tahun 2017 mengenai Pedoman Umum Pengawasan Kegiatan Lintas Sektor. Terdapat 12 sektor prioritas, dan telah dilaksanakan pengawasan atas 6 sektor prioritas selama tahun 2017-2018, yaitu Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan, Pembangunan Perkotaan, dan Penataan dan Pemerataan Guru.



9. Manajemen Proyek

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung *Project Management Consultant* (PMC) dan *Finance Management Consultant* berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU dalam rangka mendukung pencapaian *output* kegiatan STAR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- Di beberapa daerah, ditemukan bahwa *re-entry* peserta program masih belum sesuai dengan keahliannya.
- Terdapat mahasiswa/i yang tidak dapat menyelesaikan studi dan kurang/tidak komit atas waktu penyelesaian.

Tindak Lanjut

- BPKP telah menyurati setiap daerah (kepada Sekda masing-masing daerah) untuk dapat menempatkan peserta yang telah kembali ke daerah sesuai dengan keahliannya. Perlu dilakukan pula pemantauan oleh Program Studi dan BPKP Perwakilan.
- BPKP sebagai *executing agency*, dan universitas, sebagai pihak penyelenggara, melakukan konsultasi dengan pihak mahasiswa/i penerima program beasiswa untuk bertanggungjawab atas penyelesaian studinya.
- Jika akan ada program lanjutan STAR, perlu perbaikan dalam proses dan sistem penerimaan program beasiswa, baik dari BPKP sebagai *executing agency* dan universitas sebagai penyelenggaraan program.



BADAN PENGUSAHAAN BATAM



DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT
Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-20	29/12/2014 s/d	KRW	53.414,5	14.305,0	26,8	39.109,5	-55,9	2.592,2	2.068,0	79,8
		29/06/2019	USD	47,7	12,8		34,90		2,3	1,8	



Pemasangan Pipa Primer Di Jalan Utama
Sumber : Badan Pengusahaan Batam

❖ Instansi Pelaksana

Badan Pengusahaan Batam

❖ Lokasi Proyek

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m³/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta *Commisioning and Training*.
- Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pevelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial *Project Executing Agency (PEA)*.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pengembangan sistem pembuangan limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultan. Pekerjaan proyek ini terdiri dari 2 paket kontrak yaitu Paket *Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island* dan Paket *Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island*.

Paket Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island

Kemajuan pekerjaan supervisi terhadap pelaksanaan konstruksi di lapangan berjalan sesuai dengan rencana. BP Batam meminta pihak konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan konstruksi lebih intensif agar kualitas pekerjaan dapat terjaga dan waktu penyelesaian pekerjaan tercapai sesuai target.



Pekerjaan kegiatan *Development of Sewerage System in Batam Island* mengalami *re-design* perubahan teknologi WWTP yang semula menggunakan sistem *Conventional Activated Sludge (CAS)* menjadi *Organica Food Chain Reactor (FCR)*. Hansol selaku konsultan telah menyetujui perubahan teknologi tersebut. BP Batam telah bersurat kepada EDCF untuk menanyakan persetujuan atas perubahan teknologi. EDCF telah memberikan persetujuan *re-design* perubahan teknologi WWTP dari sistem *Conventional Activated Sludge (CAS)* menjadi *Organica Food Chain Reactor (FCR)* sesuai dengan surat Nomor INA-20/17-3098 tanggal 17 November 2017. Pekerjaan konstruksi WWTP dapat dilaksanakan setelah revisi DED selesai dan persetujuan EDCF diterima (revisi DED ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2018).

Paket Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island

Kemajuan pekerjaan di lapangan per Juni 2018 sebesar 16,69%. Panjang pipa yang sudah terpasang 32,12 Km dari total 114 Km, yang meliputi 20 dari 43 kawasan perumahan. Selain itu, kemajuan pekerjaan stasiun pompa telah mencapai 30% dari rencana 5 buah, pelaksanaan pekerjaan juga dilakukan secara paralel dengan pemasangan *sheet pile* untuk mencegah longsor.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi	Tindak Lanjut
<p>Lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemajuan pekerjaan konstruksi sampai saat ini meliputi instalasi pipa utama dan sekunder dan pekerjaan struktur stasiun pompa. Pekerjaan juga terkendala masalah cuaca dan keluhan masyarakat yang ingin instalasi pipa di perumahan segera diselesaikan.- Terdapat keterlambatan proses dalam pencatatan penyerapan antara pihak EDCF (Korea Selatan) dengan KPPN, menyebabkan pencatatan realisasi di laporan keuangan BP Batam mengalami keterlambatan (s/d bulan Juni 2018 EDCF telah melakukan pencairan dana sebesar Rp 27 Milyar, namun yang tercatat di laporan keuangan BP Batam masih Rp 7,6 Milyar.- Pelaksanaan konstruksi melewati masa berlaku pinjaman. Kontrak paket konstruksi berakhir pada tanggal 17 Juli 2019, sementara masa berlaku pinjaman berakhir pada tanggal 29 Juni 2019. Diusulkan untuk dilakukan perpanjangan.	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan sosialisasi kepada warga pemukiman (yang akan segera dilakukan pemasangan pipa sambungan rumah) akan dilakukan secara paralel, sehingga tidak menjadi kendala pada saat implementasi.- BP Batam akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. - BP Batam akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.



KEMENTERIAN AGAMA



**THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)***Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0164	18/05/2013 s/d 10/11/2018	USD	123,8	1,8	1,5	122,0	-91,9	61,6	0,0	0,0



Persiapan lahan untuk pembangunan fisik UIN Walisongo Semarang

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama
- UIN Sumatera Utara, Medan
- UIN Raden Fatah, Palembang
- UIN Walisongo, Semarang
- IAIN Mataram, Mataram

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Furniture and fixture
- Equipment
- PMSC
- DEDC
- EQC
- Auditor
- Start-up workshop
- Curriculum development
- Training program
- PMU and PIU



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Civil Works									
	Paket 1 UIN Sumut	22,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	25,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	16,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	21,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Equipment									
	Paket 1 UIN Sumut	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 2 UIN Palembang	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 3 UIN Semarang	7,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paket 4 IAIN Mataram	4,17	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEDC									
	Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang)	0,49	0,49	100	0	0	0	100	100	100
	Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)	0,39	0,39	100	0	0	0	100	100	100
4	PMSC									
	Paket 1 UIN Sumut	0,47	0,24	51	0,22	0,1	45	20	40	10
	Paket 2 UIN Palembang	0,53	0,26	49	0,24	0,1	41	20	40	10
	Paket 3 UIN Semarang	0,41	0,20	48	0,18	0,1	55	20	40	10
	Paket 4 IAIN Mataram	0,54	0,27	50	0,24	0,1	42	20	40	10
5	EQC Paket 1	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auditor	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Start-up Workshop	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0
8	PMU Expert									



<i>Procurement Expert</i>	0,07	0,07	100	0	0	0	100	0	0
<i>Construction Expert</i>	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Pinjaman.** *Executing agency* telah mengajukan usulan perpanjangan pinjaman sesuai surat perbaikan kedua usulan pada tanggal 6 Agustus 2018. Perbaikan untuk mengakomodasi adanya inkonsistensi terkait masa perpanjangan yang dibutuhkan (14/16/18 bulan) atau Maret 2020 dari masa tutup original proyek November 2018. Usulan tersebut saat ini tengah diproses di Bappenas untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
- 2. Civil Works.** Kegiatan dalam proses lelang. PMU telah mengirimkan dokumen BER hasil review terakhir kepada IDB pada tanggal 22 Februari 2018. NOL untuk BER dan draf kontrak untuk UIN Walisongo Semarang telah terbit pada masing-masing tanggal 7 Juni 2018 dan 1 Agustus 2018. Sedangkan untuk perguruan tinggi lainnya, BER masih dalam proses review oleh IDB dan draf dokumen kontrak masih dalam proses penyusunan. Target penandatanganan kontrak yaitu pada bulan Agustus 2018.
- 3. DEDC.** Dokumen DED telah selesai disusun.
- 4. PMSC.** Kegiatan dalam proses pelaksanaan.
- 5. EQC.** Konsultan telah terkontrak pada tanggal 21 Februari 2018. Konsultan menyampaikan laporan hasil survei analisis pada bulan Juli 2018. Rencananya akan dilakukan pertemuan yang melibatkan semua konsultan (DEDC, PMSC, dan EQC) untuk membahas hasil survei analisis di bulan Agustus 2018.
- 6. Auditor.** Kegiatan dalam proses lelang.
- 7. Construction Expert.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- 8. Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- 9. Procurement Expert.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Kegiatan ini akan berakhir pada tanggal 10 November 2018, namun belum terdapat kemajuan kegiatan yang signifikan.

TindakLanjut

PMU perlu melakukan upaya percepatan pelaksanaan proyek untuk mengejar target keteringgalan pelaksanaan proyek.



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI



VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME

Menurunkan kemiskinan dan memperbaiki tata kelola lokal di wilayah perdesaan, melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung penyusunan proposal produktif oleh masyarakat, dengan menggunakan proses perencanaan yang partisipatif

Lender	Kode Loan & Grant	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman dan Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman dan Hibah Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	755-ID	17/03/2009 s/d 31/12/2018 ²	USD	68,10 ¹	60,2	88,3	7,9	-6,5	5,8	1,3	21,8
	GC-1053-ID		USD	0,40 ¹	0,22	55,0	0,18	-	0,13	0,0	0,0

Catatan:

¹ IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).

² Perpanjangan masa laku pinjaman dan hibah per tanggal 9 Maret 2018



Sumber : Dokumentasi Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas dalam Supervision Mission VDP di Kabupaten Pegunungan Arfak.

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Papua (Kab. Sarmi, Kab. Yapen, Kab. Boven Digoel, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nabire)
- Provinsi Papua Barat (Kab. Manokwari, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Raja Ampat, Kab. Maybrat)
- Provinsi Maluku (studi)
- Provinsi Maluku Utara (studi)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Kesejahteraan
- Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis
- Pemberdayaan Ekonomi
- Pengelolaan Program



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Amandemen. Per tanggal 9 Maret 2018, masa laku (*completion date*) kegiatan *Village Development Programme* (VDP) telah diperpanjang dari 31 Maret 2018 menjadi 31 Desember 2018. Masa laku pinjaman dan hibah (*closing date*) pinjaman dan hibah IFAD diperpanjang menjadi 30 Juni 2019.

Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan pendampingan oleh fasilitator VDP masih tetap dilakukan hingga Triwulan I 2018. Selain pendampingan yang masih akan terus berjalan pada tahun 2018, penanggung jawab proyek akan melakukan kegiatan bimbingan teknis mengenai pengolahan hasil serta *rapid assessment* untuk mengumpulkan data profil kampung dan dampak proyek. Misi pemantauan bersama antara IFAD dan Pemerintah Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 7 – 21 Mei 2018 yang bertujuan untuk mereviu kinerja proyek, mendukung proyek dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan, serta mengidentifikasi dan menilai opsi keberlanjutan proyek.

Pencapaian Kegiatan. Hingga akhir tahun 2017, sebanyak 46,88% kampung yang didampingi oleh VDP (105 kampung dari total 224 kampung) telah mengalokasikan Dana Kampung (Anggaran Pembangunan Berbasis Kampung/APBK) untuk usaha produktif pertanian. Namun besaran alokasinya baru mencapai 6,22% dari total APBK (belanja kampung) atau 9,22% dari total APBK (Dana Desa), sehingga masih diperlukan pendampingan masyarakat untuk dapat menganggarkan APBK lebih besar untuk usaha produktif pertanian.

Kemitraan dengan perbankan dan swasta juga sudah mulai terjalin di sejumlah Kabupaten, diantaranya Kabupaten Pegunungan Arfak (suplai komoditas sayur dan buah ke Pasar Subitu, BP-LNG Tangguh, Kabupaten Teluk Bintuni), Kabupaten Jayawijaya (Bank BRI untuk pengadaan alat dan penguatan kapasitas pertanian), Kabupaten Fak-Fak, Kaimana, dan Yapen (asosiasi dan eksportir untuk pemasaran rumput laut). Pemasaran hasil produksi masih terkendala oleh akses sarana dan prasarana transportasi. Wilayah seperti Pegunungan Arfak, misalnya, hanya bisa dilalui oleh mobil *offroad* yang masuk ke dalam kategori mobil mewah di dalam juknis DAK.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Belum semua aparat kabupaten, aparat kampung dan masyarakat kampung memahami proses Dana Desa.
- Akses kampung ke pasar yang mahal dan terbatas (sarana dan prasarana).

Tindak Lanjut

- Bimbingan teknis lanjutan bagi aparat kabupaten, aparat kampung, dan fasilitator;
- Biro Perencanaan Kemendes dan PDTT akan mengusulkan revisi juknis khusus mengenai pembelian kendaraan bagi wilayah dengan kondisi khusus



VILLAGE INNOVATION PROJECT

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8217-ID	22/03/2013 s/d 31/12/2018	USD	450,0	291,2	64,7	158,8	-26,5	50,0	2,2	4,3

Catatan :

Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 juta



Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah-Kabupaten Mimika-Papua

Sumber : www.antaranews.com

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

❖ Lokasi Proyek

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Kegiatan Sarana Prasarana
- Kegiatan Pendidikan
- Kegiatan Kesehatan
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan. Bantuan pemerintah untuk kegiatan PPID masih dalam proses pembahasan pada tingkat pimpinan. Beberapa kegiatan telah dilakukan diantaranya pelaksanaan rapat pimpinan dan persiapan penyusunan regulasi yang mendukung kegiatan PPID. Pada Triwulan I 2018, pelaksana proyek sedang mempersiapkan penarikan pinjaman untuk *loan* 8217-ID ini.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN





SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0159	23/12/2013 s/d 30/06/2019	USD	2,5	1,0	40,0	1,5	-41,8	0,0	0,0	100
	IND-0160	23/12/2013 s/d 23/12/2017	USD	30,0	Loan Closed						



Beberapa peralatan yang disediakan melalui VTC

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas – Kementerian Ketenagakerjaan

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Skill Development Program
- Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry
- Project Management Unit
- Equipment
- PMEQC
- Start-up workshop
- Financial auditing



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
IND-0159										
1	Skills Development Program	1,4	0,54	39	0,67	-	-	40	50	-
2	Strengthening the Linkage between VTC and Industry	0,6	0,24	40	0,29	-	-	40	50	-
3	PMU (VTC Expert)	0,22*	0,14	65	0,08	-	-	78	22	-
IND-0160										
1	Equipment	26,23*	25,5	97	-	-	-	90	-	-
2	Start-up Workshop	0,023*	-	-	-	-	-	100	-	-
3	PMEQC	0,73*	0,73	100	-	-	-	100	-	-
4	Financial Auditing	0,04*	-	-	0,02	-	-	40	40	40

Keterangan : * Terdapat koreksi data. Nilai kontrak sudah disesuaikan dengan hasil lelang.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Skills Development Program.** Kegiatan sedang dalam pelaksanaan dan akan berakhir pada bulan Desember 2018. Kegiatan pelatihan dalam negeri sudah berjalan dan telah diikuti oleh 29 orang. Saat ini terdapat 31 orang yang masih dalam proses pelatihan dan 36 orang yang akan mengikuti pelatihan dengan target penyelesaian di bulan September 2018. Sedangkan untuk pelatihan luar negeri baru akan dimulai pada bulan September dan direncanakan berakhir di bulan Oktober 2018. PMU telah mengajukan revisi DIPA untuk percepatan rencana penyerapan dari tahun 2019 ke 2018. Setelah proses revisi selesai, akan diajukan *addendum* kontrak konsultan untuk pengurangan waktu dan penambahan output dengan nilai kontrak yang sama.
2. **Strengthening the Linkage between VTC and Industry.** Kegiatan sedang dalam pelaksanaan dan akan berakhir pada bulan Desember 2018. MoU antara BLK dan Industri sudah tercapai 73 MoU dari 177 yang akan berkomitmen. PMU telah mengajukan revisi DIPA untuk percepatan rencana penyerapan dari tahun 2019 ke 2018. Setelah proses revisi selesai, akan diajukan *addendum* kontrak konsultan untuk pengurangan waktu dengan nilai kontrak tetap. Output dokumen *masterplan* dari komponen ini diharapkan dapat menjadi rujukan Kemenaker dalam kerjasama antara industri dan BLK. Pada bulan Desember 2018 direncanakan akan diselenggarakan *launching* dokumen tersebut, sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti oleh seluruh BLK dan *stakeholder* terkait lainnya.
3. **PMU (VTC Expert).** Konsultan individual telah selesai masa kerjanya pada tanggal 23 Maret 2018. Pada bulan Juli 2018, telah terkontrak *National VTC Expert* yang dibiayai melalui APBN, salah satunya untuk mendukung proses sinkronisasi dan finalisasi *masterplan* yang telah disusun. *National VTC Expert* diharapkan dapat meningkatkan kualitas output dari *masterplan* yang dihasilkan. Pertemuan untuk membahas *milestones* dan *timeline* di dalam *masterplan* akan segera dilakukan.



4. **Equipment.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
5. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
6. **PMEQC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
7. **Financial Auditing.** Konsultan sudah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui APBN di tahun 2018 hingga akhir kontrak di bulan September 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Tidak ada permasalahan yang berarti dalam proyek ini.

TindakLanjut

Proyek dalam tahap finalisasi sehingga perlu mulai menyusun dokumen PCR dan mempersiapkan administrasi untuk *final payment*. Perlu adanya revisi pagu anggaran untuk menarik alokasi tahun 2019 yang akan diselesaikan pada tahun 2018.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II**

Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis	21686401	31/12/2014	EUR	48,0				Loan Closed			
		s/d 15/12/2018	USD	55,5							

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 14.404,0 dan 1 EUR = Rp 16.666,88



Menara di lokasi Sidempuan – Sumatera Utara
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Komunikasi dan Informatika

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan sistem peralatan pemancar *UHF solid state analog*
- Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh
- Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi
- Pengadaan *shelter* dan *genset* untuk semua lokasi
- Persiapan lokasi
- Jasa pendukung, implementasi, dan manajemen proyek
- Suku cadang, bantuan teknis

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik proyek ini sudah selesai, saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report* (PCR).



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3455-INO	21/12/2016 s/d 30/06/2020	USD	148,2	1,4	0,9	146,8	-42,2	28,7	0,3	1,2



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Direktorat Jenderal Bina Marga
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Perkuatan kapasitas Kementerian PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik
- Peningkatan kualitas dan percepatan *start-up* kesiapan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan lingkup kegiatan meliputi FS, DED, AMDAL/UKL/UPL, dan TFAC
- Penguatan kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam manajemen investasi publik

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Pada bulan Juni 2018 telah diadakan *steering committee meeting*, salah satu isu yang diangkat pada pertemuan tersebut yaitu terkait kebutuhan perpanjangan pinjaman. Namun demikian, rencana tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut.

Konsultan PMC dan Jragung Dam. Kemajuan pelaksanaan masing-masing paket meliputi:

- Ditjen SDA. Konsultan PMC telah terkontrak pada tanggal 16 November 2017.
- Ditjen Bina Marga. Konsultan PMC telah terkontrak pada bulan Desember 2017.
- Ditjen Cipta Karya. Konsultan PMC telah terkontrak pada tanggal 6 November 2017.



d. Konsultan untuk proyek Jragung Dam telah terkontrak pada tanggal 6 Oktober 2017.

Konsultan Panel. Kemajuan pelaksanaan masing-masing paket meliputi:

- a. Ditjen SDA. Panel telah terbentuk dan terdiri atas 9 firma.
- b. Ditjen Bina Marga. Panel telah terbentuk dan terdiri atas 7 firma.
- c. Ditjen Cipta Karya. Panel telah terbentuk dan terdiri atas 8 firma.

Call-down stage. Kemajuan pelaksanaan masing-masing paket meliputi:

- a. Ditjen SDA. Dari total 17 paket yang saat ini telah terbentuk, terdapat 2 paket kegiatan yang telah terkontrak dan 6 paket yang masih dalam proses lelang. Adapun 9 paket lainnya masih dalam tahap persiapan lelang.
- b. Ditjen Bina Marga. Dari total 17 paket yang saat ini telah terbentuk, 1 paket kegiatan telah terkontrak, 1 paket masih dalam proses lelang, dan 15 paket lainnya masih dalam tahap persiapan lelang.
- c. Ditjen Cipta Karya. Dari total 23 paket yang saat ini telah terbentuk, 1 paket kegiatan telah terkontrak, 12 paket masih dalam proses lelang, dan 11 paket lainnya masih dalam tahap persiapan lelang.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kegiatan akan melampaui masa pinjaman.

Tindak Lanjut

Perlu dilakukan percepatan pemaketan dan proses lelang agar keterlambatan dapat diminimalisasi. Terdapat rencana perpanjangan pinjaman, namun hal ini masih perlu pembahasan lebih lanjut.

DIREKTORAT JENDERAL

BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)**

Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2817-INO	31/07/2012 s/d 30/11/2018	USD	180,0	144,4	80,2	35,6	-13,1	29,2	12,8	44,0
IDB	IND-0161	29/04/2013 s/d 10/06/2019	USD	65,0	30,7	47,2	34,3	-37,3	7,6	6,8	89,9



Pelaksanaan Pekerjaan Proteksi Jembatan di 24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga
- Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Kepolisian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Utara
- Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Consulting Services and Training



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
Porsi ADB										
1	Civil Works									
	28-RCP01	9,00	9,2	91,9	-	-	-	100	-	-
	30-RCP01	37,35	18,96	50,8	7,81	3,28	41,9	86,06	21,31	17,02
	30-RCP02	44,97	26,67	59,3	4,15	9,27		100	-	-
	30-RCP03	25,86	15,35	59,4	0,07	-	-	100	-	-
	34-RCP01	23,86	14,14	59,3	3,09	1,68	54,4	100	1,05	1,05
	34-RCP02	18,09	10,61	58,7	1,06	-	-	100	-	-
	34-RCP03	25,13	15,97	63,5	1,48	1,39	93,9	100	-	-
	34-RCP04	41,67	24,24	58,2	7,23	4,14	57,3	100	20,5	20,5
2	Goods	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Consulting Services and Training	4,39	7,03		4,96	0,57	11,5	0	0	0
Porsi IDB										
1	Civil Works									
	24-RCP01	19,77	13,89	70	4,27	2,99	70	92,9	25,1	18,1
	24-RCP02	14,25	10,45	73	3,00	2,41	80	100	-	-
	24-RCP03	4,20	3,88	92	-	-	-	100	-	-
2	Consulting Services and Training	0,93	0,70	75	0,37	0,03	8,1	5	0	0

Keterangan: Kurs 1 USD = Rp 13.500,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi ADB

Executing agency mengajukan usulan perpanjangan dan *loan partial cancellation* melalui surat pada tanggal 23 Mei 2018. Berdasarkan usulan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan melalui surat pada tanggal 5 Juni 2018. Usulan tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada ADB melalui surat pada tanggal 26 Juni 2018. Usulan tersebut sudah disetujui oleh ADB melalui surat nomor 035/L.2817/18 pada tanggal 2 Agustus 2018, sehingga pinjaman porsi ADB akan tutup pada tanggal 30 November 2018 dan *partial cancellation* sebesar USD 8 juta.



Terkait kemajuan pelaksanaan kegiatan, secara umum, seluruh kontrak paket fisik telah berakhir meskipun 1 paket masih dalam penyelesaian konstruksi dan kontraktor dikenakan denda. Untuk paket konsultasi, masih terdapat 2 paket *consulting services* yang berjalan. Secara rinci pelaksanaan masing-masing paket kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Jawa Timur

28 RCP-01A (CW-04)

Pelaksanaan fisik sudah selesai dan serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor ke PPK juga sudah dilakukan.

2. Kalimantan Barat

- 30 RCP-01 (CW-05)

Kontrak paket ini telah berakhir pada tanggal 13 Juni 2018 namun pekerjaan belum selesai (deviasi -13,9%). Kontraktor dikenakan denda keterlambatan dan tetap perlu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

- 30 RCP-02 (CW-06)

Kegiatan konstruksi telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 18 Desember 2019.

- 30 RCP-03 (CW-07)

Kegiatan konstruksi telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 26 September 2019.

3. Kalimantan Utara

- 34 RCP – 01 (CW 08)

Kegiatan konstruksi telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 29 Januari 2020.

- 34 RCP – 02 (CW 09)

Pekerjaan fisik telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 19 Maret 2019.

- 34 RCP – 03 (CW 10)

Pekerjaan fisik telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) hingga tanggal 8 April 2019.

- 34 RCP – 04 (CW 11)

Pekerjaan fisik telah selesai dan saat ini dalam masa *Defect Notification Period* (DNP) .

4. Consulting Services and Goods

Seluruh kegiatan konsultasi telah selesai kecuali 2 paket, yaitu CSP-1 *Core Team Consultant* dan CSP-2 : DSC-1 Kalimantan.

Porsi IDB

1. **24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar.** Pekerjaan di lapangan masih berlangsung dengan kemajuan 92,9% dan deviasi sebesar 4,9%. Dilakukan percepatan penyelesaian pekerjaan agar dapat selesai sebelum masa akhir kontrak. IDB telah memberikan NOL atas usulan *addendum* kontrak dan *technical variation* yang meliputi perubahan nilai kontrak sebesar 1,5% dan perpanjangan durasi kontrak dari semula berakhir pada tanggal 1 Agustus 2018 menjadi tanggal 24 September 2018 untuk penambahan pekerjaan proteksi jembatan.
2. **24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet (Section I).** Pekerjaan fisik telah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima. Saat ini eskalasi tengah dihitung oleh DSC.
3. **24-RCP-03 Wawar-Congot.** Pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima.
4. **Consulting Services and Training CSP-11.** Kegiatan masih berlangsung. *Addendum* kontrak konsultan DSC-2 Jawa Tengah masih menunggu NOL dari IDB. IDB merekomendasikan untuk pelaksanaan pekerjaan *financial audit* dilaksanakan oleh BPKP.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

PORSI ADB

Lain-lain

Seluruh kontrak konstruksi telah berakhir, namun untuk CW 5 pencapaian fisik belum 100% dan masih dalam tahap penyelesaian oleh kontraktor. Dikarenakan telah melewati masa kontrak, kontraktor dikenakan denda hingga konstruksi selesai maksimal selama 50 hari.

PORSI IDB

Lain-lain

Terdapat dua WA yang belum terbayar untuk Lot 1 dan Lot 2.

Tindak Lanjut

Perlu dilakukan pemantauan intensif terhadap penyelesaian konstruksi CW 5 sehingga pekerjaan dapat selesai. Apabila pekerjaan melampaui masa 50 hari tersebut, akan dilakukan pertemuan pembahasan di internal Bina Marga.

IDB CGO akan mengkoordinasikan perihal ini kepada IDB HQ di Jeddah agar pembayaran dapat segera terbayarkan.



DEVELOPMENT OF TRANS SOUTH-SOUTH JAVA ROAD PROJECT

Pembangunan Akses Jalan Lintas Selatan Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IDN-1012	07/11/2017 s/d 07/11/2021	USD	15	0,0	0,0	15	-16,0	11,7	0,0	0,0
		Belum efektif	USD	235	0,0	0,0	235	0,0	15,4	0,0	0,0



Lokasi Rencana Pembangunan Lot 3 Jembatan Kretek 2

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga

❖ Lokasi Proyek

1. Provinsi Jawa Tengah
2. Provinsi Jawa Timur
3. Provinsi DI Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Civil works
- b. Consulting Services and Training

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Civil Works									
	Jawa Tengah									
	Lot 1 (Tambakreja-Bantarsari)	9,63	-	-	1,1	-	-	-	-	-
	Lot 2 (Jladi-	5,21	-	-	0,88	-	-	-	-	-

Ekuivalen Juta USD



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	Karangbolong- Tambakmulyo)									
	DI Yogyakarta									
	Lot 3 (Jembatan Kretek 2)	42,52	-	-	3,19	-	-	-	-	-
	Lot 4 (Legundi- Planjan)	7,12	-	-	0,84	-	-	-	-	-
	Lot 5 (Jerukwudel- Baran-Duwet)	21,15	-	-	1,25	-	-	-	-	-
	Jawa Timur									
	Lot 6 (Prigi- Tulungagung- Klatak- Brumbun)	56,86	-	-	1,12	-	-	-	-	-
	Lot 7 (Tulungagung- Serang- Malang)	26,98	-	-	2,13	-	-	-	-	-
	Lot 8 (Jarit-Puger)	20,16	-	-	2,90	-	-	-	-	-
	Consulting									
2	Services and Training									
	Project Management Consultant Start Up Workshop & Familiarization Visit	5,4	-	-	5,1	-	-	-	-	-
	Project Supervision Consultant- Semarang	3,2	-	-	0,37	-	-	-	-	-
	Project Supervision Consultant- JawaTimur	3,0	-	-	0,81	-	-	-	-	-

Keterangan : Kurs 1 USD = Rp 13.500,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Pinjaman.** Executing agency melalui surat pada tanggal 4 Juni 2018, mengajukan usulan amandemen pinjaman terkait penyesuaian komponen *civil works*. Salah satu poin dalam usulan amandemen tersebut yaitu perubahan panjang jalan dari sebelumnya 158,9 km menjadi 98,74 km serta perubahan



paket menjadi 9 paket. Usulan tersebut secara resmi telah disampaikan kepada IDB melalui surat Kementerian Keuangan pada tanggal 2 Juli 2018. Saat ini usulan masih direviu di internal IDB.

PMU telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan perihal pengajuan perpanjangan waktu *first disbursement* (direncanakan memerlukan perpanjangan selama 180 hari atau 270 hari). PMU segera akan bersurat resmi kepada Kementerian Keuangan perihal tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada IDB.

2. **Civil Works.** Saat ini tengah dilakukan persiapan lelang. Status pelaksanaan masing-masing paket yaitu sebagai berikut:
 - a. Lot 1, 2, 4 dan 5 dalam proses evaluasi *bidding document*. Lot ini tidak terpengaruh usulan perubahan *scope* yang saat ini masih dalam proses reviu di IDB. Target kontrak paling cepat pada bulan September 2018.
 - b. Lot 3 saat ini masih dalam penyusunan *bidding document* setelah dilakukan revisi desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. *Bidding document* akan disampaikan kepada IDB untuk memperoleh NOL pada bulan Agustus 2018.
 - c. Lot 6,7,8,9 dalam proses reviu *bidding document* oleh IDB. Proses ini masih perlu menunggu persetujuan perubahan *scope* yang telah diajukan oleh PMU dan saat ini dalam proses reviu IDB. Terdapat usulan perubahan metode lelang dari NCB ke ICB.
3. **Consulting Services and Training.**
 - a. *Project Management Consultant (PMC)*. PMU telah menyampaikan hasil evaluasi ulang RFP dan *shortlist* kepada pihak IDB. NOL IDB atas usulan tersebut telah terbit pada 8 Juni 2018. Target kontrak pada bulan November 2018.
 - b. *Project Supervision Consultant – Semarang (PSC 1)*. Kegiatan dalam proses reviu ulang RFP dan *shortlist* berdasarkan komentar dari IDB berupa klarifikasi dan permintaan informasi tambahan atas *shortlist* yang telah disampaikan.
 - c. *Project Supervision Consultant – Jawa Timur (PSC 2)*. Kegiatan dalam proses evaluasi RFP, *shortlist*, evaluasi EOI. Target penyampaian dokumen ke IDB pada bulan Agustus 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Struktur organisasi PMU belum disampaikan kepada IDB dan Pemerintah (Bappenas dan Kementerian Keuangan).

Tindak Lanjut

PMU perlu segera bersurat kepada IDB dan Pemerintah terkait hal tersebut agar mekanisme koordinasi menjadi lebih baik.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	PBC (2015) 42 TOTAL (385)	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	53,4	12,1	22,7	41,3	-16,6	10,9	5,1	47,0



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Balikpapan – Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Balikpapan –
Samarinda Seksi 5 Ruas Jalan Km 13 -
Sepinggang Balikpapan

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Proyek pembangunan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda Seksi V efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pekerjaan dilapangan terhadap kontrak hingga Juni 2018 sebesar 43,83% (target 51,49%). Deviasi pekerjaan disebabkan permasalahan pembebasan lahan, kinerja kontraktor yang masih dibawah performa dan kondisi cuaca ekstrim (hujan dengan intensitas tinggi) di lokasi, sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan timbunan badan jalan (*quarry* dan proses pemadatan).

Pada rapat koordinasi PHLN Triwulan II 2018 yang dilaksanakan di Bappenas, pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa terdapat permasalahan teknis. Diperlukan penyesuaian penanganan dengan kondisi di lapangan, sehingga mengakibatkan adanya desain penanganan tambahan yang berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran. Dengan demikian adanya kekurangan anggaran sekitar Rp 304,420 milyar = 35,87% (termasuk PPN), penyebabnya sebagai berikut :

- Kondisi lapangan, diperlukan penyesuaian desain penanganan dengan kondisi di lapangan.
- Perbaikan tanah dasar yang tidak memenuhi syarat (*clayshale*, pasir halus, tanah lunak).
- Koreksi penggunaan tanah hasil galian yang tidak memenuhi syarat sebagai bahan timbunan (hanya sekitar 5% yang bisa digunakan).
- Adanya volume tambahan untuk pekerjaan struktur dan proteksi lereng.
- Normalisasi saluran permukiman sekitar proyek sebagai outlet saluran drainase pada timbunan badan jalan.
- Adanya item baru (DS.3A dan DS.3B untuk drainase pada median).



Pelaksana kegiatan juga menginformasikan bahwa telah dilakukan Justifikasi Teknik untuk mendesain tambahan penanganan sesuai kebutuhan lapangan. Hasil pembahasan oleh tim teknis dengan persetujuan tim teknis evaluasi perubahan kontrak Ditjen Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan keterbatasan pagu *Loan* China Exim Bank PBC No (2015) 42 Total No (385) diusulkan dengan biaya tetap atau *balance budget* dengan target penanganan berkurang sepanjang 1,650 km.
2. Pada penanganan sepanjang 1.650 km tersebut diusulkan konstruksinya dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT. Jasamarga Balikpapan – Samarinda atau sumber pendanaan APBN lainnya senilai Rp 230.902.121.000,-.

Persetujuan Dirjen Bina Marga untuk Justifikasi Teknis Amandemen No. 5 Paket Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda tanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Target penanganan berkurang sepanjang 1,650 km.
2. Nilai kontrak tetap sebesar Rp 848.558.119.164,90.
3. Waktu pelaksanaan bertambah semula 730 hari kalender menjadi 880 hari kalender atau sampai dengan 31 Desember 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Lahan yang bebas sampai dengan Juni 2018 terhadap panjang adalah 100% (10,990 km) dan terhadap luas adalah 94,36% (957.080 m²).

- 15 bidang: proses penilaian dan musyawarah.

Waktu Pelaksanaan

Diperlukan tambahan waktu pelaksanaan (semula Agustus 2018 menjadi April 2019), karena kondisi curah hujan yang tinggi mempengaruhi pekerjaan tanah timbunan badan jalan dan galian dan akses jalan ke *quarry*.

Tindak Lanjut

Satker melakukan koordinasi secara intensif dan langsung sosialisasi kepada pemilik tanah bersama dengan PPK Pengadaan Tanah dan Panitia Pengadaan Tanah Pemkot Balikpapan serta Pemprov Kaltim.

Hasil Justifikasi Teknis yang disetujui Ditjen Bina Marga, waktu pelaksanaan bertambah semula 730 hari kalender menjadi 880 hari kalender atau sampai dengan 31 Desember 2018.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	2016 1 TTL 389	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	219,4	64,2	29,3	155,2	-3,5	25,4	26,9	100,0



Pembangunan Jembatan Cinapel

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh kontraktor hingga periode laporan ini adalah :

- Clearing grubhing.
- Galian tanah.
- Pekerjaan drainase
- Pembangunan jembatan.
- Pembangunan *underpass* dan *overpass*.
- Rigid pavement*.
- Perkuatan lereng.
- Pekerjaan timbunan.

Terkait pembebasan lahan, pelaksana proyek menginformasikan bahwa hingga akhir Juni 2018 lahan yang dapat dibebaskan sekitar 82,93% dan sisanya akan dibebaskan pada periode triwulan selanjutnya. Kontraktor belum dapat bekerja maksimal karena permasalahan lahan. Status pada periode laporan Triwulan II 2018 adalah 5 desa sedang dalam pemberkasan yaitu Desa Mulyasari, Desa Sinarmulya, Desa Sukamaju, Desa Margamukti dan Desa Girimukti. Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu telah mengirimkan surat permohonan alokasi dana untuk pemenuhan pengadaan tanah Cisumdawu Phase II kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI untuk diteruskan kepada Bapak Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah cq. Kasubdit Lahan dan BUJT Cisumdawu cq. PT. Citra Karya Jabar Tol.

Capaian fisik pekerjaan sampai dengan Juni 2018 sekitar 40%. Kemajuan pekerjaan *tunnel* (*twin tube* panjang 472 m) untuk *tunnel* sebelah kiri (arah Sumedang) telah mencapai 270 meter, untuk *tunnel* sebelah kanan (arah Cileunyi) telah mencapai 200 meter. Konstruksi Jembatan Cinapel, pada periode laporan Triwulan II 2018 masih dalam tahap pengecoran *Pier Head*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Masih belum cairnya pembayaran IPC 18 (Februari) dan 19 (Maret) yang sudah diajukan sejak Mei 2018.

Pembebasan Lahan

Perkembangan pembebasan lahan yang sudah 84,93% terhambat kontraktor yang tidak bisa bekerja maksimal pada lahan yang sudah dibebaskan, dibutuhkan pembebasan lahan mendesak.

Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan PMU Tiongkok akan dilaksanakan untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
- Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu telah mengirimkan surat permohonan alokasi dana untuk pemenuhan pengadaan lahan *Cisumdawu Phase II* kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI untuk diteruskan kepada Bapak Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah cq. Kasubdit Lahan dan BUJT Cisumdawu cq. PT. Citra Karya Jabar Tol.
- Kontraktor akan melaksanakan pekerjaan Jalan Bebas Hambatan dengan memprioritaskan urutan pekerjaan kritis sesuai lahan yang sudah dibebaskan, untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	(2016) 7 TTL 395	30/09/2016 s/d 30/09/2022	USD	78,1	24,7	31,7	53,4	-1,1	52,1	12,7	24,4



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Manado - Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan Manado – Bitung

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sesuai Kepmen PU Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Tujuan pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung antara lain:

- Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan untuk memudahkan pergerakan lalu lintas pada Daerah Pembangunan Ekonomi yang Terpadu Manado – Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan juga mendukung Pusat Pelabuhan Internasional Bitung.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun jalan untuk mendukung pembangunan wilayah.
- Mengurangi waktu tempuh dan biaya kirim sepanjang wilayah tersebut.
- Menyediakan jalan alternatif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Pinjaman proyek pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung hingga Juni 2018 sebesar 42%. Realisasi penyerapan pinjaman hingga akhir Juni 2018 sebesar USD 24,73 juta atau 31,66% dari total pinjaman. Dalam Tahun Anggaran 2018, realisasi penyerapan pinjaman dari Januari sampai dengan Juni 2018 sebesar USD 12,73 juta.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Lahan bebas sampai dengan Juni 2018 secara total luas adalah sebesar 99,26% setelah penyesuaian terhadap desain, masih terdapat 5 (lima) bidang yang belum bebas.

Lain-lain

- Rendahnya produktifitas lapangan akibat kurangnya sumber daya (material, peralatan dan tenaga kerja).
- Metode kerja yang belum tepat dan terstruktur.
- Akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga pekerjaan di lapangan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Tindak Lanjut

- Telah disepakati bahwa pembebasan lahan akan selesai pada bulan September 2018.
- Kontraktor diinstruksikan untuk segera mengoptimalkan konstruksi di lahan yang sudah bebas dan penambahan sumber daya.
- Kontraktor disarankan untuk membuat program kerja serta metode kerja yang baik dan tepat.
- Mengoptimalkan waktu kerja yang ada dengan menambah jam kerja pada saat cuaca baik dan menjaga hasil pekerjaan (timbunan) agar tidak ada pengulangan pekerjaan.

**TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU**

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21663301	11/03/2013 s/d 11/03/2018	USD	122,4					Loan Closed		



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

Peningkatan Jalan Bebas Hambatan sebagai aksesibilitas bandar udara Kualanamu

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**Pelaksanaan pekerjaan proyek ini sudah selesai dan saat ini pelaksana proyek sedang menyusun *Project Completion Report (PCR)*.



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	PBC (2015) 39 TTL (382)	30/09/2016 s/d 30/09/2021	USD	198,8	97,4	49	101,4	9,7	82,6	37,9	45,9



Perkembangan pelaksanaan pembangunan jembatan di sungai mati

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Saradan – Kertosono, Provinsi Jawa Timur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas
Hambatan Solo - Kertosono

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman pembangunan jalan bebas hambatan Solo – Kertosono efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pekerjaan (terhadap kontrak) hingga akhir Juni 2018 sebesar 70%. Realisasi penyerapan kumulatif hingga Juni 2018 sebesar USD 97,36 juta atau 48,98% dari total pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2018, realisasi penyerapan pinjaman dari Januari sampai dengan Juni 2018 sebesar USD 37,88 juta. Sesuai surat Direktur Jenderal Bina Marga nomor : JL.03.05-Db/46 perihal Percepatan Pembangunan Jalan Tol Solo – Kertosono porsi Pemerintah tanggal 20 Januari 2017, maka target operasional pekerjaan *Toll Road Development of Solo – Kertosono Project Phase I* direncanakan akan dimajukan 9 (sembilan) bulan sampai dengan akhir tahun 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Kemajuan pembebasan lahan telah mencapai 99,96%. Lahan yang belum bebas antara lain:
 - Satu bidang milik warga Desa Pisang.
 - Dua bidang tanah wakaf.
- Kebutuhan tambahan pembebasan lahan untuk *oprit overpass* dan *frontage* seluas 15,376 Ha.

Pendanaan Proyek

- IPC terakhir yang telah ditagihkan dan sudah dicalirkan oleh *China Exim Bank* adalah bulan Januari 2018, hal ini mengakibatkan terjadinya perlambatan dalam pelaksanaan proyek.
- Revisi DIPA TA 2018 diperlukan untuk memenuhi target pengerjaan proyek sampai dengan akhir 2018.

Tindak Lanjut

Tanah Warga (Desa Pisang)

- 1 bidang warga di desa Pisang sedang proses *appraisal*.

Tanah Wakaf (2 bidang tanah wakaf belum bebas)

- 1 bidang tanah wakaf (masjid) di Desa Sambirejo sedang dalam proses pembangunan masjid pengganti.
- 1 bidang tanah wakaf (masjid) di Desa Bandar kedung mulyo dalam proses pembangunan masjid pengganti.
- Proses saat penetapan lokasi telah keluar menunggu proses selanjutnya.
- Proyek mengalami kesulitan *Cash Flow* dikarenakan tidak lancarnya pencairan tagihan IPC dari *China Exim Bank* sehingga kemajuan di lapangan mengalami perlambatan.
- Pagu DIPA Tahun Anggaran 2018 pada Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono untuk Proyek Pinjaman China adalah sebesar Rp 300.000.000.000,-. Pagu DIPA tersebut telah terserap seluruhnya sampai dengan April 2018, sehingga diperlukan revisi DIPA percepatan luncairan dana pada TA 2018 sebesar Rp 835.891.210.203,- (jumlah ini sesuai dengan *Disbursement Plan*) dengan demikian target operasional diakhir tahun 2018 dapat tercapai.

**WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)**

Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8043-ID	12/03/2012 s/d 31/12/2018*)	USD	250.0	174,9	69,9	75,1	-22.6	16,2	7,0	43,3

Keterangan : *) Berdasarkan amandemen perpanjangan closing date per 6 November 2017



Ruas Jalan Krui-Biha Lampung

Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional
- Bagian 2 : Dukungan Implementasi
- Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan
- Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Civil Works. Untuk pelaksanaan Paket 1 (Krui – Biha), Paket 2 (Padang Sawah - Sp Empat (Incl Air Gadang Bridge)), Paket 3 (Manggopoh - Padang Sawah) dan Paket 4 (Ipuh – Bantal). Pelaksanaan paket pekerjaan telah selesai dilakukan 100%.

WP 2 dan WP 3. Sebanyak 11 paket telah selesai dilaksanakan 100%, yaitu Paket 6 (Ps Pedati – Kerkap), Paket 7 (Indrapura – Tapan), Paket 8 (Bts. Kota Pariaman – Manggopoh), Paket 11 (Bantal – Mukomuko), Paket 17 (Sp.Gunung Kemala - Pg. Tampak), Paket 19 (Lais – Bintunan), Paket 20 (Lubuk Alung – Sicincin) sedangkan untuk sisa 7 paket lainnya sedang dalam proses dengan kemajuan sekitar 70%.

Perpanjangan Pinjaman.

Kegiatan ini akan mengajukan perpanjangan kedua yang semula berakhir pada Desember 2018 menjadi Desember 2019. Selain adanya 7 Paket yang sedang dalam proses penyelesaian, perpanjangan ini dikarenakan adanya tambahan 3 paket baru yang akan mendukung *Road Safety* yang ada yaitu:

- Paket 05 A (*Slope Protection of Sp Rampa-Poriaha/North Sumatera*), yang sedang dalam proses lelang kedua penunjukkan kontraktor
- Paket 21 A (*Continuation of Package No. 21 Lubuk Alung – Kuraitaji/West Sumatera*), yang juga masih dalam tahap pelelangan kontraktor
- Paket 22 (*Sago – Painan/West Sumatera*), merupakan kelanjutan dari Paket 14 (Painan – Kambang) yaitu 7 Km sebelum ruas Painan – Kambang.

Technical Advisory.

- Paket *Core Team Consultant (CTC)* yang semula ditargetkan akan selesai pada November 2018 rencana akan diperpanjang menjadi September 2019.
- Paket *Design and Supervision Consultant (DSC)* yang semula ditargetkan akan selesai pada Oktober 2018 rencananya akan diperpanjang menjadi Agustus 2019.
- Paket *Technical Assistance of Slope Stabilization, Design, and Management* yang semula ditargetkan akan selesai pada Juni 2018 akan diperpanjang menjadi Agustus 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan barang dan jasa

Paket tambahan 05 A dan 21 A masih terkendala oleh proses lelang kedua yang belum mendapatkan hasil.

Lain-lain

Realisasi DIPA yang melebihi anggaran menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan dana yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan

Tindak Lanjut

Executing agency menargetkan untuk mengoptimalkan seluruh pekerjaan di tahun 2018. Sedang dilakukan perhitungan jangka waktu pengerjaan apabila melewati batas tahun 2018. Hasil perhitungan akan menentukan apakah proyek memerlukan perpanjangan atau tidak.

Perlunya menargetkan anggaran yang lebih akurat agar deviasi yang terjadi tidak terlalu besar terhadap realisasi *disbursement*, sehingga revisi anggaran tidak perlu dilakukan.

DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT

Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	2010	02/05/2013	EUR	75,0	2,1	2,7	73	-97,2	0,5	0,0	0,0
	66	s/d	-----	-----	-----		-----		-----	-----	
	471	30/06/2018	USD	86,8	2,4	84,4	0,6	0,0			



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Kota Jambi
- Kota Malang
- Kabupaten Jombang
- Kabupaten Sidoarjo

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang
- Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan
- Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2018		Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%		Realisasi	%		%	Realisasi
1	Package 1, Consultant Services Implementation Consultant	5,5	2,05	43	-	-	-	-	-	-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Untuk di 3 lokasi (Sidoarjo, Malang dan Jambi) serta 1 lokasi di Jombang (yang diperkirakan akan kontrak pada akhir Desember 2018), jika kemajuan di keseluruhan lokasi berjalan dengan baik maka perpanjangan masa laku pinjaman hingga 30 Juni 2021 bisa dipastikan *on schedule*.
- Pada tanggal 29 Juni 2018 telah ditandatangani kontrak untuk konstruksi di Kota Malang, Jambi, dan Sidoarjo.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

- Lelang ulang akan diadakan untuk Kabupaten Jombang.
- Perpanjangan *loan agreement* yang semula berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi **30 Juni 2021** telah disetujui oleh KfW, namun masih perlu pembahasan lebih lanjut terkait pasal 2.6 pada *loan agreement* tentang adanya biaya tambahan.

Tindak Lanjut

- Lelang ulang untuk Kabupaten Jombang sudah diumumkan pada Koran Tempo dan Jakarta Post pada 25 Juni 2018. Pembahasan tentang biaya tambahan akan didiskusikan antara KfW dengan Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Agustus 2018.



IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS

Menyediakan Akses Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat di 34 Lokasi Di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Hongaria	HS002 16000	01/08/2016 s/d 31/12/2020	USD	36,4	16,3	44,8	20,1	1,6	5,5	4,6	83,6



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Direktorat Jenderal Cipta Karya*)

❖ Lokasi Proyek

Di 34 lokasi yang berada di:

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi D.I Yogyakarta
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Banten
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Jambi

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berikut peralatan *Mechanical Electrical* di 34 Kabupaten/Kota dengan kapasitas 20 Liter/Detik dan 40 Liter/Detik.

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif			TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	%		Realisasi	
1	<i>Hungarian Goods and Related Services</i>	36,4	16,3	44	2,78	3,0	100	-	-	-	



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant For Water Scarcity Areas* berasal dari pinjaman Pemerintah Hongaria sebesar USD 36,4 juta. Penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan II2018 sebesar USD 20,1 juta atau 44,8 % dari total pinjaman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Pagu DIPA TA 2018 belum mencukupi total tagihan/total penyerapan. Diperlukan revisi DIPA yang semula Rp 175 milyar menjadi Rp 245 milyar.
- Perlu pembaharuan beberapa Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah di 5 Kabupaten.
- Terkait sisa dana sekitar USD 1,1 juta yang akan digunakan untuk tambahan pompa baru belum bisa dipastikan karena harga pompa adalah USD 1,7 juta, melebihi sisa dana yang tersedia.

Tindak Lanjut

- Pelaksana kegiatan telah mengajukan proses revisi DIPA ke Kementerian Keuangan (saat ini sedang proses reuiu APIP). Target akhir Juli 2018.
- Kemen PUPR akan segera memperbaharui PKS.
- Masih menunggu keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya mengenai pemanfaatan sisa dana.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2654-INO	22/11/2010 s/d 31/12/2019	USD	35,0	22,1	63,1	12,9	-20,3	4,1	0,0	0,0



Proyek MSMHP di Medan

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ **Lokasi Proyek**

- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi DI Yogyakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan hygienic (sanitasi berbasis masyarakat)
- Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar)
- Dukungan implementasi proyek



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen*	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif**		TA 2018			Realisasi Kumulatif**		TA. 2018
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
Medan										
1	Sewerage System Medan P5	9,69	0	0	3,17	0	0	0	-	-
Pusat										
2	Project Implementation Support	0,73	0	0	0,21	0	0	0	-	-

Keterangan: USD 1 = Rp 13.600,-

*Komponen kegiatan di Yogyakarta dikeluarkan karena sudah selesai 100%. Saat ini kegiatan yang dilaksanakan hanya Paket 5 di Medan dan consulting service.

**Realisasi kumulatif mulai dari 0 karena kontrak saat ini merupakan kontrak baru dari sebelumnya.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Kementerian PUPR, sebagai *executing agency*, telah mengajukan usulan perpanjangan pinjaman selama 12 bulan, dari sebelumnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2020, dan realokasi pinjaman di masing-masing kategori serta pemanfaatan *unallocated loan*. Usulan tersebut masih diproses internal Bappenas.

Konsultan. Lelang pertama gagal karena jumlah peserta tidak memenuhi syarat *shortlist* ADB sehingga dilakukan lelang kembali. Di akhir Triwulan II 2018, lelang sudah pada tahap *review* evaluasi teknis oleh ADB untuk pemberian NOL dan akan dilanjutkan dengan evaluasi keuangan.

Konstruksi. Lelang sudah gagal sebanyak 3 kali. Lelang pertama gagal akibat sistem SPSE yang belum dapat mengakomodasi peserta lelang dari luar negeri sehingga perlu dilakukan lelang ulang. Lelang kedua gagal kembali karena jumlah peserta yang dianggap lolos hanya 1 perusahaan dan ADB menanggapi tidak ada kompetisi sehingga lelang perlu diulang kembali dan dilakukan perubahan metode dari pra-kualifikasi menjadi pasca kualifikasi. Lelang ketiga, menggunakan metode pasca kualifikasi, kembali mengalami kegagalan dikarenakan: (i) Peserta 1 nilai yang diajukan melebihi pagu; dan (ii) Peserta 2 mengajukan nilai yang memperhitungkan pajak padahal seharusnya tidak, setelah dilakukan perhitungan kembali peserta tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dengan harga tersebut. Saat ini lelang keempat telah dimulai dan ditargetkan selesai pada bulan September 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa

Lingkup pekerjaan utama kegiatan ini yaitu pembangunan jaringan perpipaan untuk sewerage system di Kota Yogyakarta dan Kota Medan. Untuk kegiatan di Kota Yogyakarta sudah selesai dilaksanakan tahun 2014, sedangkan untuk Kota Medan masih terdapat 2 dari 5 paket pekerjaan yang belum selesai akibat hambatan teknis berupa kondisi tanah berpasir dan muka air tinggi yang menyebabkan longsor. Telah dilakukan 2 kali perpanjangan pinjaman untuk menyelesaikan sisa kegiatan, namun hingga Triwulan II 2018 penyelesaian kegiatan masih belum terlaksana akibat proses lelang yang belum selesai. Dihitung dari kebutuhan waktu konstruksi, dengan sisa waktu pinjaman yang ada, penyelesaian kegiatan akan melampaui waktu tutup pinjaman.

Tindak Lanjut

- *Executing agency* telah menyampaikan usulan perpanjangan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Usulan tersebut masih diproses di internal Bappenas karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.
- Pembahasan keberlanjutan kegiatan dengan para pihak terkait (*executing agency*, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan) dilaksanakan di bulan Agustus 2018.
- *Executing agency* melakukan pembahasan internal, terkait dengan keberlangsungan kegiatan di Kota Medan.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA**

Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-565	23/06/2014	JPY	1.968,0	205,2	10,4	1.762,8	-50,1	722,9	57,4	7,9
		s/d 23/06/2021	USD	17,8	1,9		16,0		6,5	0,5	

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1
- Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1
- Advisory Pilot Project (Ground Breaking) DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari JICA)
- Tender Assistance kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan.

Proses lelang untuk Kegiatan IP-565 membutuhkan waktu cukup lama karena tidak tercapai kesepakatan terhadap peringkat ke-1 akibat ketidakwajaran biaya penawaran, dan negosiasi dengan peringkat ke-2 baru mendapatkan kesepakatan pada bulan Maret 2017. Kegiatan ini telah tanda tangan kontrak pada tanggal 7 Juli 2017, dengan kontraktor/konsultan Yachiyo *Engineering*. Terdapat *addendum* II yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2018. Total nilai kontrak menjadi Rp 130.639.862.992,00. Karena *addendum* tersebut, penarikan *2nd* dan *3rd Bimonthly* tidak sesuai dengan jadwal. Dokumen penarikan *2nd Bimonthly* sudah masuk ke KPPN pada pertengahan Januari, status saat ini WA sudah keluar dari KPPN. Konsultan sudah memasukkan dokumen penarikan *3rd Bimonthly* pada pertengahan Maret, status saat ini dokumen masih dalam tahap verifikasi.

Capaian fisik pekerjaan di lapangan telah mencapai 30,9% (status kemajuan Triwulan II 2018 berdasarkan dokumen *Monthly Progress Report* No. 6). *Basic design* telah selesai Juni 2018, saat ini sedang dalam



proses reuiu. Saat ini Pemda DKI sedang melaksanakan sosialisasi di setiap kecamatan langganan Zona 1 dan Zona 6. Proses Amdal dimulai bulan Mei 2018.

**METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)**

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3123-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	80,0	1,7	2,1	78,3	-59,2	10,5	0,0	0,0
AIF	8280-INO	09/07/2014 s/d 31/12/2020	USD	40,0	0,0	0,0	40,0	-61,3	3,2	0,0	0,0



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat
- Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi

❖ **Lokasi Proyek**

- Kota Jambi, Provinsi Jambi
- Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi DKI Jakarta



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Pengadaan dan pemasangan pipa (*open trench*)
- b. Pipa *jacking*
- c. *Manhole*
- d. *Aerator*
- e. *Maintenance equipment*
- f. *Warehouse*
- g. Konsultan supervisi
- h. Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Konsultan. Konsultan PISC telah terkontrak pada tanggal 2 Oktober 2017. Konsultan telah melaksanakan review terhadap DED yang disusun untuk menyesuaikan isi DED dengan ketentuan dalam peraturan yang baru, yaitu Permen LH Nomor 18/2016. PISC dalam proses finalisasi *bidding document*.

Kota Makassar. Pelaksanaan kegiatan di Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

- a. **Lahan.** Sebelumnya terdapat isu klaim sejumlah porsi lahan oleh warga, namun hal ini dianggap tidak akan mengganggu keberlanjutan kegiatan karena dari sisa lahan yang sudah disediakan Pemkot Makassar dan tidak diklaim oleh warga sudah mencukupi kebutuhan lahan untuk pembangunan sehingga proses pematangan lahan sudah bisa dilaksanakan.
- b. **Konstruksi IPAL.** Perlu dilakukan *updating* dokumen *Environmental Impact Assessment* (EIA). Untuk lelang konstruksi, saat ini dalam finalisasi *bidding document* dan akan disampaikan ke ADB pada bulan Agustus 2018, akan dilakukan pula diskusi untuk menentukan metode lelang yang paling tepat digunakan.
- c. **Konstruksi Jaringan Perpipaan.** Saat ini dalam proses permohonan NOL *bidding document* ke ADB. Lelang direncanakan mulai pada bulan September 2018 dengan durasi kontrak 30 bulan.

Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan di Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

- a. **Lahan.** Saat ini dalam proses pematangan lahan.
- b. **Konstruksi IPAL.** Perlu dilakukan *updating* dokumen *Environmental Impact Assessment* (EIA). Untuk lelang konstruksi, saat ini dalam finalisasi *bidding document* dan akan disampaikan ke ADB pada bulan Agustus 2018, akan dilakukan pula diskusi untuk menentukan metode lelang yang paling tepat digunakan.
- c. **Konstruksi Jaringan Perpipaan.** Saat ini dalam proses permohonan NOL *bidding document* ke ADB. Lelang direncanakan pada bulan September 2018 dengan durasi kontrak 30 bulan.

Kota Jambi. *Bidding document* dalam proses finalisasi. Pelaksanaan lelang di Kota Jambi baru dapat dimulai setelah isu lahan selesai.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terdapat lahan di Kota Jambi yang diklaim oleh warga. Isu ini berdampak besar pada keberlanjutan kegiatan karena Kota Jambi belum memiliki sertifikat atas lahan yang telah dibeli tersebut. Pemkot Jambi telah berkoordinasi dengan BPN setempat untuk mengurus sertifikat tersebut, namun belum ada kejelasan kapan sertifikat tersebut akan diperoleh.
- Berdasarkan perhitungan kebutuhan waktu konstruksi dengan sisa waktu pinjaman, penyelesaian kegiatan akan melampaui waktu tutup pinjaman.

Tindak Lanjut

- *Executing agency* telah berkoodinasi secara intensif dengan Pemkot Jambi. *Executing agency* juga akan melakukan audiensi dengan Pemkot Jambi untuk membahas keberlanjutan kegiatan pada bulan Agustus 2018.
- Rencana penpranjangan ini masih akan dibahas lebih lanjut, terutama terkait kebutuhan penambahan waktunya.

**NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015**

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8213-ID	01/03/2013 s/d 31/12/2018	USD	266,0	258,4	97,1	7,6	5,8	14,0	0,8	5,6



Pelatihan Masyarakat di Manado

Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek (Provinsi)

- | | | |
|------------------------|------|---------------------|
| a. Nangroe Darussalam | Aceh | k. Sulawesi Barat |
| b. DI Yogyakarta | | l. Sulawesi Utara |
| c. Jawa Tengah | | m. Sulawesi Tengah |
| d. Jawa Timur | | n. Sulawesi Selatan |
| e. Bali | | o. Maluku |
| f. Nusa Tenggara Timur | | p. Maluku Utara |
| g. Nusa Tenggara Barat | | q. Gorontalo |
| h. Kalimantan Tengah | | r. Papua |
| i. Kalimantan Selatan | | s. Papua Barat |
| j. Kalimantan Timur | | |

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya
- Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin
- Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan Kegiatan. Berkas proposal dan DED kelengkapan pengajuan dokumen usulan pencairan sampai saat sedang dalam proses reuiu. CPMU/Satker akan koordinasi bersama KMP memantau percepatan pemberkasan dokumen pencairan tahap 1 pada Satker PIP Kab/Kota. Diharapkan maksimal pencairan dapat dilakukan pada minggu pertama bulan Agustus 2018. Sementara itu untuk revisi dari SK Satker akan diterbitkan pada minggu ke-4 bulan Juli.



NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT

Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0174	18/09/2016 s/d 04/05/2021	USD	8,0	2,0	25,0	6,0	-13,4	2,2	0,0	0,0
IDB	IND-0175	18/09/2016 s/d 09/05/2021	USD	311,8	72,9	23,4	238,9	-14,9	69,4	0,0	0,0
	IND-0176	18/09/2016 s/d 22/11/2021	USD	10,0	0,7	6,9	9,3	-27,4	0,7	0,0	0,0

Sumber: www.kotaku.pu.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

- a. Satuan Kerja Pusat
- b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi

❖ Lokasi Proyek

- a. Aceh
- b. Sumatera Utara
- c. Sumatera Barat
- d. Riau
- e. Jambi
- f. Sumatera Selatan
- g. Bengkulu
- h. Lampung
- i. Kepulauan Bangka Belitung
- j. Kepulauan Riau
- k. DKI Jakarta
- l. Jawa Barat
- m. Banten
- n. Kalimantan Barat
- o. Kalimantan Utara



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Membangun/mengembangkan kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat proses pengambilan keputusan lokal
- Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin, melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat
- Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan usaha ekonomi, dan lain-lain
- Mendorong terwujudnya pembangunan lingkungan permukiman terpadu melalui implementasi tata pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin

❖ Kemajuan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak*	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Block Investment for Slum Alleviation and Prevention									
	IND-174 (Vocational Training di BLK)	-	1,26	-	1,7	-	-	-	100	-
	IND-175 (BDI PLPBK dan BDI Skala Kawasan)	12,83	36,83		10,73	0,08	0,7	-	100	-
	IND-176	-	0,69	-	0,67	-	-	-	100	-
2	Building Community Institutions and Local Government									
	IND-174 (Feasibility Studies for Sustainable Livelihood)	-	0,11	-	0,05	-	-	-	100	-
	IND-175 (Pelatihan Masyarakat Reguler dan Pelatihan Dasar)	13,39	20,18		6,64	1,59	23,9	-	100	-
3	Knowledge Generation and Reverse Linkage (IND-174)	-	0,82	-	0,48	0,19	39,6	-	100	-
4	Management, Design, and Supervision Consultancy (IND-175)	6,02	3,75	62,3	6,02	3,75	62,3	-	100	-

Catatan : * Nilai Kontrak Tahunan



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0174 (*Service Ijara*)

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Block Investment for Slum Alleviation and Prevention.** Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan. Untuk komponen ini dialokasikan sebesar USD 57,5 juta untuk 3.750 kelurahan dengan pencairan 2 tahap.
2. **Feasibility Studies for Sustainable Livelihood.** Saat ini tengah dilakukan proses seleksi 15 kota yang akan mengikuti BDC NUSP dengan target bulan Agustus 2018. Saat ini Ditjen Cipta Karya tengah melakukan reviu perubahan konsep *Feasibility Study* menjadi tidak hanya terkait dengan *livelihood economy* namun juga dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur. IDB meminta agar perubahan tersebut masih sesuai dengan lingkup kegiatan dalam perjanjian pinjaman.
3. **Knowledge Generation and Reverse Linkage.** Konsultan *Monitoring and Evaluation* terkontrak dan dalam persiapan evaluasi dampak kegiatan ICDD III. Untuk konsultan *curriculum enhancement*, TOR kegiatan sudah disusun dan terdapat beberapa kandidat konsultan.

Porsi IND-0175 (*Istisna'a*)

Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Block Finance.** BDI Infrastruktur untuk skala lingkungan dalam proses pelaksanaan di 107 kabupaten/kota. Sedangkan untuk BDI infrastruktur skala kawasan, saat ini masih dalam persiapan lelang untuk 2 kota yaitu dalam tahap penyusunan dokumen lelang. IDB telah memberikan tanggapan terkait *procurement plan* yang sudah disampaikan dan diperlukan beberapa perbaikan dan detail informasi sebelum NOL terbit. Masih akan ada kota/kabupaten lain yang siap lelang untuk BDI skala kawasan hingga Januari 2019.
2. Paket Pekerjaan *Building Community Institutions and Local Government* sedang dalam pelaksanaan.
3. **Management, Design, and Supervision Consultancy.** Konsultan NMC dan OC sudah termobilisasi pada bulan Mei 2018. Untuk *design supervision consultant* baru direncanakan kontrak pada bulan September 2018.

Porsi IND-0176 (*ISFD loan*)

Pada pinjaman ini, terdapat 1 paket kegiatan yaitu *Sustainable Livelihood to Support Slum Alleviation and Prevention*. Target pelaksanaan di 50 kelurahan melalui PPMK, penyaluran BDI, dan BDC. Saat ini tengah menunggu hasil penyusunan *Feasibility Study Sustainable Livelihood* yang ada pada porsi IND-0174 yang akan digunakan sebagai kerangka *livelihood vocational training*. Dilakukan pula proses finalisasi pedoman PPMKd.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Adanya reviu terkait rencana perubahan konsep *Feasibility Study* yang mencakup lebih banyak keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek dan juga kemungkinan perubahan lingkup proyek.

Tindak Lanjut

PMU perlu segera menindaklanjuti dan menyelesaikan isu terkait rencana perubahan ini.

**NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)**

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8636-ID	11/10/2016 s/d 22/03/2022	USD	216,5	26,6	12,3	189,9	-19,2	25,7	7,6	29,5

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek**

- Nangroe Aceh Darussalam
- DI Yogyakarta
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Bali
- Nusa Tenggara Timur
- Nusa Tenggara Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Maluku
- Maluku Utara
- Gorontalo
- Papua
- Papua Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Penyediaan dan Perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya;
- Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin;
- Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, kemajuan penarikan kumulatif pinjaman NSUP yaitu senilai USD 26,56 juta atau 12,27% dari total pinjaman.

Pelaksanaan Kegiatan. Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk kelurahan *grants* memiliki alokasi sebesar Rp 166,6 milyar untuk tahun 2018 yang tersebar di 351 kelurahan. Sampai dengan Triwulan II 2018 sedang dalam proses reviu berkas proposal dan DED kelengkapan pengajuan dokumen usulan pencairan. Ditargetkan pada minggu ke-4 bulan Juli, percepatan revisi SK Pejabat Perbendaharaan Satker PIP Kabupaten tersebut dapat diselesaikan.

Untuk alokasi kegiatan infrastruktur skala kota dalam 1 provinsi tahun 2018 sebesar Rp 15,5 milyar. Terdapat kendala terkait pencairan dana ini yaitu adanya masalah kendala proses hibah lahan di Kota Surakarta dan masih dalam proses penyusunan dokumen lelang di Kota Pekalongan.

Dari 12 paket untuk jasa konsultan pusat, 5 diantaranya sudah tekontrak dan 7 merupakan kontak baru. Dana untuk paket pekerjaan ini berasal dari pinjaman Bank Dunia yang melakukan *co-finance* dengan AIB dengan alokasi untuk tahun 2018 sebesar Rp 39,8 milyar. Saat ini sedang dilakukan lelang ulang untuk new OSP dan diharapkan pada bulan Agustus pemenang lelang sudah diumumkan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

- Berkaitan alokasi untuk kelurahan *grants*, revisi SK Satker sampai saat ini belum terbit melalui Setditjen Cipta Karya.
- Adanya kendala untuk pencairan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat/pelatihan masyarakat di provinsi NTB. Hal ini dikarenakan fasilitator kelurahan belum mengajukan ke satker.

Tindak Lanjut

- CPMU/Satker akan melakukan koordinasi bersama KMP memantau percepatan pemberkasan dokumen pencairan tahap 1 pada satker PIP Kab/kota. Maksimal pencairan pada minggu pertama Agustus 2018.
- Diharapkan Satker provinsi melakukan monitoring pencairan.



NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3122-INO	17/07/2014 s/d 31/12/2019	USD	74,4	61,8	83,0	12,6	10,6	8,1	3,2	39,9



Kegiatan Skala Lingkungan di Kota Semarang

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman

❖ **Lokasi Proyek**

20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened*
- Upgrading infrastructure in participating neighborhood*
- Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kegiatan Skala Lingkungan. Kegiatan skala lingkungan dilakukan di 99 kelurahan dalam proses pelaksanaan.

New Site Development (NSD). Pembangunan infrastruktur di Kota Kendari dan Kota Palopo sudah dimulai. Saat ini dalam proses mobilisasi material dan pekerja. Sedangkan untuk Kota Bima dan Kabupaten Kapuas, proposal teknis NSD dan *Initial Environmental Examination* (IEE) masih dalam tahap finalisasi karena menunggu kelengkapan data dukung dari hasil uji laboratorium.

Kegiatan Skala Kawasan. Dilakukan perubahan mekanisme lelang dari *post-review* ADB menjadi *prior-review* ADB sehingga kegiatan skala kawasan belum dapat dilaksanakan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Pelaksanaan kegiatan skala lingkungan di Kota Palembang terkendala permasalahan belum adanya verifikasi dokumen Rencana Kerja Masyarakat oleh PPK PKPBM sehingga SPK kegiatan skala lingkungan belum ditandatangani.
- Pelaksanaan NSD di Kota Bima dan Kabupaten Kapuas belum dilaksanakan karena persyaratan dokumen belum terpenuhi.

Tindak Lanjut


- Dilakukan pendampingan dan pemantauan intensif terhadap proses verifikasi.
- Perlu dilakukan pengawasan intensif terhadap proses ini dan dilakukan percepatan apabila dibutuhkan agar kegiatan dapat selesai sebelum waktu tutup pinjaman.



RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREAS DEVELOPMENT (RISE II)

Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-564	23/06/2014 s/d	JPY	10.029,0	9.554,4	95,3	474,6	10,5	0,0	0,0	0,0
		28/06/2019	USD	90,8	86,5		4,3		0,0	0,0	

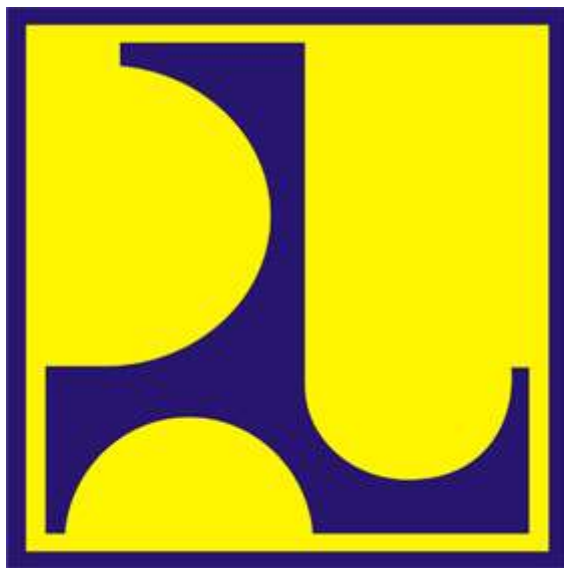

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung
- Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan)
- Jasa konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Loan IP-564 ini akan berakhir pada bulan Juni 2019, sementara pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan pada tahun 2016, diharapkan agar kegiatan melakukan percepatan penutupan loan untuk mengurangi *commitment fee*. Percepatan penutupan loan belum dapat dilakukan karena masih menunggu PCR dari semua pelaksana proyek dan laporan Reksus. Setelah PCR dari semua pelaksana proyek terkumpul akan dilakukan penggabungan dokumen PCR yang digunakan sebagai laporan akhir dari pelaksanaan proyek. Setelah dokumen laporan akhir proyek RISE - II selesai, pelaksana proyek akan mengadakan pertemuan untuk membahas percepatan penutupan loan. Pelaksana proyek menginformasikan bahwa *Project Completion Report* (PCR) sudah selesai, namun belum disampaikan secara resmi kepada JICA.



SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA

Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0167	29/10/2014 s/d 29/10/2019	USD	100,0	38,3	38,3	61,7	-35,0	27,6	0,0	0,0



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a. Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota
- b. Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman
- c. Satuan Kerja Direktorat Bina Program

❖ **Lokasi Proyek**

- a. Provinsi Aceh
- b. Provinsi Sumatera Utara
- c. Provinsi Sumatera Barat
- d. Provinsi Riau
- e. Provinsi Jambi
- f. Provinsi Sumatera Selatan
- g. Provinsi Bengkulu
- h. Provinsi Lampung
- i. Provinsi Bangka Belitung
- j. Provinsi Jawa Barat
- k. Provinsi DKI Jakarta
- l. Provinsi Banten
- m. Provinsi Kalimantan Barat

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Provision of Community Sanitation Infrastructure
- b. Consulting Services



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		Target	TA 2018		Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%		Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Provision of Community Sanitation Infrastructure	38,34*	44,25	-	22,37	-	-	51,6**	11,7	-
2	Consultancy Services									
	National Project Management Consultant (NPMC)	1,54	0,86	56	0,44	0,21	48	97,89	42,95	15,39
	Regional Project Management Consultant (RPMC) I	1,80	0,93	52	0,51	0,21	41	93,48	44,38	13,48
	Regional Project Management Consultant (RPMC) II	1,57	0,79	50	0,44	0,19	43	64,4	44,11	14,40
	Regional Project Management Consultant (RPMC) III	1,65	0,81	49	0,47	0,20	43	64,15	44,06	14,15
	Regional Project Management Consultant (RPMC) IV	1,51	0,79	52	0,43	0,19	44	62,80	45,89	15,30
	Monitoring and Evaluation Consultant	0,44	0,19	43	0,22	0,13	59	29,44	63,50	29,44

Catatan :

* Terdapat perubahan data

** Realisasi kumulatif fisik berdasarkan block finance yang sudah selesai. Tidak termasuk yang on-going.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pinjaman. Saat ini pengajuan pengisian reksus sebesar USD 34 juta sedang berproses di Kementerian Keuangan.

Provision of Community Sanitation Infrastructure. Secara kumulatif dari tahun awal pelaksanaan proyek, kegiatan telah selesai dilakukan di 929 lokasi dari total 1.800 lokasi (pencapaian 100% di 922 lokasi dan 7 lokasi pencapaian termin 1 dan 2). Sisa 871 lokasi akan diselesaikan pada TA 2018 dengan rincian Tahap 1 sebanyak 212 lokasi di 35 Kabupaten/Kota sudah teralokasi di reksus dan Tahap 2 akan dialokasikan melalui revisi DIPA 2018.



Consultancy Services. Konsultan NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV dalam proses pelaksanaan. Pada Triwulan II 2018 akan melakukan pencairan tahap 6. Konsultan *monitoring and evaluation* telah terkontrak. Saat ini dalam proses pelaksanaan dan telah melakukan pencairan uang muka.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Proses revisi DIPA untuk penyelesaian sisa lokasi masih berlangsung. Dilihat dari sisa waktu pelaksanaan di tahun 2018, terdapat kemungkinan penyelesaian pembayaran di beberapa lokasi baru dapat dilaksanakan di bulan Februari 2019.
- Pembayaran konsultan TFL belum bisa termobilisasi akibat proses revisi DIPA 2018 pada Satker PLPNM dan Satker PSPLP Provinsi belum selesai.
- Terdapat perubahan Pejabat Inti Satker pada beberapa Kabupaten/Kota.
- Perlu kepastian mengenai *closing date* proyek karena di data Kementerian Keuangan belum *ter-update* ke *closing date* per 29 Oktober 2019.

Tindak Lanjut

- PMU berencana untuk menjalankan penyiapan masyarakat secara paralel sambil menunggu proses revisi DIPA berlangsung. Anggaran kegiatan untuk 2019 perlu dipersiapkan agar tidak terjadi keterlambatan kegiatan akibat belum dianggarkan dalam DIPA 2019.
- Perlu dilakukan *follow-up* dan koordinasi lebih lanjut terkait proses revisi DIPA.
- Usulan perubahan sudah disampaikan oleh PMU, saat ini masih diproses internal Kementerian PUPR. PMU perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar isu perubahan pejabat ini tidak terjadi kembali karena menghambat pelaksanaan kegiatan.
- Dit. Pinjaman dan Hibah DJPPR Kemkeu akan bersurat ke IDB untuk mengkonfirmasi *closing date* proyek.

**SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)**

Perbaiki dan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)	PV	TA 2018 (juta USD)		
				(juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8259-ID	02/08/2013 s/d 31/11/2018	99,9	81,1	81,2	18,8	-	19,7	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

❖ **Lokasi Proyek**

32 Provinsi, 218 Kabupaten, 1455 Desa

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)**

- Implementation Support and Project Management
- Community Empowerment and Local Institutional Development
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure in 32 Provinces
- District and Village Incentives Grants

❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	Goods, Non Consulting Services, Workshops and Training under Part A and E of the Project	31,5
2	Grants under Part C of the Project	65,1
3	Consultants' Services	3,4
Total		99,9



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Pelaksanaan kegiatan. Terdapat 1 Satker PIP Kabupaten yang sedang mengajukan revisi SK Satker, sehingga alokasi dana yang tidak terserap sampai dengan akhir Juli yaitu sebesar Rp 1.064.000.000,- untuk 11 desa. Terkait dengan hal ini akan dilakukan percepatan revisi SK Satker PIP Kabupaten dengan target paling lambat pada minggu ke - 4 Juli 2018. Di samping itu, terkait dengan SK Dirjen Cipta Karya untuk penerima HKP akan dilakukan percepatan penetapan SK yang ditargetkan pada minggu ke - 3 bulan Juli 2018.

**SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)**

Untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikkan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
				(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8578-ID	22/08/2016 s/d 31/12/2020	300,0	55,1	18,4	244,9	-24,1	71,6	7,9	11,0



Reservoir Air Bantuan Program PAMSIMAS III di desa Kampal, Kecamatan Talo, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

Sumber: www.ciptakarya.pu.go.id

❖ **Instansi Pelaksana**

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

❖ **Lokasi Proyek**

33 Provinsi

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)**

- Community Empowerment, Local and Village Institutional Development
- Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services
- Water Supply and Public Sanitation Infrastructure
- District and Village Incentives
- Implementation Support and Project Management

❖ **Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen**

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)
1	<i>Community Empowerment, Local and Village Institutional Development</i>	140,07
2	<i>Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services</i>	29,48
3	<i>Water Supply and Public Sanitation Infrastructure</i>	62,97
4	<i>District and Village Incentives</i>	6,00
5	<i>Implementation Support and Project Management</i>	61,53
Total		300,00

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan Penyerapan Anggaran. Pada tahun 2018, target realisasi pinjaman untuk proyek PAMSIMAS III yaitu senilai USD 71,57 juta. Sampai dengan Triwulan II 2018 anggaran telah terserap USD 7,87 juta atau 11% dari total target tahun ini. Adapun untuk paket kontrak kegiatan *Goods, Consultant, Services, Workshop dan Training* di tahun 2018 ini Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menargetkan realisasi senilai USD 820.896, dan sampai dengan triwulan ini sudah terserap senilai USD 12.228. Ditjen PPMD Kementerian Perdesaan dan PDTT menargetkan realisasi pinjaman senilai USD 746.269, namun sampai dengan triwulan ini belum terdapat penyerapan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Berkaitan dengan *Village Grants* (BLM reguler) Terdapat 17 Satker PIP Kabupaten yang sedang mengajukan revisi SK Satker PIP, sehingga masih terdapat alokasi dana Triwulan I 2018 yang tidak terserap. Sampai dengan akhir Juli 2018 alokasi dana Triwulan I 2018 yang tidak terserap yaitu senilai Rp 26.200.822,400 di 274 target desa. Terkait dengan hal ini akan dilakukan percepatan revisi SK Satker PIP Kabupaten yang ditargetkan selesai pada Minggu ke-4 Juli 2018. Selain itu akan dilakukan pula pendampingan dan pengendalian pencairan dana triwulan I.

Terkait dengan paket ROMS 1 – 18, terdapat keterlambatan pencairan pada bulan Maret – Juni 2018. Hal ini disebabkan revisi DIPA yang baru terbit pada tanggal 29 Juni 2019. Dalam hal ini proyek akan melakukan percepatan proses pencairan *invoice* bulan Maret sampai dengan Juni 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan barang dan jasa

Paket kontrak lainnya seperti *workshop* (5 paket) dan *Konsultan Advisory* (2 paket) terdapat keterlambatan proses lelang, karena NOL Bank Dunia yang terlambat.

Tindak Lanjut

CPMU akan berkoordinasi dengan Bank Dunia untuk mempercepat proses penerbitan NOL.

**SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANTS FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER)**

Menyediakan Modul Darurat Yang Disiapkan Untuk Mengatasi Potensi Bencana di 4 Kota di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)			
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%	
Spanyol	DNI-00805-023-T	02/08/2016	EUR	14,0	11,1	79,8	2,8	-28,5	7,5	7,2	96,0	
		s/d										
		07/05/2018	USD	16,1	12,9		3,3		8,7	8,3		

Keterangan : *kurs 1 USD = Rp 14.404,- dan 1 EUR = Rp 16.666,88

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jenderal Cipta Karya)

❖ **Lokasi Proyek**

- Kota Medan
- Kota Bekasi
- Kota Makassar
- Kota Surabaya

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengadaan dan pemasangan (instalasi) peralatan air bergerak (*Mobile Water Treatment Plant*) untuk penanganan bencana
- Program pelatihan *Emergency Model Units* (EMU's)
- Penyiapan infrastruktur, termasuk penyiapan lahan dan pembangunan gudang, jalan akses ke lokasi gudang/LOS (*Location Open Storage*) penyediaan air, sambungan listrik, komunikasi, dan pemagaran gudang



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
1	<i>Civil Works</i>	1,34	2,4	100	1,34	2,4	100	100	100	100
2	<i>Supply of Goods</i>	15	14	98	15	14	98			

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Kemajuan *civil works* 100%.
- Pengiriman sarana dan prasarana kegiatan SSWTP-ER dan pelatihan sudah selesai dilaksanakan.
- Alat – alat dari Spanyol semua sudah sampai di gudang Bekasi.
- Terdapat sisa *loan* sekitar EUR 2 juta, yang akan digunakan untuk membayar kontraktor SETA (sedang proses administrasi pencairan).
- Saat ini sedang dalam proses penyelesaian dokumen administratif di KPPN Hibah. Ditargetkan proses administrasi dapat selesai di pertengahan Agustus 2018.
- Perpanjangan masa efektif pinjaman menjadi tanggal 31 Agustus 2018 telah disetujui oleh ICO Spanyol.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Pengadaan peralatan dan perlengkapan proyek SSWTP-ER, perlu revisi dokumen SKP (Sisa Kemampuan Paket).

Tindak Lanjut

Proses dokumen revisi SKP di KPPN Hibah Jakarta untuk penerbitan amandemen L/C di Bank Indonesia dan penerbitan Nota Dinas L/C sebagai dasar penerbitan SP3. Target pertengahan Agustus 2018 sudah terbit SP3.

DIREKTORAT JENDERAL

SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**BALI BEACH CONSERVATION PROJECT (PHASE 2)**

Konservasi pantai di Bali

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-575	27/07/2017	JPY	9,855,0	0,0	0,0	9,855,0	-	1,488,9	0,0	0,0
		s/d 27/07/2025	USD	89,2	0,0	0,0	89,2	11,5	13,5	0,0	

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi
- Pekerjaan sipil untuk konservasi pantai di Bali

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Bali Beach Conservation – Phase II* merupakan kelanjutan dari kegiatan *Bali Beach Conservation – Phase I (BBC I)* yang pelaksanaannya selesai pada tahun 2009. Lingkup pekerjaan BBC I adalah pekerjaan sipil untuk mencegah erosi dan rehabilitasi pantai yang rusak di pantai Sanur, Nusa Dua, Kuta dan Pura Tanah Lot dan jasa konsultansi. Sedangkan, pekerjaan BBC II mencakup pekerjaan sipil untuk konservasi pantai Candisasa, Kuta Utara – Legian – Seminyak – Canggu -, Nusa Dua dan Tanjung Benoa, dan Jasa Konsultansi. *Loan* IP-575 efektif pada Juli 2017. Hingga periode laporan ini belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada realisasi penyerapan dana pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan *procurement* (dalam tahap PQ).



CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT

Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-19	14/02/2012 s/d	KRW	111.294,3	43.389,0	39,0	67.905,3	-53,9	27.102	1.416	5,2
		22/03/2019	USD	99,4	38,8		60,7		24,2	1,3	



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

❖ Ruang Lingkup Pekerjaan

- Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di Kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m³/detik
- Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industri kota Serang, Cilegon dan tambahan air irigasi Daerah Irigasi Ciujung (23.000 hektar)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan dari proyek ini terdiri dari 3 paket yaitu Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket *Hydromechanical Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak.

Hingga periode laporan Triwulan II 2018, pelaksana proyek melaksanakan dua paket pekerjaan yaitu Paket Supervisi Konstruksi dan Paket *Civil Works* Pembangunan Bendungan Karian. Berdasarkan target tahun 2018, capaian fisik Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 14,47% (target tahun 2018 sebesar 22,73%) dan capaian fisik paket *Civil Works* - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 12,49% (target tahun 2018 sebesar 28,59%).

Paket *Hydromechanical Works*. Proses lelang menggunakan metode *International Competitive Bidding* (ICB). Kemajuan saat ini adalah menunggu persetujuan EDCF (NOL) terkait dokumen lelang (*main bidding document*).



Kemajuan Pembebasan Lahan

Total lahan yang dibutuhkan untuk projek pembangunan bendungan Karian ini sebesar ± 2.226,44 Ha, yang terdiri dari :

- Lahan *quarry* dan jalan aksesnya seluas ± 32,68 Ha (terdapat jalan akses di kawasan hutan ± 5,2 Ha). Sampai dengan saat ini baru dapat dibebaskan seluas ±15,34 Ha.
- Tapak bendungan, genangan dan *greenbelt* seluas ± 2.193,76 Ha (terdapat genangan di kawasan hutan seluas ± 195 Ha).

Kemajuan pembebasan lahan di lapangan sebesar 47,14% dari total lahan (laporan Juni 2018). Kemajuan ini masih sama dengan kemajuan laporan periode sebelumnya.

Kebutuhan (Ha)			Realisasi (Ha)			Sisa Belum Bebas (Ha)		
Kaw. Hutan	Non Kaw. Hutan	Total	Kaw. Hutan	Non Kaw. Hutan	Total	Kaw. Hutan	Non Kaw. Hutan	Total
200,20	2.026,24	2.226,44	195,00	854,51	1.049,51	5,20	1.171,73	1.176,93

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

- Luas lahan lokasi sumber material batu (*quarry area*) gunung Geblengan dan akses jalan yang belum bebas seluas ± 17 Ha. Terdiri dari luas lahan *quarry* ± 10 Ha dan jalan akses ± 7 Ha (Jalan akses tersebut mengenai kawasan perhutani, lahan milik BPJS, dan PTPN VIII). Lahan *quarry* ± 10 Ha belum diketahui kepemilikan atas lahan tersebut.
- Terdapat 9 (sembilan) menara SUTT 70 KVA milik PT. PLN yang berada pada daerah genangan bendungan. Pada tahun 2016, SID pemindahan jalur SUTT pada genangan bendungan Karian telah selesai dilakukan, dan akan dilanjutkan dengan proses pengadaan lahan dan pelaksanaan pemindahan jalur SUTT.
- Terdapat sengketa kepemilikan lahan seluas ± 65 Ha di desa Pasir Tanjung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak. Sebagian lahan sengketa berada dalam tapak bendungan Karian. Sengketa terjadi antara masyarakat setempat dengan PTPN VIII.
- Terdapat tanah milik PT. Candipura yang sertifikatnya masih menjadi jaminan hutang di Kementerian Keuangan (KPKNL II Jakarta).
- Ganti rugi Instalasi Pengelolaan Air Milik PDAM
- Terdapat 51 situs makam yang perlu direlokasi. Sampai dengan saat ini baru berhasil melakukan relokasi 1 (satu) situs makam.

Tindak Lanjut

- Terkait lahan *quarry* seluas ± 10 Ha berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi permasalahan tersebut.
- Lahan jalan akses kawasan Perhutani, lahan yang dibutuhkan sekitar ± 5,28 Ha dan saat ini masih dalam proses permohonan Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani. Sedangkan lahan BPJS dan PTPN VIII berada dalam sengketa kepemilikan sehingga akan diselesaikan melalui mekanisme penitipan kerugian, namun proses penitipan ganti rugi tersebut terkendala pendanaan karena pengadaan tanah untuk projek strategis nasional melalui pendanaan oleh L-MAN (Lembaga Manajemen Aset Negara, dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan).
- Permohonan MoU kepada PT. PLN (persero).
- Proses sidang perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk dua bidang tanah seluas ± 3 Ha telah ada keputusan, sedangkan sisanya seluas ± 62 Ha belum ada sidang perdata lanjutan. Status saat ini yaitu dalam Tahapan Identifikasi dan Inventarisasi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Lahan. Berdasarkan surat dari PTPN VIII nomor SB/III.2/32228/VIII/2016 dijelaskan bahwa status tanah di blok Cinihnih seluas ± 65,50 Ha merupakan Hak Guna Usaha (HGU) lahan PTPN VIII Kebun Cislak Baru.
- Tata cara pembayaran ganti rugi masih menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan.
- Kesimpulan dari koordinasi awal adalah Kementerian PUPR melalui BBWSC-3 harus memindahkan dan membangun kembali instalasi pengelolaan air tersebut.
- Sisanya masih menunggu kebijakan atau regulasi yang mengatur detail relokasi situs makam tersebut.

**COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I**

Konservasi daerah tangkapan air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-552	28/07/2009 s/d	JPY	6,060,0	5,345,1	88,2	714,9	-11,8	189	57,7	30,5
		28/07/2018	USD	54,8	48,4		6,5		1,7	0,5	



Control Structure Sistem

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan *spillway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spillway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan check dam
- Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak	Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2018								Total		
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		T	R	
	T	R	T	R	T	R	T	R			
<i>Consulting Service</i>											
Pembangunan <i>Spilway</i>					Selesai					100	100
Pengadaan dan Pemasangan					Selesai					100	100
Pengadaan Kapal Keruk					Selesai					100	100
Pembangunan <i>Check Dam</i>					Selesai					100	100
Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pekerjaan Terasing di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Gunungsari (P.6-1)					Selesai					100	100
Pengelolaan Pekerjaan Terasing Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2)					Selesai					100	100
Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-4)					Selesai					100	100
Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5)					Selesai					100	100
Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7)					Selesai					100	100
Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8)	96,50	92,44	100	100			Selesai			100	100
Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No.8.a)	74,04	76,36	100	100			Selesai			100	100

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-552 terdiri dari satu paket jasa konsultan dan enam paket jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4 dan Paket 6-5). Paket 6.6 s/d Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan dan direalokasi menjadi paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7), Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8) dan Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8.a). Paket 7 (pengadaan tiga unit kapal keruk (*Dredger*)), tanda tangan kontrak pada tanggal 11 Oktober 2016, capaian fisik telah mencapai 100% pada tahun 2017. Paket 8, konstruksi penyiapan pembuangan sedimennya telah dikerjakan, capaian fisiknya telah mencapai 100% pada Triwulan II 2018. Paket 8A, Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk, kemajuan fisik di lapangan telah mencapai 100% pada Triwulan II 2018. Seluruh pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan IP-552 telah selesai pada laporan Triwulan II 2018. Masa berlaku pinjaman kegiatan IP-552 akan berakhir pada tanggal 28 Juli 2018.



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-567	23/06/2014	JPY	4.954,0	651,5	13,2	4.302,5	-47,4	929,8	95,4	10,3
		s/d 23/06/2021	USD	44,8	5,9		38,9		8,4	0,9	



Uji coba kapal keruk

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo
- SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo
- PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan *Spilway*, pengadaan dan pemasangan pintu *spilway*, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan *check dam*.
- Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua paket jasa konstruksi yaitu Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang (II). Paket konsultan supervisor terkontrak pada tanggal 15 September 2016 (Triwulan III 2016), capaian fisik hingga Juni 2018 baru sekitar 44%. Paket 2.1 (*Construction of Closure Dike and Overflow Dike*) terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016, capaian fisik hingga akhir Juni 2018 baru sekitar 28%. Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang (II) hingga periode laporan Triwulan II 2018 belum terkontrak. Pada Rapat Koordinasi Pemantauan Pinjaman Hibah Luar Negeri di Bappenas, pelaksana proyek menginformasikan bahwa Paket 2.2 rencananya akan dibatalkan, karena permasalahan kondisi lapangan (alur sungai berpindah-pindah). Namun, masih menunggu keputusan akhir pembatalan Paket 2.2.

Watershed Conservation Slice II masih terkendala terkait metode pelaksanaan yang dilaksanakan secara swakelola dengan pembayaran menggunakan *special account*. Rencana akan lelang bulan Agustus 2018 dengan metode LCB.

DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) PHASE II

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Dilokasi yang Terpilih, serta Memperkuat Kapasitas Operasi dan Manajemen Keamanan Bendungan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8711-ID	04/08/2017 s/d 30/06/2023	USD	125	0,8	0,7	124,2	-14,6	26,4	1,6	5,9
AiIB				125	0,8	0,7	124,2		26,4	1,6	5,9



Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi

Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Aceh
- Provinsi Lampung
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Bali
- Provinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Dam Operational and Safety Improvement Works and Studies*
- Operations and Maintenance Improvement and Capacity Building*
- Reservoir Sedimentation Mitigation*
- Dam Safety Institutional Improvement*
- Project Management*



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Tahun kedua proyek DOISP II pada Triwulan II 2018 sudah dapat melakukan realisasi pinjaman sekitar 1,56 juta, sekitar 5,94 % dari target USD 26,4 juta pada tahun 2018. Kegiatan diperuntukkan untuk melakukan kegiatan Paket 1 *Dam Operational and Safety Improvement Works and Studies*.

Project Management. Aktivitas kegiatan belum banyak dilakukan. Dua paket untuk pekerjaan rehabilitasi DAM sudah dimulai sejak Januari 2018, diantaranya di Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan III dan BBWS Begawan Solo.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Target pencairan dana DOISP II hingga 2018 adalah 16,59% dari USD 250 juta, sementara realisasi pencairan hingga pertengahan 2018 hanya 0,68% (USD 1.691.598)
- Adapun penyebab permasalahannya adalah:
 - Pada saat memasukkan data kontrak di aplikasi KPPN, aplikasi belum mengakomodir kontrak dengan dua sumber dana pinjaman (Bank Dunia 50% dan AIB 50%).
 - Kemungkinan ada *missed communication* antara KPPN dengan Satker Balai (PIU), karena ada kasus pihak Satker Balai yang membawa dokumen ke KPPN kurang memahami kontrak terkait. Sehingga KPPN salah menangkap maksud Satker Balai atau kurang pahamnya Satker Balai mengenai pemahaman kontrak utama / ADK utama/ADK turunan.
 - Aplikasi KPPN belum mengakomodir jika pekerjaan Paket Kontrak melewati tahun anggaran.

Tindak Lanjut

- Mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu untuk memfasilitasi program pada sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk mengakomodir Pinjaman Co-Financing dengan tidak lagi menggunakan 2 (dua) register *Loan* untuk satu kegiatan pada DIPA
- Untuk mengatasi *missed communication* antara KPPN dengan Satker Balai (PIU) atau ketidakpuasan konsultasi dengan *Customer Service* KPPN setempat, hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan masalah tersebut langsung ke layanan *Helpdesk* Terintegrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan web : <https://hai.djpbn.kemenkeu.go.id/>
- Untuk mengatasi permasalahan paket kontrak yang melewati tahun anggaran/tahun jamak maka PIU pada saat akhir tahun anggaran akan melaporkan sisa dana yang belum realisasi/dicairkan dari paket kontrak tersebut ke KPPN dan Kanwil setempat agar sisa dana yang belum dicairkan bisa ditambahkan ke DIPA tahun anggaran yang akan datang.



FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN

Peningkatan Keisapan dalam Mengelola dan Mengurangi Risiko Banjir

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3440-INO	9/12/2016 s/d 31/12/2022	USD	108,7	3,5	3,2	105,2	-22,4	10,8	1,5	13,9

❖ **Instansi Pelaksana**

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Kementerian Dalam Negeri – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
- Kementerian PPN/Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ **Lokasi Proyek**

- Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian
- Wilayah Sungai Ambon – Seram

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Enhanced Planning for Flood Risk Management*
- Improved Land Management and Upgraded Flood Infrastructure*
- Enhanced Capacity for Community Based Flood Risk Management (CBFRM)*
- Improved Policy, Coordination and Capacity*

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Konsultan. Hampir seluruh konsultan utama telah terkontrak dan saat ini dalam proses pelaksanaan. Konsultan yang belum terkontrak yaitu konsultan di Bappenas.

Konstruksi. Lelang 2 paket konstruksi di Ciujung sudah masuk proses PQ dengan target kontrak pada bulan Oktober 2018. Untuk konstruksi di Batu Merah *Check Dam* saat ini dalam proses *review design*.

Pembebasan Lahan. Implementasi *resettlement plan* untuk Ciujung telah selesai untuk 128 Ha, sisa 21 Ha lahan pemerintah sudah dikoordinasikan dengan BPN setempat dan secara prinsip tidak ada masalah. Untuk 9 Ha lahan pertanian berupa tanah timbul, masih perlu didiskusikan dan menunggu Keppres. Sedangkan untuk pembebasan lahan di Ambon masih dalam tahap persiapan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

On-granting belum dapat dilaksanakan karena masih ada revisi berupa penambahan *item* di Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

Tindak Lanjut

Percepatan proses revisi dan pelaksanaan kegiatan akan segera dilakukan. Sebagai pembelajaran untuk kegiatan lainnya, *On-granting* sebaiknya sudah disiapkan pada saat penyiapan kegiatan sehingga dapat segera dilaksanakan setelah kegiatan efektif.



INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, perbaikan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi, serta perbaikan infrastruktur irigasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3529-INO	08/09/2017 s/d 30/06/2023	USD	500,0	42,0	8,4	458,0	-5,5	7,9	0,0	0,0
	8327-INO	08/09/2017 s/d 30/06/2023	USD	100,0	8,0	8,0	92,0	-5,9	7,6	0,0	0,0

Keterangan: *Initial deposit



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penguatan kerangka kelembagaan pertanian berkelanjutan.
- Perbaikan sistem dan kapasitas pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi.
- Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi.

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian DLI. Terdapat potensi pencairan pinjaman dari pencapaian DLI di tahun 2017 dan 2018. *Executing agency* perlu mempersiapkan dokumen pencapaian target, *screening sosial* dan lingkungan untuk memastikan pekerjaan kategori A (DLI 8) tidak termasuk, dan verifikasi oleh BPKP dan ADB.

Verifikasi. Uji coba verifikasi akan dilakukan di bulan Juli 2018 untuk DLI 4,6, dan 7. Verifikasi akan dilakukan pada bulan Agustus 2018 dan hasilnya diharapkan dapat diperoleh pada bulan Oktober 2018.

Capacity development. Kementerian PUPR (Dit. Pengembangan Jaringan SDA, Dit. Bina OP, dan Dit. Irigasi dan Rawa) dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pelatihan *capacity building* pada bulan September 2018, termasuk terkait teknis, fidusiari, serta *safeguard* lingkungan dan sosial.

Pemantauan dan Evaluasi. *Update* dan pengembangan sistem dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) untuk pemantauan hasil kegiatan yang lebih baik.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Skema RBL merupakan skema yang baru digunakan, terutama dengan mekanisme *on-granting*. Hal ini dapat berpotensi menyulitkan daerah untuk pencairan pinjaman.

Tindak Lanjut

Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terkait skema RBL dan implementasinya kepada pelaksana kegiatan.



JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)

Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8121-ID	18/08/2012 s/d 28/02/2019	USD	139,6	85,8	61,5	53,8	-28,3	12,9	2,0	15,5



Paket 1. Ciliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati
Sumber: Website Proyek JUFMP (www.jufmp.com)

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan
- Bantuan teknik, *social safeguard* dan *capacity building*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan II 2018 belum banyak terserap. Hal ini disebabkan beberapa paket masih dalam proses kontrak. Pada Triwulan I 2018 hanya terserap USD 0,11 juta atau sekitar 15,5% dari total target untuk tahun 2018 sebesar USD 12,9 juta. Penyerapan ini untuk pengerjaan paket 6: *Dredging and Embankment of West Banjir Canal and Upper Sunter Drain Sub-project*.



Status Kemajuan Fisik dari Paket Pekerjaan

Paket Pekerjaan	Status Kontrak dan Kemajuan Fisik
PIU Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	
Paket 2A: Cengkareng <i>Floodway</i>	Kontrak telah berakhir. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 2B: Lower Sunter – <i>Floodway</i>	Kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2015. Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari. Keuangan telah mencapai Rp. 73.955.955.924,- (92%) dari Nilai kontrak sebesar Rp. 80.386.908.612,-
Paket 6: Sub Proyek <i>Dregging and Embankment of West Banjir Canal and Upper Sunter Drain</i>	Sudah dilakukan pembayaran uang muka sekitar 10% dan telah melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. Pembangunan Perumahan pada tanggal 4 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 177.601.675.000,-
Paket 8: Pompa Sentiong	Kegiatan telah selesai dan sedang dalam proses penyampaian dokumen prakualifikasi ke Bank Dunia
PIU Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	
Paket 3: Cideng – Thamrin <i>Drain</i>	Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 November 2015. Realisasi fisik 100% dan telah dilaksanakan serah terima pertama pada tanggal 17 November 2015 dengan Berita Acara No. 1/JUFMP-FSK/ST-PHO/XI/2015
Paket 5: Tanjungan and Lower Angke <i>Drain</i>	Kegiatan telah selesai. Realisasi fisik 100% dengan masa pemeliharaan sampai dengan 14 Desember 2017. Kemajuan keuangan adalah sebesar 91,99% atau senilai Rp.175.624.915.611,- dari nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp. 190.986.682.576,-
PIU Provinsi DKI Jakarta	
Paket 1: Ciliwung – Gn Sahari <i>Drain</i> , Waduk Melati	Pekerjaan fisik telah selesai 100%. Untuk kemajuan keuangan, realisasi mencapai Rp 259.604.947.812,- (93,91%) dari nilai kontrak sebesar Rp.276.442.924.393,-
Paket 4: Sentiong – Sunter <i>Drain</i> , Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III	Kegiatan fisik telah selesai 100,00% pada tanggal 15 Desember 2016 adapun saat ini dalam masa pemeliharaan selama 365 hari sampai dengan 14 Desember 2017. Kemajuan keuangan 90,80 % atau senilai Rp. 296.174.481.443- dari Nilai <i>addendum</i> kontrak ke IV sebesar Rp 326.148.370.000,-
Paket 6: West Banjir <i>Canal</i> , <i>Upper Sunter Floodway</i>	Kegiatan sedang berjalan dari rencana 41,70% tercapai 39,43% sehingga deviasi sebesar 2,27% Untuk kemajuan keuangan sampai saat ini realisasi sebesar Rp 58.575.495.183,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 193.054.400.000,- atau sebesar 30,34%



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket 6 (West Banjir Canal and Upper Sunter Drain)

Kemajuan telah mencapai 90,95% namun penyerapan dana masih 50,68% atau sebesar Rp. 87.769.911.797,-

Paket 8 (Sentiong-Ancol Pumping Station)

Kemajuan pengadaan yaitu pengajuan dokumen prakualifikasi ke Bank Dunia pada tanggal 19 Februari dan ditindaklanjuti dengan surat penyampaian *update procurement plant* dan dokumen pelelangan serta desain pompa Sentiong-Ancol pada 28 Mei 2018

Consultant Services:

Construction Supervision for JUFMP dan Secretariat of CPMU-JUFMP

Kemajuan kegiatan telah berjalan sebagaimana mestinya, untuk kemajuan keuangan sebesar Rp. 62.785.978.791,- atau USD 4.748.186,94

Puslitbang SDA:

Review Master Plan on Flood Management in Cisadane-Jakarta-Bekasi System:

Puslitbang SDA telah membatalkan kegiatan dengan mengirim surat ke Bank Dunia pada tanggal 13 Desember 2017 namun dengan saat ini belum ada jawaban dari Bank Dunia.

Tindak Lanjut

Paket 6 (West Banjir Canal and Upper Sunter Drain)

Kemajuan keuangan masih rendah dibandingkan dengan realisasi fisik karena dana belum tersedia pada DIPA. BBWS CC sedang melakukan revisi DIPA melalui mekanisme percepatan penarikan *loan*.

Paket 8 (Sentiong-Ancol Pumping Station)

Sampai saat ini Bank Dunia belum merespon surat tersebut karena pekerjaan pompa Sentiong-Ancol akan berdampak pada perpanjangan *loan* kedua. Bank Dunia menghendaki adanya pertemuan antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia (GOI).

Consultant Services:

Construction Supervision for JUFMP dan Sekretariat of CPMU-JUFMP

Kemajuan keuangan relatif rendah disebabkan tidak tersedianya dana dalam DIPA 2018. CPIU Direktorat Sungai dan Pantai sedang melakukan revisi DIPA tahun 2018 yang semula Rp. 1,5 miliar menjadi sebesar Rp. 13,5 miliar.

Puslitbang SDA:

Review Master Plan on Flood Management in Cisadane-Jakarta-Bekasi System:

Puslitbang SDA menunggu kepastian atas pembatalan kegiatan tersebut.



KOMERING IRRIGATION PROJECT (PHASE 3)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-574	27/07/2017	JPY	15.896,0	0,0	0,0	15.896,0	-	328,1	0,0	0,0
		s/d 27/07/2025	USD	143,9	0,0		143,9		11,5	3,0	



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konsultansi
- Pekerjaan konstruksi Irigasi Komering

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya (Kegiatan *Komering Irrigation Project Stage II* yang berakhir 28 Januari 2018) dengan lokasi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan total area seluas 8.500 Ha. Loan IP-574 efektif pada Juli 2017. Sampai dengan periode laporan ini belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada realisasi penyerapan dana pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan *procurement* (dalam pengadaan).

**RENTANG IRRIGATION MODERNIZATION PROJECT**

Rehabilitasi menyeluruh di daerah irigasi Rentang

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Difarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-573	27/07/2017	JPY	48.237,0	0,0	0,0	48.237,0	-	2.287,3	0,0	0,0
		s/d 27/07/2026	USD	436,6	0,0	0,0	436,6	10,3	20,7	0,0	0,0

**❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Rehabilitasi irigasi Rentang
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)* bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas RPJMN 2015 – 2019. Kegiatan ini akan melakukan rehabilitasi secara menyeluruh daerah irigasi Rentang sekaligus memanfaatkan ketersediaan air dari Waduk Jatigede sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Loan IP – 573 mulai efektif pada bulan Juli 2017. Hingga periode laporan ini belum ada pekerjaan fisik di lapangan dan belum ada penyerapan pinjaman karena pelaksana kegiatan masih melaksanakan *procurement* (pengadaan).



UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT

Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-559	25/07/2013	JPY	3.311,0	885,8	26,8	2.425,2	-46,8	795	93,2	11,7
		s/d									
		25/07/2020	USD	30,0	8,0		22,0		7,2	0,8	



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan check dam dan check dam kecil di lokasi tersebar (24 desa).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari satu paket *consulting services* dan empat paket *civil works*. Paket *Consulting Services* kegiatan *Upper Citarum Basin Flood Management* (loan JICA IP-559) telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Paket Cimande, Cikijing dan Cikeruh tanda tangan kontrak pada tanggal 10 Agustus 2016, dan persetujuan diterima pada tanggal 21 Oktober 2016. Sementara untuk Paket Citarum terkontrak 27 Agustus 2017. *Citarum Upstream Sub-project (River improvement from Kantren to Majalaya (5.45 km) and construction of river structures)*, sama sekali belum ada kegiatan fisik karena belum ada pembebasan lahan. Rencananya alokasi anggaran untuk pembebasan lahan baru akan dialokasikan pada DIPA APBN 2019. Untuk *Cimande Sub-project (River improvement from Langensari to Rancanganjang (9.51 km) and construction of river structures)*, dana fisik tanah yang tersedia dalam DIPA SNVT PJSA Citarum tahun 2018 sebesar Rp 8.477.000.000,- belum mencukupi untuk kebutuhan pembebasan lahan sebesar Rp 48.500.000.000,-. Tambahan dana sedang dalam proses usulan. Kemajuan fisik di lapangan hingga Triwulan II 2018 sebesar 22%. Untuk *Cikijing Sub-project (River improvement from Tanggeung to Cikijing (6.68 km) and construction of river structures)*, dana fisik tanah yang tersedia dalam DIPA SNVT PJSA Citarum tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,- belum mencukupi untuk kebutuhan pembebasan lahan sebesar Rp 62.000.000.000,-. Tambahan dana sedang dalam proses usulan. Kemajuan fisik di lapangan



masih 5% karena masih dalam proses pembebasan lahan. Untuk *Cikeruh Downstream Sub-project (River improvement from Ranca Kamuning to Ranca Bango Village (2.50 km) and construction of river structures)*, terkait pembebasan tanah, 2 desa dengan luas total 23.218 m² telah berhasil dibebaskan, yaitu :

1. Tegal Sumedang
 - Sudah dibebaskan 22 bidang; luas 3.682 m².
 - Belum dibebaskan 18 bidang; luas 1.100 m².
 - Kebutuhan biaya hasil *appraisal* Rp. 1.889.723.000,-.
2. Cileunyi Wetan
 - Belum dibebaskan 134 bidang; luas 18.300 m² (belum dibebaskan semua).
 - Kebutuhan biaya hasil *appraisal* Rp.43.197.324.011,-.
 - Total Kebutuhan dana pembebasan lahan untuk penyelesaian pekerjaan 2,5 km (sesuai kontrak) adalah Rp 45.087.047.011,-. Kemajuan dil apangan hingga Juni 2018 sebesar 42,02%.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Lahan untuk pekerjaan keempat paket belum bebas seluruhnya.

Tindak Lanjut

Dengan dana tahun 2018, pembebasan tanah akan dimaksimalkan, kontraktor akan menambah SDM yang lebih berpengalaman. Pelaksana kegiatan juga akan terus memonitor ke BPN.



URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES

Perbaiki Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-551	28/07/2009	JPY	7.490,0	5.839,1	78,0	1.650,9	-19,1	151,1	0,0	0,0
		s/d 28/12/2018	USD	67,8	52,8		14,9		1,4	0,0	

Sumber: <http://psda.jatengprov.go.id>

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Direktorat Sungai dan Pantai
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V
- Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
- Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
- Balai Wilayah Sungai Sulawesi I & II

❖ Lokasi Proyek

Padang, Palembang, Surabaya, Gorontalo dan Manado

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan sipil dan pekerjaan pengadaan peralatan untuk perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota - kota yang terseleksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari 6 paket konstruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 5 paket konstruksi, yaitu Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Paket *civil works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package-6A & 6B)*, telah tanda tangan kontrak, namun lahan belum bebas seluruhnya.

Pemutakhiran harga tanah oleh Tim Penilai (*Appraisal Team*) telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 dan dilanjutkan dengan pembayaran pembebasan tanah. Sampai dengan akhir Juni 2018, luas tanah yang sudah dibebaskan sebesar 2.432 ha atau 70,7% dari kebutuhan total 3.438 ha. Sampai dengan periode laporan ini (akhir Juni 2018) pembebasan tanah seluas 0,387 ha dengan dana sebesar Rp 20 milyar belum dapat diwujudkan. Dengan kondisi diatas, tanah yang tersedia untuk pekerjaan perbaikan sungai Tondano hanya seluas 2.432 ha, 70 % dari kebutuhan 3.438 ha, sehingga dapat dipastikan tidak seluruh lingkup pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak awal dapat dilaksanakan. Permasalahan yang ditimbulkan, disamping luasnya belum mencukupi sebagai dudukan bangunan, juga kerapatannya, masih terputus-putus yang sangat mempengaruhi metoda kerja dalam pelaksanaan timbunan tanah. Semula jalur timbunan tanah akan digunakan juga sebagai jalan kerja/



jalan angkutan apabila pembebasan tanah tuntas. Namun dengan kondisi pembebasan diatas, metoda pelaksanaan diatas tidak dapat dilaksanakan dan pembangunan tanggul timbunan tanah tidak lagi praktis dan efisien.

Kemajuan fisik yang sudah dicapai per akhir Juni 2018 Paket 6A dan 6B masing-masing 46,34% (berdasarkan kontrak *addendum* 3) dan 53,16% (berdasarkan kontrak *addendum* 3) dilain pihak waktu pelaksanaan sudah berlalu sebesar 89,77% dan tinggal 3 bulan lagi. Agar pekerjaan dapat diselesaikan dalam sisa waktu pelaksanaan, maka kemajuan fisik perbulan harus mencapai masing-masing 17% paket 6A dan 15% paket 6B, jauh diatas angka yang pernah dicapai.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pembebasan lahan

- Status pembebasan tanah sampai dengan Juni 2018 masih sama dengan status Maret 2018. Artinya belum ada tanah yang berhasil dibebaskan di periode April – Juni 2018.
- Kemajuan fisik yang sudah dicapai per akhir Juni 2018 Paket 6A dan 6B masing –masing 46,34% (berdasarkan kontrak *addendum*-3) dan 53,16% (berdasarkan kontrak *addendum*-3), masih dibawah target.

Tindak Lanjut

- Sehubungan dengan kondisi pembebasan tanah yang ada, dilakukan perubahan tipe bangunan dari timbunan tanah padat menjadi dinding penahan dari beton siklop, untuk itu sudah dilakukan revisi desain dan yang dituangkan dalam *addendum* kontrak-3.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang meliputi kemajuan fisik per minggu dibanding target, peralatan yang digunakan, tenaga kerja yang ada di lapangan dan kecukupan bahan/material yang diperlukan termasuk penambahan jam kerja apabila diperlukan, dan hasilnya akan dilaporkan kepada pejabat yang berkompeten.

**URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II***Pengendalian Bencana Banjir Lahar*

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-566	23/06/2014	JPY	5.111,00	3.737,5	73,1	1.373,5	12,6	309,9	192,2	62,0
		s/d 23/06/2021	USD	46,3	33,8	12,4	2,8		1,7		



Sumber: Monumen Peremian Pembangunan Paket II

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
- PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/BBWS Serayu Opak

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan
- Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* dan *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River*. Paket *ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River)* terkontrak pada tanggal 18 November 2015, kemajuan fisik telah mencapai 100% pada September 2017, dan telah melaksanakan PHO pada November 2017. Paket *ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River* terkontrak pada tanggal 24 Februari 2016, kemajuan fisik paket kegiatan ini telah mencapai 100% pada Triwulan I 2018, dan telah melaksanakan PHO pada Februari 2018.

Paket *Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*, capaian fisiknya hingga akhir Juni 2018 sebesar 86%. Terdapat pekerjaan tambahan pada kegiatan IP-566 dan sedang dalam proses tender menggunakan LCB. Pelaksanaan pekerjaan tambahan ini direncanakan selama 560 hari.



WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)

Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8027-ID	14/11/2011 s/d 31/05/2018	USD	150,0	145,4	96,9	4,6	-4,3	100,1	45,3	45,2



Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah
Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org)

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

❖ Lokasi Proyek

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Provinsi
- Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
- Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen
- Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi kumulatif kegiatan ini sudah mencapai USD 145,38 juta atau 96.92% dari total pinjaman. Pada tahun 2018, target penyerapan proyek yaitu USD 100,13 juta, dan sampai dengan triwulan ini telah terdapat penyerapan senilai USD 45,25 juta atau 45,19% dari target.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sisa dana sebesar USD 4.61 juta atau sebesar 3.08 % akan dialokasikan untuk *preparation* kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)*.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Progress and Completion Report (PCR) masih dalam tahap penyelesaian berdasarkan hasil *workshop* yang telah diselenggarakan pada bulan Mei akhir.

Tindak Lanjut

Target penyelesaian dokumen PCR ini direncanakan akhir Agustus akan disampaikan kepada Bank Dunia. Target yang tidak tercapai juga akan direvisi dalam dokumen PCR terkait dengan perubahan-perubahan yang ada.

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)**

Meningkatkan akses rumah tangga berpendapatan rendah terhadap perumahan terjangkau melalui dukungan teknis dan pembiayaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8717-ID	24/01/2018 s/d 31/03/2020	USD	450,0	0,7	0,2	449,3	-23,6	4,1	0,7	16,9



Lokasi rencana pelaksanaan kegiatan NAHP di Kota Banjarmasin per Agustus 2018.

❖ **Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

❖ **Lokasi Proyek (Provinsi)**

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Sumatera Utara | n. Nusa Tenggara Barat |
| b. Riau | o. Nusa Tenggara Timur |
| c. Sumatera Barat | p. Kalimantan Selatan |
| d. Sumatera Selatan | q. Sulawesi Utara |
| e. Lampung | r. Sulawesi Barat |
| f. Bengkulu | s. Sulawesi |
| g. Bangka Belitung | t. Sulawesi Tenggara |
| h. Banten | u. Maluku Utara |
| i. Jawa Barat | v. Papua Barat |
| j. DKI Jakarta | |
| k. Jawa Tengah | |
| l. DI Yogyakarta | |
| m. Jawa Timur | |

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Peningkatan akses pembiayaan perumahan terjangkau dengan produk pembiayaan yang dirancang dan dilaksanakan untuk rumah tangga berpendapatan rendah yang bekerja pada sektor formal dan informal;
- Peningkatan jumlah persediaan rumah layak huni yang dibangun dan diperbaiki secara swadaya melalui perbaikan sistem penyaluran bantuan dan bantuan teknis untuk perbaikan kualitas
- Penguatan iklim perumahan terjangkau melalui reformasi dan dukungan teknis kepada pemangku kepentingan dan Lembaga sektor perumahan



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Anggaran. Sampai dengan Triwulan II 2018, kemajuan penarikan kumulatif pinjaman NAHP yaitu senilai USD 0,70 juta atau 0,001 % dari total pinjaman.

Pelaksanaan Kegiatan. Kemajuan pelaksanaan fisik berdasarkan paket kontrak:

1. *Mortgage Linkage Down Payment Assistance under Part 1 (a) of the Project*, penyaluran BP2BT tahun 2018, sampai dengan Triwulan II 2018 belum ada kemajuan pada kegiatan ini.
2. *Home Improvement assistance under part 2 (a) of the project*, penyaluran BPS tahun 2018, sampai dengan akhir Triwulan II 2018, kemajuan presentase kegiatan sebesar 3,79% dari target 18,75%;
3. *Goods non-consulting services, consultants' services and Training under Parts 1(b), 2(b), 2 (c), and 3 of the Project*, presentasi target kegiatan pada Triwulan II 2018 yaitu sebesar 10% namun belum terdapat realisasi kegiatan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

BSPS Facilitation Management Service Region I

Terdapat rencana *addendum* karena adanya rencana penambangan unit BSPS yang melebihi lingkup pekerjaan pihak ketiga.

BSPS Facilitation Management Service Region II

Terdapat rencana *addendum* karena adanya rencana penambahan unit BSPS yang melebihi lingkup pekerjaan pihak ketiga.

Tindak Lanjut



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0133	01/05/2010 s/d 05/04/2018	USD	87,6	19,3	22,0	68,3	-80,9	37,1	4,2	11,4



Kondisi reklamasi

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Civil works
- Procurement of equipment
- Consultancy services

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)			
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA. 2018		
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	
1	Consultancy Services (PMSC)	3,16*	3,16	100	0,61	0,02	3,3	73,2	3,7	2,9	
2	Construction Works	62,17	22,8	37	36,22	11,59	31,9	59,8	48,6	36,9	
3	PMU Support and Training Courses	0,23	0,16	70	0,16	0	0	100	0	0	
4	Financial Audit	0,1	0	0	0,08	0	0	0	0	0	
5	Procurement of Equipment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Start-up Workshop and Familization Visit	0,02	0,02	100	0	0	0	100	0	0	

Catatan : * Terdapat perubahan data



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Pinjaman.** Pinjaman original berakhir pada tanggal 5 April 2018. Usulan perpanjangan dari semula berakhir pada tanggal 5 April 2018 menjadi 5 April 2019 sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada IDB melalui surat pada tanggal 27 April 2018. Usulan tersebut saat ini tengah diproses di Kantor Presiden IDB.
2. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
3. **Construction Works.** Paket 1 – *Dredging and Reclamation* dalam tahap pelaksanaan. Per 27 Juli 2018 kemajuan pekerjaan fisik keseluruhan mencapai sekitar 81% dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2018. Saat ini kontraktor sedang dalam masa tunggu setelah proses *pre-loading*. PMU sedang melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PT. Pelindo terkait pembiayaan untuk *sheet pile* di sebagian area yang berbatasan dengan lokasi pembangunan PT. Pelindo.
4. **PMSC.** Kegiatan dalam tahap pelaksanaan.
5. **Financial Audit.** IDB telah memberikan NOL untuk RFP dan TOR pada tanggal 20 September 2017. Saat ini masih dalam proses lelang oleh Pokja. Namun, melihat waktu proses, PMU akan mempertimbangkan opsi audit melalui BPKP. PMU akan bersurat ke BPKP untuk pengajuan audit proyek setelah NOL perpanjangan terbit.
6. **PMU Expert.** Usulan persetujuan *addendum* kontrak PMU *Expert* saat ini tengah menunggu NOL IDB. PMU diminta untuk menyampaikan kembali usulan kepada IDB apabila masih membutuhkan PMU *Expert* dalam pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Keterlambatan pelaksanaan *construction works* disebabkan berbagai permasalahan selama beberapa triwulan sebelumnya, antara lain (i) Keterlambatan alokasi DIPA pada tahun-tahun awal pelaksanaan (baru dialokasikan pada tahun 2012); (ii) Proses tender/lelang yang berturut-turut; dan (iii) *Re-scoping* pemaketan pekerjaan.
- Terdapat *pending payment* karena saat ini status pinjaman sudah melewati masa lakunya, sehingga pembayaran baru dapat dilakukan setelah NOL perpanjangan terbit.

Tindak Lanjut

- PMU perlu melakukan optimalisasi percepatan proyek sehingga proyek dapat diselesaikan seluruhnya.
- Menunggu pemrosesan/reviu persetujuan perpanjangan proyek dari IDB.



JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I

Pengembangan Perkeretaapian Komuter di Wilayah JABODETABEK

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-563	23/06/2014 s/d	JPY	16.322,0	0,0	0,0	16.322,0		1.162,3	0,0	
		20/06/2021	USD	147,7	0,0		147,7	-60,6	10,5	0,0	0,0



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

❖ Lokasi Proyek

JABODETABEK

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Engineering Service Stage
- Consulting Assistance Services Stage
- Supervisory Stage

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga saat ini belum ada kemajuan fisik pekerjaan. Ditjen Perkeretaapian mengirimkan surat kepada JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase I berupa konstruksi depo Depok dan workshop tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi.

Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan loan ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan yang berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Usulan perubahan ruang lingkup tersebut disampaikan Kementerian Perhubungan kepada JICA. Pada bulan Februari 2017 (setelah 1,5 tahun) Kementerian Perhubungan menerima surat balasan yang menjelaskan bahwa perubahan lingkup tidak dapat dilakukan, dan harus kembali ke ruang lingkup awal. Sampai dengan periode laporan Triwulan II 2018 ini belum ada arahan dari kementerian perhubungan untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan ini.



PATIMBAN PORT DEVELOPMENT PROJECT (I)

Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-577	13/03/2018 s/d	JPY	118.906,00	0,0	0,0	118.906,00	-3,7	3.874,2	0,0	0,0
		13/03/2026	USD	1.076,2	0,0		1.076,2		35,1	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

❖ Lokasi Proyek

Desa Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Consulting Services
- Civil Works: Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Patimban

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban (I), JICA Loan IP-577 efektif tanggal 13 Maret 2018 (Triwulan I 2018). Belum ada penyerapan karena loan ini baru efektif di periode laporan ini (Triwulan I 2018), dan juga belum ada pelaksanaan fisik (pelaksana kegiatan masih dalam tahap pengadaan).

Tujuan dari kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk memperkuat kapasitas logistik pelabuhan di area Jakarta Metropolitan dan meningkatkan perekonomian daerah, untuk meningkatkan *traffic demand* melalui pembangunan pelabuhan laut dan akses internasional di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

KONSTRUKSI PAKET 1, Dermaga dan Reklamasi. Kontraktor: Penta-Rinkai-Toa PP Wika. Target Kontrak Juli 2018 dan *groundbreaking* ditargetkan Agustus 2018.

KONSTRUKSI PAKET 1, Breakwater dan Seawall. Konstruksi paket ini masih dalam proses negosiasi harga. *Bidder*: Toyo-Adhi Karya-Wakachiku.

KONSTRUKSI PAKET 3, Jembatan Akses. Paket ini mengalami proses lelang ulang karena negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan.

Konsultansi Paket 8. *Concurrence* JICA sudah keluar terkait *final evaluation*. Dalam proses persiapan negosiasi harga. *Bidder*: Oriental – Nippon Koei – Ides in assoc. with Raya Survey – Rayasurverindo – Indra Karya.

**PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM'SP AND 500 UNIT)**

Proyek pengadaan Track Material dan Turnout Tahap II

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	(2016) 23 Total No. (411)	24/01/2017 s/d 24/01/2020	USD	175,1	40,8	23,3	134,3	-31,7	99,6	30,5	30,6

❖ **Instansi Pelaksana**Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan❖ **Lokasi Proyek**

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pengadaan Rel UIC 54 Sebanyak 1500 Km'sp Setara dengan 120.000 Batang.
- Pengadaan Wesel Lengkap dengan Aksesori dan Bantalannya Sebanyak 500 Unit.

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik**

Kegiatan *Procurement of Track Material and Turnout Phase II* merupakan kegiatan pengadaan 3.000 rel kereta api (1500 Km Spur) dan 500 unit *Turnout (Wessel)*. Pengadaan rel dan *Wessel* ini akan digunakan untuk pembangunan jalur ganda Kereta Api di lintas Selatan Jawa, Jalur KA Trans Sumatera, dan reaktivasi jalur KA yang sudah tidak aktif. *Loan* kegiatan *Procurement of Track Material and Turnout Phase II* efektif tanggal 24 Januari 2017. Realisasi penyerapan sampai dengan Juni 2018 sebesar USD 40,80 juta. Kemajuan fisik di lapangan telah mencapai 15%. Ditargetkan Juni 2019 proses pengiriman barang seluruhnya telah selesai.



RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I

Pembangunan Double-Double Track Dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-508	13/12/2001	JPY	23.324,0	18.370,9	78,8	4.953,1	-15,7	0,0	0,0	0,0
		s/d 11/09/2019	USD	211,1	166,3		44,8		0,0	0,0	



Sumber : Kementerian Perhubungan

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Satuan Kerja Pembangunan Double-Double Track

❖ Lokasi Proyek

Manggarai - Cikarang (Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi dan Peningkatan *Track Existing* Antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1
- Layanan Jasa Konsultan untuk *Review Design* dan *Penyiapan Dokumen Tender* serta *Pengawasan Konstruksi (Supervisi)*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan Paket Konstruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) secara kontrak telah selesai (telah mencapai 100%) pada Triwulan IV 2017. Namun pihak JICA berharap agar kontraktor melaksanakan *upgrade* pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan. Pada tahun 2018, pelaksana proyek hanya penyelesaian pembayaran dan administrasi pekerjaan.

Secara fisik pekerjaan di lapangan telah selesai, pelaksana proyek saat ini masih menyelesaikan pembayaran eskalasi. BPKP sebenarnya telah selesai melaksanakan audit, namun kontraktor tidak menerima hasil audit tersebut (dasar perhitungan) sehingga kembali ke tim P3K dan proses audit akan diulang lagi.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Terkait klaim kontraktor, BPKP telah mengeluarkan hasil audit namun kontraktor tidak menerima hasil audit tersebut sehingga kembali ke tim P3K.
- DIPA 2018 tidak mencukupi, terutama untuk pembayaran eskalasi.

Tindak Lanjut

- Pembayaran masih menunggu keputusan resmi dari BPKP.
- Revisi DIPA 2018 telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.



KEMENTERIAN PERTANIAN





INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, perbaikan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan irigasi, serta perbaikan infrastruktur irigasi.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	2000001445 (Pinjaman)	13/02/2017 s/d	USD	98,5	0,3	0,3	98,2	-22,1	2,8	0,0	0,6
	2000001446 (Hibah)	31/03/2023		1,5	0,23	15,13			1,27	0,29	0,0



Diskusi di daerah irigasi target IPDMIP, Kabupaten Barito Koala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka pelaksanaan misi supervisi IPDMIP tanggal 2 – 18 Mei 2018 (sumber foto: IFAD, 2018)

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian Pertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

❖ Lokasi Proyek

- Aceh (Kab. Bireuen, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar)
- Provinsi Sumatera Utara (Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Tengah)
- Provinsi Sumatera Barat (Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung)
- Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Lahat, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Empat Lawang, Kab. Musi Rawas)
- Provinsi Lampung (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran)
- Provinsi Banten (Kab. Pandeglang, Kab. Serang)
- Provinsi Jawa Barat (Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Sukabumi, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Garut)
- Provinsi Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen)
- Provinsi Jawa Timur (Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro)



- j. Provinsi Kalimantan Barat (Kab. Kayong Utara, Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang)
- k. Kalimantan Selatan (Kab. Tanah Bumbu, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Tengah)
- l. Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah)
- m. Nusa Tenggara Timur (Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Dompus, Kab. Bima)
- n. Sulawesi Selatan (Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Pinrang, Kab. Wajo)
- o. Sulawesi Tengah (Kab. Banggai, Kab. Poso, Kab. Toli Toli, Kab. Bolaang Mongondow)
- p. Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa Selatan)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Komponen 1 Penguatan kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk pertanian beririgasi
- b. Sub-Komponen 4.1 Peningkatan produktivitas dan layanan pertanian
- c. Sub-Komponen 4.2 Peningkatan akses dan layanan pasar
- d. Sub-Komponen 4.3 Perbaikan layanan keuangan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Keuangan. Realisasi keuangan untuk pinjaman sampai dengan Triwulan II 2018 sebesar Rp. 216 juta. Saat ini, Kementerian Pertanian sedang mengadakan pertemuan perihal *on granting* dengan pengelola proyek dari berbagai daerah di Bogor pada tanggal 25 – 27 Juli 2018.

Penggunaan dana terbesar untuk pelaksanaan proyek terdapat di pusat yang digunakan untuk pengadaan konsultan baik nasional maupun internasional. Dana pinjaman digunakan untuk fasilitasi 2 provinsi yang tidak ikut melakukan mekanisme *on granting* yaitu Provinsi Banten dan Jawa Tengah. Fasilitasi untuk Provinsi Banten masih menunggu kesiapan daerah dan telah dilakukan koordinasi di Cirebon dengan semua kabupaten lokasi proyek. Pada bulan Agustus akan ada 2 kabupaten yang akan mengalokasikan dana dari APBD untuk *on granting*.

Kemajuan kegiatan. Hingga Triwulan II 2018, pengadaan untuk konsultan nasional masih diproses. Dari 8 paket yang ada, 5 diantaranya sudah terkontrak. Untuk tender dari konsultan internasional terdapat 7 paket dengan proses lelang menggunakan *e-proc*. Berkaitan dengan pelaksanaan *on granting*, dari 43 kabupaten, 28 diantaranya telah menyetujui untuk melakukan mekanisme *on granting*.

Kegiatan *Knowledge Management Center* (KMC) yang dilaksanakan oleh Bappenas dari tahun 2017, hingga Triwulan II 2018 sudah berjalan sebesar 8% dari alokasi, sedangkan untuk kegiatannya sebesar 22%. Target di tahun 2018 diharapkan penyerapan untuk kegiatan IPDMIP dapat dipercepat salah satunya dengan mempercepat pengadaan konsultan. Saat ini, pihak Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan ULP untuk pengadaan konsultan tersebut. Diharapkan pada September 2018 telah diperoleh konsultan baik nasional maupun internasional. Sedangkan untuk 2 provinsi yang tidak ikut melakukan *on granting* (Provinsi Banten dan Jawa Tengah), saat ini telah memiliki strategi percepatan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Kegiatan *Knowledge Management Center* (KMC) agak terhambat karena tim KMC masih fokus melakukan koordinasi dalam persiapan pelaksanaan *Result Based Lending* (RBL) atas proyek IPDMIP.
- Revisi DIPA baru terbit bulan Mei 2018.
- Proses *Withdrawal Application* yang cukup lama, karena pengajuannya kepada Direktur Pengelolaan Kas Negera Kementerian Keuangan melalui NPMU (Ditjen SDA Kementerian PU) dan setelah diterima oleh Kementerian Keuangan dokumen asli diajukan ke IFAD *headquarter* di Roma.

Tindak Lanjut

- Pembayaran masih menunggu keputusan resmi dari BPKP.
- Revisi DIPA 2018 telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

**RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE (READSI)**

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	2000001960 (Pinjaman)	08/01/2018 s/d	USD	39,9	0,0	0,0	39,9	-9,0	0,0	0,0	0,0
	2000001959 (Hibah)	31/03/2023		1,00	0	0	0	0	0	0	0

Catatan : 1Terdiri dari pinjaman pemerintah pusat senilai USD 11,76 juta, pinjaman pemerintah provinsi USD 3,47 juta, dan pinjaman pemerintah kabupaten senilai USD 24,66 juta

**❖ Instansi Pelaksana**

- Kementerian Pertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Bappenas – Direktorat Pangan dan Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- 6 Provinsi, 18 Kabupaten, 342 Desa
- Gorontalo (Pahuwato, Bone Bolango, Gorontalo)
 - Sulawesi Selatan (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur)
 - Sulawesi Tenggara (Kolaka, Kolaka Utara, Konawe)
 - Sulawesi Tengah (Poso, Parimo, Buol, Toli Toli, Banggai)
 - Kalimantan Barat (Sambas, Sanggau)
 - Nusa Tenggara Timur (Kupang, Belu)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan (*Works*)
- Layanan konsultasi dan non-konsultasi
- Barang
- Pelatihan dan lokakarya
- Bantuan masyarakat (*matching grants*)
- Biaya operasional



❖ **Komponen Proyek**

- a. Pengembangan pertanian dan penghidupan di perdesaan
- b. Peningkatan pelayanan penyuluhan, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran
- c. Tersedianya dukungan kebijakan dan strategi pembangunan
- d. Manajemen pengelolaan program

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Keuangan. Dana di rekening khusus pada Triwulan II 2018 sebesar USD 1,3 juta. Hingga Triwulan II 2018, belum ada realisasi keuangan untuk proyek READSI, hal ini dikarenakan masih dalam tahap administrasi dan proses revisi DIPA. Rencananya, pada Triwulan III 2018 akan ada penyerapan anggaran. Diharapkan, pada Agustus 2018 DIPA sudah selesai.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Berkaitan dengan masalah *on granting*, alokasi per kabupaten telah selesai. Naskah perjanjian hibah daerah akan ditandatangani setelah SPPH terbit dan paling cepat akan terbit pada Desember 2018. Selain itu akan ada rencana kerjasama dengan MARS dalam rangka pelaksanaan *on granting* dan pinjaman.



SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IFAD	835-ID (Pinjaman)	05/07/2011 s/d	USD	49,1	49,2	100	0,0	13,6	3,5	1,9	54,5
	835-ID (Hibah)	31/07/2019		1,08	0,99	91,67	0,09		0,23	0,08	34,78

Kerangan : Alokasi pinjaman SOLID di dalam DIPA Kementan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 46,02 miliar sementara alokasi hibahnya adalah sebesar Rp. 3 miliar



Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat

Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

❖ Instansi Pelaksana

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Maluku
- Provinsi Maluku Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Communit Development
- Agriculture Production
- Marketing

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Keuangan. Rekening koran di BI untuk pinjaman per tanggal 31 Juni 2018 menunjukkan saldo reksus sebesar Rp. 18,09 milyar atau sebesar USD 1,28 juta. Sedangkan untuk hibah, rekening koran di BI per tanggal 2 Juli 2018 menunjukkan saldo sebesar Rp. 2.126.301.061,38 (USD 0,15 juta).

Pelaksanaan Kegiatan. Pembayaran untuk konsultan individu manajemen proyek dalam tahap termin I dan konsultan untuk monitoring evaluasi pembayarannya dalam tahap termin II. Sementara itu, untuk pengadaan konsultan firm di pusat pembayaran sudah sampai pada termin IV. Pada bulan Juli-Agustus akan diadakan survei IRR dan AOS. Untuk kegiatan *workshop* konsolidasi keuangan Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Berkaitan dengan proses BAST di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sampai saat ini telah selesai untuk proses BAST tersebut. Sedangkan BAST untuk pengadaan akan dilakukan oleh PPK Kabupaten kepada Kelompok Masyarakat/petani.

Dalam rangka pembuatan film dokumenter, sampai saat ini telah dilakukan tandatangan kontrak oleh PT. Gigit Geget. Pada Agustus 2018 akan dilakukan kunjungan ke Provinsi Maluku Utara untuk proses pembuatan film tersebut, sedangkan pembuatan film *documenter* di Provinsi Maluku saat ini sedang dalam proses *editing*. Sementara itu, untuk kajian database SOLID di Propinsi Maluku sudah selesai dilakukan oleh PT. Buana Suriala selama 5 hari.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Terdapat 1 SP2D di Bulan Juli yang salah ditarik.

Tindak Lanjut

SP2D yang salah akan disampaikan kepada petugas SPM agar diralat serta dilakukan penyusunan *withdrawal grant* kembali agar bisa terisi.



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8188-ID	25/10/2012 s/d 30/06/2019	USD	80,0	75,7	94,6	4,3	9,6	17,5	6,9	39,4



Gedung BPTP Jambi
Sumber: Website proyek SMART-D

❖ Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Papua Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengembangan dan Manajemen SDM
- Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas
- Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan
- Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pada tanggal 9 Juli 2018, telah dilaksanakan *Monthly Meeting* proyek SMART-D. Adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut:

Komponen A

Sampai dengan Triwulan I 2018 sebanyak 50 orang telah menyelesaikan pendidikan yang terdiri dari jenjang S2 sebanyak 40 orang dan S3 sebanyak 10 orang. Hal ini berarti dari 68 orang hanya 28 orang yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang S2 dan dari 13 orang hanya 3 orang yang belum menyelesaikan pendidikan S3. Sehubungan dengan akan berakhirnya kegiatan SMART-D pada Juni 2019, maka sisa peserta yang belum menyelesaikan studinya diperkirakan akan selesai paling lambat pada tahun 2022 dengan menggunakan Rupiah murni untuk pembiayaannya. Kegiatan pada komponen A juga dilakukan dengan melaksanakan *study excursion* yang terdiri dari 35 orang mengikuti VIS, 68 orang mengikuti *conference*, 125 orang mengikuti *workshop*, dan 45 orang mengikuti seminar baik di Jepang (terkait topik perkebunan dan peternakan) maupun di Nepal (terkait topik perbenihan).

Komponen B

Pengadaan kontrak laboratorium yang baru akan dilakukan dengan dana dari Rupiah murni serta sisa peralihan dana dari komponen C. Saat ini sedang dilakukan *reviu* kontrak serta pelaksanaan dan anggaran Rupiah murni pendamping yang akan digunakan. Pengadaan laboratorium dilakukan karena banyaknya laboratorium yang peralatannya kurang lengkap. Dari pekerjaan ini diharapkan pada pertengahan Desember 2018 sudah dapat dimulai dan disiapkan untuk laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan *Aide Memoire*, akan dilaksanakan *workshop* K3 untuk kontraktor dan pengawas pada tanggal 25-27 Juli 2018 di Makasar juga sertifikasi kebun percobaan (sebagai salah satu indikator SMART-D) yang pesertanya terdiri dari pemilik lahan yang bersertifikasi. Kemajuan saat ini sedang dilakukan *update* ke daerah-daerah yang bermasalah untuk mengirinkan orang-orang yang berkompeten.

Komponen C

Saat ini sudah terdapat 255 judul penelitian (terkait restrukturisasi kebun percobaan). Diharapkan nantinya akan ada investasi untuk membangun dan diseminasi ke kebun percobaan, teknologi serta penambahan benih berupa SDM, yaitu petani yang akan terlibat dalam percobaan kebun tersebut. Saat ini sudah terdapat 3 buah kebun percobaan, namun dalam dokumen *Aide Memoire* terdapat 20 target kebun percobaan. Sudah ada 11 kebun percobaan yang mendaftar dengan dana sekitar Rp. 2,5 milyar (250 juta/kebun). Selain itu, terdapat kegiatan kerjasama lanjutan dan kegiatan khusus (*block program*) khususnya untuk kegiatan yang memerlukan teknologi yang lebih canggih.

Komponen D

Saat ini konsultan internasional dalam pengurusan IMTA dan Vitas memerlukan waktu yang cukup lama. Akibat dari lambatnya pengurusan IMTA dan Vitas tersebut, mereka mengundurkan diri (batal dilaksanakan). Dilakukan kembali pelelangan untuk konsultan lokal namun belum membuahkan hasil dikarenakan peminat untuk lelang ini sangat kurang.

Khusus untuk peralihan pembiayaan mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya dari pinjaman ke Rupiah murni sudah dikoordinasikan dengan sekretariat badan yang akan menjadi penanggung jawab atas Rupiah murni yang sudah dialokasikan lewat DIPA pada rapat *trilateral meeting* akhir bulan Juni 2018 yang lalu.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan barang dan jasa

- Pengajuan usulan yang tidak serempak serta perbaikan proposal hasil evaluasi yang lama, menyebabkan penyelesaian administrasi kontrak kerjasama lebih lama dari yang seharusnya telah dijadwalkan.
- Untuk satker yang baru masih belum terbiasa dengan proses lelang Bank Dunia, harmonisasi lelang terlambat karena ada perubahan peruntukan sehingga perlu revisi DIPA.
- Lelang terbuka konsultan Monev dan Komunikasi gagal setelah 2 kali lelang.

Tindak Lanjut

- Menetapkan tengat waktu dan mengecek perkembangan proses usulan, evaluasi dan penyelesaian administrasi kontrak kerjasama.
- *Workshop* akan dilakukan dan pendampingan, berkoordinasi dengan bagian perencanaan.
- Penunjukan langsung akan dilakukan untuk konsultan Monev dan Komunikasi.



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-568	23/06/2014 s/d	JPY	7.075,00	3.180,6	45,0	3.894,4	-2,14	1.063,7	243,8	22,9
		23/06/2023	USD	64,0	28,8	35,2	9,6	2,2			



Leaflet PHRD IV

❖ Instansi Pelaksana

- Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA)
- Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange
- Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler
- Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paspor biru (dinas) untuk karyasiswa overseas baik program degree maupun non degree. Pengurusan Paspor biru (dinas) yang memerlukan waktu yang cukup lama mulai dari kabupaten/kota kemudian pengurusan ke jenjang selanjutnya. Estimasi waktu yang diperlukan untuk pengurusan paspor biru adalah sekitar 3 bulan. Diperlukan percepatan seleksi karyasiswa overseas baik degree maupun non degree.

Addendum kontrak Tim Konsultan. Pada periode laporan ini pelaksana kegiatan akan mengusulkan addendum kontrak Tim Konsultan. Addendum ini terkait volume pekerjaan yang bertambah (ruang lingkup pekerjaan konsultan bertambah). Usulan permintaan NRC (*Notice Regarding Contract*) telah diajukan ke JICA, namun belum mendapatkan respon dari JICA hingga Triwulan II 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Perubahan *Minute of Discussion (MoD)*

Terdapat sejumlah angka *Un-Allocated* (selisih antara *Loan Agreement* dengan *MoD*) dan proyeksi efisiensi sehingga diperlukan perencanaan pemanfaatan *Loan Balance* tersebut. *Explanatory Notes* tentang pemanfaatan *Loan Balance* telah diajukan kepada JICA per bulan Februari 2018.

Tindak Lanjut

Koordinasi yang intensif dengan pihak terkait seperti JICA Jakarta.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY III
Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-553	28/07/2009 s/d	JPY	5.659,00	3.695,5	65,3	1.963,5	-31,8	619,9	109,4	17,6
		28/12/2018	USD	51,2	33,4		17,8		5,6	1,0	


Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas
❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Institut Teknologi Bandung

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan konstruksi
- Peralatan untuk penelitian dan pendidikan
- Program akademik dan mahasiswa
- Program penelitian
- Consulting services

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paket 1 (Pembangunan Infrastruktur dan Gedung Baru). Pekerjaan konstruksi keempat gedung telah mencapai 100% pada tahun 2016. Pada tanggal 10 Maret 2017, ESC telah mengeluarkan *performance certificate* untuk Paket 1. Pada periode laporan Triwulan I 2017 telah disepakati jumlah denda yang dikenakan kepada kontraktor. BPKP sudah mengeluarkan laporan hasil audit, BPKP dan kontraktor sudah menyetujui besaran denda dan sudah dibayar. Saat ini gedung sudah dapat digunakan oleh user.

Paket 2 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Infrastructure and Built Environment (CIBE) dan Atap Gedung Center for Art, Design and Language (CADL)). Pekerjaan untuk Paket 2 telah selesai.

Paket 3 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Information Technology for Industrial Engineering (CITIE) dan Gedung Center for Art, Design and Language(CADL)). Pekerjaan untuk Paket-3 telah mencapai 100% pada bulan Desember 2017, semua perangkat telah terpasang dan telah berfungsi.

Paket 4 (Pengadaan Peralatan untuk 4 Center: CIBE, CADL, CITIE, dan CRCS). Capaian fisik Paket 4 pada Triwulan II 2018 sebesar 3,65%, total capaian untuk paket 4 adalah sebesar 57,58%. Kemungkinan akan ada keterlambatan pengiriman Paket 4, pelaksana proyek berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai dampak potensi keterlambatan *delivery* Paket 4, secara kontraktual (*penalty*).

Paket 5 (Peralatan Gedung Center for Advanced Sciences, diluar pengadaan mikroskop elektron). Kontrak telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Review NOL dari JICA terkait kontrak Paket-5 diterima pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan nomor concurrence IP-553/C-006 tanggal 12 Oktober 2016 dan SPMK pada tanggal 25 Oktober 2016.

Proses *shipping* dari negara pabrikan ke Indonesia sedang berlangsung. Proses *shipping* dilaksanakan bertahap sejak Juli 2017. PT. Fajar Mas Murni menyelesaikan semua pekerjaan pada tanggal 15 Mei 2018. Kemajuan Paket 5 sudah mencapai 95,75%, menunggu penyelesaian serah terima pekerjaan dan pembayaran. Penalti Paket 5 dikenakan selama 3 (tiga) hari keterlambatan kepada PT Fajar Mas Murni.

Paket 6 (Pengadaan Peralatan untuk Mikroskop Elektron) : Pekerjaan untuk Paket 6 telah selesai 100%.

Paket 7 (Pengadaan Peralatan Biasa) : Pekerjaan untuk Paket 7 telah selesai.

Paket 8 (Pengadaan Furnitur) : Pekerjaan untuk Paket 8 telah selesai.

Paket 9 (Pengadaan Buku) : Pekerjaan untuk Paket 9 telah selesai.

Untuk meningkatkan fungsi bangunan hasil pekerjaan Paket 1 dan Paket 3 diadakan Paket *Additional Work* (Paket Pekerjaan Tambahan).

Fellowship Program :

- Pengembangan Staf Luar Negeri :
 - Satu (1) karyasiswa telah kembali dengan status "*Completion Without Degree*" dan diberikan waktu selama 2 tahun sampai dengan September 2018 oleh universitas terkait untuk menyelesaikan disertasi dan ujian doktoral untuk memperoleh gelar. Saat ini karyasiswa yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk sidang. Ditargetkan sidang terbuka dan tertutup pada dilaksanakan pada bulan Desember 2017 dan wisuda pada Maret 2018. Yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kesempatan tersebut s/d batas waktu yang telah diberikan. PIU telah mengirimkan surat kepada Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB untuk segera mengirimkan laporan akhir studi kepada PIU, sebagai bahan laporan akhir proyek, pada tanggal 15 Februari 2018. Lima orang karyasiswa telah mengirimkan laporan studinya.
 - Satu karyasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengabdikan di ITB. Saat ini dalam proses koordinasi dengan pihak terkait mengenai pengembalian dana. Karyasiswa tersebut sedang meminta arahan dari Ijnen Kemenristekdikti mengenai negosiasi pengembalian dana, dan menunggu jawaban resmi dari Kemenristekdikti.
- Pengembangan staf dalam negeri : seluruh karyasiswa domestik telah selesai. PIU telah mengirimkan surat resmi ke bagian akademik FSRD ITB mengenai permintaan status seluruh karyasiswa dalam negeri.

Adanya kebutuhan atas pendampingan ESC pada pengadaan barang (Paket 4 dan 5) dan selesainya proyek, sehingga kontrak ESC saat ini membutuhkan perpanjangan kembali. *Addendum* III ESC telah disetujui dengan kontrak tanggal 31 Oktober 2017 hingga 15 Juli 2018. Realokasi dana *contingency* untuk pembiayaan ESC sudah disetujui oleh pihak terkait (Bappenas, Kemenkeu, Dikti, dan JICA) per 4 Mei 2018. Rencananya kegiatan IP-553 akan diperpanjang selama 5 bulan untuk penyelesaian sisa pekerjaan dan penyelesaian administrasi pembayaran.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Kontrak ESC berakhir Juli 2018, namun ESC masih sangat dibutuhkan untuk mengawasi proses pengadaan dan instalasi barang.

Tindak Lanjut

Kontrak ESC diperpanjang dari 15 Juli 2018 s/d 31 Oktober 2018 (per 26 Juni 2018, tanpa ada perubahan nilai kontrak).

DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA
Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Rumpun Ilmu Kesehatan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-549	25/07/2008 s/d	JPY	14.640,2	11.371,6	77,7	3.268,6	-22,3	492,1	259,3	52,7
		15/07/2018	USD	132,5	102,9		29,6		4,5	2,3	


Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan
❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 a. Universitas Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Building Construction
- Equipment and Furniture
- Price Escalation
- Physical Contingency
- Consulting Services

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Paket Consulting Service

Persiapan pembuatan dokumen SOP untuk operasional rumah sakit, membantu menyiapkan detail pekerjaan *finishing* dari rumah sakit dengan alur pelayanan di rumah sakit. *Technical Assistance (TA)* terkait riset telah mulai dilakukan dengan melakukan penyaringan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan. Dilakukan pelatihan (*training*) untuk mempersiapkan operasional Rumah Sakit. Proses pembuatan *completion report loan* JICA UI.

Pembangunan Rumah Sakit Universitas Indonesia (Paket 1.1)

Kemajuan pekerjaan konstruksi 100% pada bulan Februari 2018, pembayaran telah 100%, masa retensi sampai dengan Februari 2019.

Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit)

Saat ini kemajuan pekerjaan kontraktor alat sampai dengan 99%, barang yang telah datang mulai di instal dalam ruangan - ruangan pelayanan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Masih tersisa *invoice* retensi dan *invoice* alat forensik Rumah Sakit UI.

Paket 2 (Proses pembuatan desain Integrasi IT dan pembuatan daftar *list* kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit dan Satelit Klinik)

Kemajuan pekerjaan konstruksi 100% pada bulan Maret 2018 dan masuk masa retensi untuk alat - alat informasi teknologi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Telah dilakukan pembayaran 100% kepada



kontraktor. Pekerjaan instalasi belum dapat dikerjakan karena menunggu pengecekan Gedung Rumah Sakit oleh Konsultan.

Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 pekerjaannya telah selesai dilaksanakan.

Rencana Akses Masuk

Kebutuhan pembebasan lahan pembuatan Terusan Jalan Djuanda – Cinere seluas 160.800 m², dengan panjang jalan 6,7 km dan RAW 24 m, dengan rencana anggaran pembebasan lahan Rp. 2.412.000.000.000,- dan anggaran fisik Rp. 562.800.000.000,- sehingga total kebutuhan anggaran Rp. 2.974.800.000.000,- (terkait adanya permasalahan anggaran pembebasan lahan sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya).

Sampai dengan jalan terusan Djuanda – Cinere jadi, untuk akses masuk Rumah Sakit Universitas Indonesia akan dibangun jembatan oleh BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) yang menghubungkan antara Universitas Indonesia dengan Jalan eksisting yang telah ada milik PT. Pertagas. Rencana *Fly over* Universitas Indonesia (ROW 22 m). Jembatan akses Rumah Sakit Universitas Indonesia hanya akan dilalui oleh kendaraan kecil golongan I yang akan menuju Rumah Sakit Universitas Indonesia, tidak dapat tembus ke Pintu Utara Kampus Universitas Indonesia Depok. Universitas Indonesia masih terus berkoordinasi dengan PT. KAI untuk membicarakan akses masuk yang harus melintasi rel kereta api yang masih sebidang.



DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY WITH SOCIO ENTREPRENEURIAL SPIRIT AT UNIVERSITAS GAJAH MADA

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-576	13/03/2018	JPY	8.309,0	0,0		8.309,0		387,4	0,0	
		s/d 13/03/2025	USD	75,2	0,0	0,0	75,2	-4,2	3,5	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Universitas Gajah Mada

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Consulting Services
- Civil Works

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Tujuan dari kegiatan *Development of World Class University With Socio Entrepreneurial Spirit at Universitas Gajah Mada (Loan IP-576)* yaitu:

- Memperkuat aktivitas pengembangan dan riset.
- Memperkuat kerjasama dengan komunitas lokal dan industri.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di UGM melalui pembangunan gedung dan pengadaan peralatan untuk pendidikan dan riset.

Berdasarkan hasil *appraisal*, lingkup pekerjaan dari kegiatan ini antara lain:

- Consulting Services
- Civil Works (4 paket)
- Procurement (4 paket).

Loan IP-576 efektif tanggal 13 Maret 2018. Hingga periode laporan ini Pelaksana Proyek masih dalam tahap pengadaan konsultan. PIU hanya menerima satu dokumen proposal *Consultant Services* dan *Technical Evaluation proposal Consultant Services* tersebut telah dilaksanakan. Pada tanggal 22 Juni 2018 Dokumen *Technical Evaluation Report* telah dikirim kepada JICA, tembusan ke SDID dan Rektor sebagai laporan.



HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEVELOPMENT

Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-541	26/07/2007	JPY	7.801,0	7.117,7	91,2	683,3	-1,7	132,7	93,9	70,8
		s/d 26/07/2019	USD	70,6	64,4		6,2		1,2	0,9	



Gedung Fakultas Teknik Unhas
Sumber: Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Universitas Hasanuddin

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Teknik
- Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Teknik
- Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan
- Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek
- Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pinjaman IP-541 Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini terdiri dari 4 paket pekerjaan konstruksi, paket konsultan dan program beasiswa.

Paket	Komponen Pekerjaan	Capaian fisik (%)	Rencana Penyelesaian
Paket-1	1) Construction of Buildings	100	September 2015
	2) External Works	100	
	3) Procurement of Equipment	100	
	4) Procurement of Furniture	100	
Paket-2A	Construction Building	100	April 2019
Paket-2B	On Progress (Master List), DP otw (Contract Signed March 30, 2017)	53	Juli 2019



Paket-3	1) <i>Construction of Buildings and External Works</i> 2) <i>Procurement of Equipment</i> 3) <i>Procurement of Furniture</i>	100 100 100	Oktober 2018
Paket-4	<i>Infrastructure</i>	100	Oktober 2014

Paket 2B

Paket 2B telah tandatangan kontrak pada tanggal 30 Maret 2017. Saat ini dalam proses penyusunan *master list*. Dalam penyusunan *master list* banyak alat-alat yang dihilangkan karena keterbatasan dana.

Program Beasiswa

- *Long Term Fellowship Program* di Japan (Program Doktor) 2 batch 26 orang.
- *Long Term Fellowship Program* di Indonesia (Program Doktor) 25 orang selesai, 3 orang DO (dari 28 orang).
- *Short Term Fellowship Program*. *Short Term Fellowship Program* dengan mengurangi jangka waktu, Batch terakhir 6 bulan menjadi 3 bulan dan mengefisienkan anggaran melalui pengurangan/peniadaan *Tuition Fee* maka jumlah peserta bertambah menjadi total 103 orang.
- Catatan untuk program beasiswa, saat ini sudah tidak ada konsultan, jadi diminta agar *evidence* tidak ada yang hilang karena sangat dibutuhkan saat pengumpulan SOE.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Dengan luncuran DIPA 2018, yang dapat ditagihkan hanya *loan* untuk Paket-2A dan Paket-2B sementara GOI masih *pending* karena tidak dialokasikan pada luncuran tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat syarat-syarat umum kontrak pada klausul kontrak 60.10 bahwa setelah sertifikat pembayaran diserahkan kepada *employer*, maka dalam waktu 56 hari sudah harus dilakukan pembayaran. Jika tidak lakukan pembayaran maka *employer* akan dikenakan bunga sebagai denda atas keterlambatan.

Tindak Lanjut

Kami telah melakukan optimalisasi anggaran pada DIPA yang ada dan mengajukan pengusulan luncuran/percepatan untuk tahun 2018.



POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	2928-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	75,0	42,3	56,4	32,7	-21,8	17,9	0,1	0,3

Keterangan :

1) Sudah termasuk luncturan

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0343-INO	07/02/2013 s/d 31/12/2019	USD	4,95	3,2	64,8	1,7



Teaching Faculty Manufacturing of Electronics - Politeknik Negeri Batam

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Increased quality and relevance of polytechnic system
- Increased and more equitable access to polytechnic institutions
- Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman 2928-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Equipment	0,18	0,19	100	0,06	0,05	83	100	0
2	Consulting Services	1,27	0,95	75	0,86	0,25	29	100	50
3	Program and Teaching-learning Material Development	-	-	-	0,32	0	0	-	-
4	Studies, Surveys, and Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NSF	-	6,61	-	1,09	0,34	31	-	-
6	Social Marketing and Advocacy	-	0,20	-	-	-	-	100	100
Hibah ke Politeknik									
1	Politeknik Penugasan	20,05	16,63	83	-	-	-	-	-
2	NSF								
	Batch 1	11,49	9,49	83	-	-	-	-	-
	Batch 2	9,43	6,65	71	-	-	-	-	-
	Batch 3	4,36	3,81	87	-	-	-	-	-
	Penguatan	20,61	2,04	10	13,9	0,72	5	21,8	3,5

Hibah 0343-INO

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pusat									
1	Capacity Development	0,19	0,46	-	-	-	-	-	-
2	Consulting Services	-	0,86	-	0,17	0	0	-	-
3	Teaching-learning Material and Program Development	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Studies and Workshop	0,19	0,60	-	-	-	-	-	-
5	Social Marketing and Advocacy	-	0,50	-	0,19	0,15	-	-	-



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Kemenristekdikti telah mengajukan usulan realokasi komponen hibah (surat nomor 1717/A.A1/PR/2018 tanggal 23 April 2018) dan pinjaman (surat nomor 1992/A.A1/PR/2018 tanggal 14 Mei 2018). Realokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan politeknik untuk mendukung pengembangan tenaga kerja di lima industri prioritas, termasuk manufaktur, infrastruktur, pertambangan dan energi, agribisnis dan agroindustri, juga pariwisata. Rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas atas usulan tersebut telah disampaikan melalui surat tanggal 18 Juli 2018 nomor 7355/D.8/07/2018, namun demikian, pada tanggal 18 Juli 2018 Kementerian PPN/Bappenas menerima tembusan terkait revisi usulan penggunaan sisa dana (proses internal Kemenristekdikti, surat tanggal 9 Juli 2018 nomor 440/B/PR/2018).

Penguatan Politeknik. Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan kontrak akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Lelang pengadaan barang di politeknik sudah berjalan. Dari 145 paket, 52 paket sudah terkontrak sehingga akan dilakukan penarikan pinjaman. Pengadaan barang diperkirakan dapat selesai dalam waktu 3 bulan setelah terkontrak. Untuk paket konstruksi yang ada di beberapa politeknik, pelaksanaannya akan berlanjut ke tahun 2019 dengan batas penyelesaian maksimal pada tanggal 30 Juni 2019.

Kegiatan Porsi Hibah. Di tahun 2018 rencananya akan dilakukan pemetaan kekuatan politeknik untuk 45 politeknik yang terdiri atas 35 politeknik negeri dan 10 politeknik swasta. Pelaksanaan kegiatan porsi hibah baru bisa berjalan setelah proses revisi DIPA selesai.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Proses realokasi yang sudah diusulkan sebelumnya untuk sementara ditunda hingga ada kejelasan terkait isu rencana pemanfaatan sisa dana pinjaman.
- Tambahan alokasi DIPA 2018 telah disetujui pada Juni 2018 sebesar Rp 139 milyar (sekitar USD 9,5 juta), namun jumlah ini belum mengakomodasi kebutuhan untuk pembiayaan kegiatan hibah dan kegiatan di politeknik swasta. Tambahan usulan sebesar Rp 18 milyar utk politeknik swasta dan Rp 22 milyar untuk hibah sedang diproses.

Tindak Lanjut

- Isu ini akan dibahas pada pertemuan *wrap up* misi PEDP. Usulan penggunaan sisa dana sebaiknya tidak dilanjutkan apabila proses tersebut dapat menghambat usulan realokasi yang sebelumnya sudah dilanjutkan karena dikhawatirkan akan berdampak pula pada pelaksanaan kegiatan.
- Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait proses ini dengan seluruh pihak agar proses revisi dapat segera selesai dan kegiatan dapat berjalan.
- Isu DIPA ini merupakan salah satu isu yang berulang hampir setiap tahunnya, sehingga untuk tahun 2019 anggaran harus dipersiapkan agar dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan.

THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT*Pengembangan Empat Institusi Pendidikan Tinggi*

Lender	Kode Loan	Tanggal Efektif	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0177	06/11/2016 s/d 09/06/2021	USD	13,9	4,0	28,4	10,0	-7,4	2,9	1,7	58,3
	IND-0178	06/11/2016*	USD	162,6	0,0	0,0	162,6	1,4	14,8	0,0	0,0

*Catatan : *) Closing date belum dicantumkan karena belum melakukan penarikan pertama**Penandatanganan kontrak PSC Paket 1 dan 2***❖ Instansi Pelaksana**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti
– Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Universitas Mulawarman
- Universitas Negeri Malang
- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Universitas Jember

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Banten

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
- Pengembangan kurikulum
- Membangun konsorsium riset
- Peningkatan kualitas lingkungan belajar mengajar



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. **Civil Works.** Pemenang lelang untuk masing-masing universitas sudah diperoleh, saat ini masih menunggu NOL *draft* kontrak dari IDB. Target *groundbreaking* pada Agustus 2018.
2. **DEDC.** Disiapkan melalui pendanaan PNBP masing-masing universitas. Dokumen sudah selesai disusun.
3. **PMC.** NOL REOI dan RFP sudah diperoleh pada tanggal 26 Juni 2018. Lelang dalam proses pelaksanaan, *aanwijzing* telah dilaksanakan pada pertengahan Juli 2018.
4. **EQC.** NOL REOI dan RFP sudah diperoleh pada tanggal 26 Juni 2018. Lelang dalam proses pelaksanaan, *aanwijzing* akan dilaksanakan pada akhir Juli 2018.
5. **PSC.** NOL *addendum* draf kontrak Paket 1 dan Paket 2 PSC sudah diperoleh pada tanggal 11 Juli 2018. Konsultan sudah mulai bekerja dan dalam proses reviu DED.
6. **Soft Component:**
 - a. **Reserach and Training Grant.** Terdapat 3 kategori hibah, yaitu *research*, *teaching*, dan *book grant*. Untuk *research grant*, saat ini dalam proses pelaksanaan sebanyak 84 kegiatan di keempat PIU. Untuk *teaching grant* dan *book grant* dilaksanakan masing-masing 20 kegiatan dan 15 kegiatan di Unej.
 - b. **Staff Development.** Untuk kegiatan *staff development* berupa *Overseas Degree Training (ODT) program*, sudah dilakukan seleksi dan diperoleh 83 kandidat untuk beasiswa program Doktor dari keempat PIU. Sedangkan untuk program *Non-Degree Training (NDT)*, terbagi menjadi 2 program, yaitu pelatihan dalam negeri dan luar negeri. Untuk proses seleksi peserta pelatihan luar negeri, di UM sudah terpilih 43 kandidat, Unej pemilihan 4 kandidat, Untirta 24 terpilih kandidat (dalam proses NOL IDB), dan Unmul masih dalam proses seleksi. Sedangkan untuk pelatihan dalam negeri, di UM terpilih 25 kandidat, Unej pemilihan 34 kandidat, Unmul pemilihan 12 kandidat, dan Untirta terpilih 15 kandidat (dalam proses NOL IDB).
 - c. **Curriculum Development.** Dilakukan pengembangan desain kurikulum baru yang mengintegrasikan bidang prioritas di masing-masing universitas. Pengembangan modul ajar juga dilakukan melalui *research based learning grant* di masing-masing universitas. Kurikulum baru yang sudah dikembangkan rencananya akan diterapkan di tahun ajaran 2018/2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

Diperkirakan terdapat kekurangan pagu sehingga akan dilakukan revisi DIPA, kurang lebih Rp. 250 milyar.

Tindak Lanjut

Perubahan DIPA sudah diajukan, saat ini sedang berproses di internal Kemenristekdikti.

THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT
Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
	IND-0140	24/07/2011 s/d 31/12/2018	USD	26,8	21,5	80,2	5,3	-13,0	3,5	0,0	0,0
IDB	IND-0141	24/07/2011 s/d 31/05/2016	USD	8,2				<i>Loan Closed</i>			


Laboratorium Sentral
❖ Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 a. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. *Improving Learning and Research Infrastructure*
- b. *Upgrading The Learning and Research Facilities*
- c. *Teaching and Research Quality Improvement*
- d. *Constructing*
- e. *Project Management Unit (PMU)*
- f. *Start Up Workshop/Mid-Term Review/Familiarization*
- g. *Financial Auditing*



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Construction of New Building and Supporting Facilities	20,63*	20,63	100	-	-	-	100	0	0
2	Additional Work (BSL-3)	2,89*	-	-	2,89	-	-	0	0	0
3	Lab Equipment	7,3	7,3	100	-	-	-	100	0	0
4	Academic Curriculum Development Program	1,63*	1,63	100	-	-	-	100	0	0
5	DEDC	0,48*	0,48	100	0	0	0	100	0	0
6	PMSC	0,25*	0,25	100	0	0	0	100	0	0
7	EQC	0,10*	0,10	100	0	0	0	100	0	0
8	Start-up Workshop	0,02*	0,01	50	-	-	-	100	0	0
9	Financial Auditing	0,03*	0,03	100	-	-	-	100	0	0

Keterangan : *Terdapat perubahan nilai kontrak
Kurs yang digunakan yaitu Rp 14.000,-

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. **Construction of New Building and Supporting Facilities.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **Additional Works (BSL-3).** Pemenang lelang telah diperoleh dan terkontrak pada 13 Juli 2018. Pada 20 Juli 2018 telah dilaksanakan *groundbreaking* pekerjaan fisik. Saat ini pekerjaan konstruksi sedang berjalan dengan estimasi pelaksanaan selama 6 bulan.
3. **Academic Curriculum Development Program.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
4. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
5. **PMSC.** *Project Completion Report* (PCR) sedang disusun untuk komponen *original* proyek.
6. **EQC.** Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.
7. **Start-up Workshop.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
8. **Financial Auditing.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Penyelesaian konstruksi BSL-3 diestimasi selama 6 bulan. Dihitung dari masa kontrak pada bulan Juli 2018, maka pekerjaan baru selesai di bulan Desember 2018 atau akhir bulan November 2018 apabila dilakukan percepatan. Mengingat pinjaman akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, penyelesaian administrasi dan keuangan (NOD) harus selesai sebelum tanggal tersebut. Proses pengajuan WA hingga memperoleh NOD diperkirakan dapat mencapai 1 bulan sehingga terdapat kemungkinan penyelesaian administrasi dan keuangan melampaui *closing date*.

TindakLanjut

PMU perlu menyusun beberapa skenario, seperti skenario apabila perolehan NOD melebihi tahun 2018 (mengingat sudah tidak ada anggaran untuk kegiatan di 2019) maupun skenario kemungkinan lainnya. Selain itu PMU juga perlu mengupayakan percepatan kembali agar penyelesaian administrasi dan keuangan dapat selesai sebelum masa tutup pinjaman.



THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)

Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
IDB	IND-0168	14/04/2014 s/d 28/10/2018	USD	174,0	67,3	38,7	106,7	-54,0	37,6	41,6	100,0
SFD	SFD/9/612	15/09/2014 s/d 31/12/2018	USD	35,0	8,7	24,7	26,4	-63,5	9,9	0,0	0,0



Kemajuan pelaksanaan pembangunan gedung di Universitas Negeri Yogyakarta
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Universitas Negeri Surabaya
 - Universitas Negeri Yogyakarta
 - Universitas Negeri Gorontalo
 - Universitas Negeri Tanjungpura
 - Universitas Sam Ratulangi
 - Universitas Lambung Mangkurat
 - Universitas Syiah Kuala

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Construction of new buildings
- Renovation
- Supporting infrastructure
- Furniture and fixture
- Curriculum development program
- Equipment
- Training program (staff development)
- E-learning (including digital library)
- Books and journal
- Research grants



- k. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)
- l. Project Management and Supervision Consultant (PMSC)
- m. Equipment Consultant (EQC)
- n. Project Implementation Unit (PIU)
- o. Financial Auditing
- p. PMU Experts
- q. Start-up Workshop/Mid-Term Review

❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

(Ekuivalen juta USD)

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	DEDC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0,35*	0,35	100	-	-	-	100	0	0
	IDB – Untan dan Unlam	0,34*	0,34	100	-	-	-	100	0	0
	IDB – Unesa dan UNY	0,46*	0,46	100	-	-	-	100	0	0
	SFD – Unsyiah	0,19*	0,19	100	-	-	-	100	0	0
2	PMSC									
	IDB – Unsrat dan UNG	0,53	0,08	15	0,47	-	-	53,48	68,2	21,7
	IDB – Untan dan Unlam	0,65	0,03	5	0,64	-	-	51,52	67,7	19,2
	IDB – Unesa dan UNY	0,61	0,15	25	0,54	0,05	9	55,65	71	26,7
	SFD – Unsyiah	0,31	0,07	23	0,28	0,03	11	49,17	63,3	12,4
3	EQC									
	IDB – Unsrat dan UNG		0	0		0	0	0		
	IDB – Untan dan Unlam	0,74	0	0	0,59	0	0	0	90	0
	IDB – Unesa dan UNY		0	0		0	0	0		
	SFD – Unsyiah	0,12	0,01	8	0,09	0	0	0	90	0
4	Financial Audit Consultant	0,17	0	0	0,07	0	0	0	50	0
5	Pengadaan PMU Expert									
	Procurement Specialist	0,06	0,05	83	-	-	-	100	0	0
	Financial Management Specialist	0,09	0,04	52	0,03	-	-	100	36	9
	Information and Communication Technology Specialist	0,07	0,04	54	0,03	-	-	100	20	5
	Civil Engineering Specialist	0,07	0,01	20	0,06	-	-	100	40	10
6	Start-up Workshop & Mid term Review	0,11	0,11	0	0	0	0	100	0	0
7	Construction of New Building									
	UNESA	22,4	3,01	13	14,57	1,38	9	64,4	84,9	49,3



No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	KEUANGAN					FISIK (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018 (Juta USD)			Realisasi Kumulatif	TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
	UNY	20,9	12,76	61	16,81	7,74	46	77,5	78,6	56,1
	UNG	21,9	9,27	42	17,32	5,08	29	88,4	71,2	59,5
	UNSRAT	16,3	7,98	49	24,57	4,03	16	60,2	86,7	46,8
	UNTAN	21,7	8,69	40	18,01	4,44	25	71,1	82,7	53,8
	UNLAM	28,7	11,02	38	15,69	5,90	38	76,9	76,1	53,0
	UNSYIAH	23,5	8,81	37	17,48	3,97	23	66,1	74,1	40,2
8	<i>Supporting Infrastructure</i>									
	UNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Equipment</i>									
	UNESA	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNY	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNSYIAH	0	0	0	0,48	0	0	0	0	0
10	<i>E-learning</i>									
	UNESA	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNSRAT	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNLAM	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNTAN	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0
	UNG	0	0	0	0,00004	0	0	0	0	0

Catatan : * Terdapat Perubahan Nilai Kontrak

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **DEDC.** Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. **PMSC.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
3. **EQC.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
4. **FAC.** Konsultan FAC untuk porsi IDB telah terkontrak dan dalam tahap pelaksanaan. Sedangkan untuk porsi SFD, audit akan dilakukan oleh BPKP.
5. **Individual Consultants.** Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan.
6. **Civil Work.** Kegiatan dalam proses pelaksanaan untuk porsi IDB maupun SFD. Saat ini kemajuan pekerjaan fisik rata-rata sebesar 72%. Pekerjaan konstruksi di beberapa lokasi perlu dilakukan percepatan agar pekerjaan fisik dapat selesai maksimal pada bulan November 2018.
7. **Equipment.** Pengadaan peralatan untuk porsi IDB saat ini masih dalam tahap penawaran dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 28 Agustus 2018 dan target kontrak pada bulan Oktober 2018. Untuk porsi SFD, pengadaan peralatan dalam pelaksanaan.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan di awal proyek menyebabkan pencapaian kegiatan hingga saat ini tidak sesuai target yang ditentukan. Kemajuan pekerjaan fisik di masing-masing universitas masih cukup rendah (sekitar 60-70%) dibandingkan dengan masa kontrak yang tersisa (rata-rata hanya tersisa 2 bulan). Diperlukan perpanjangan masa laku pinjaman untuk mengakomodasi penyelesaian pengadaan *equipment* dan masa pemeliharaan.

Tindak Lanjut

Executing agency telah mengajukan usulan perpanjangan pinjaman IDB (dari semula tutup pada tanggal 27 Oktober 2018 menjadi 27 Oktober 2019) dan pinjaman SFD (dari semula 31 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2019). Usulan perpanjangan juga telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada IDB dan SFD. Saat ini masih menunggu jawaban/NOL atas usulan tersebut.

**RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)**

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8245-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2020	80,0*)	47,7	59,6	32,3	-7,2	12,9	6,3	49,1

Keterangan : *) Nilai pinjaman berdasarkan restrukturisasi per tanggal 8 Februari 2017



Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro
Sumber : www.ristek.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers
- Strengthening Public Research Funding
- Developing S&T Human Resources Capacity
- Project Management

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan II 2018, penarikan kumulatif proyek Riset-Pro yaitu senilai USD 47,71 juta atau 59,65% dari total pinjaman. Adapun untuk target di tahun 2018 adalah senilai USD 12,85 juta dan telah terealisasi senilai USD 6,31 juta. Pada triwulan ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kegiatan dan penyerapan anggaran antara lain adanya Revisi RKA-KL. Revisi dilakukan karena terdapat perubahan dari rencana kontraktual menjadi swakelola untuk komponen 1, adanya volume kegiatan yang dikurangi pada komponen 2, serta penambahan pagu anggaran untuk program non gelar.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan.

Pada Triwulan II 2018 ini, Komponen 1 (*Strengthening selected priorities of the national innovation strategy*) menunjukkan kemajuan cukup baik dimana telah dihasilkan konsep *Science and Technology Park (STP)* terkait dengan pertanian dan strategi reformasi untuk *Technology Transfer Office (TTO)*. Inisiatif ini sekarang sudah dalam tahap pilot.

Komponen 2 (*Strengthening Public Research Funding*) juga sudah menunjukkan kemajuan cukup signifikan dimana *Science, Technology and Innovation (STI) Forum* telah berjalan. Selain itu telah terbangun sistem



Monevsibang, yaitu sistem informasi monitoring dan evaluasi untuk penelitian di bidang STI dan telah terbangun juga *Technology Readiness Level* TRL baseline berdasarkan reuiu dari kegiatan penelitian Insinas yang dilakukan Kemristekdikti pada tahun 2017.

Komponen 3 (*Developing S&T Human Resources Capacity*) sampai dengan triwulan ini secara kumulatif telah terdapat 433 karyasiswa program master dan doktoral dari target 422 karyasiswa. Para peserta karyasiswa berasal dari Kemristekdikti maupun instansi lain. Peningkatan kapasitas untuk para peneliti dan staf yang akan berpartisipasi dalam program non-degree juga sedang dalam tahap penyelesaian proposal seleksi untuk tahun 2018.



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan kapal patroli

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-21	15/07/2014 s/d	KRW	37.390,2	29.982,0	80,2	7.408,2	1,1	18.376,6	5.976,0	32,5
		27/10/2019	USD	33,4	26,8		6,6		16,4	5,3	



Profil konstruksi kapal pertama saat akan melakukan uji laut/sea trial di perairan Kunsan – Korea Selatan. Sumber; POLRI

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan (*Detailed Design*, Konstruksi, Transport dan Asuransi, *Training*).
- Jasa Konsultasi (*Dokumen Pelelangan dan Basic Design*, *Project Supervision*, *Dokumen Final dan Laporan Pekerjaan*).

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Fast Patrol Boats For International National Police (INA-21) ini dilaksanakan oleh Ditpolair Baharkam POLRI. Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultansi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF LOAN INA-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015. Penandatanganan kontrak telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2016, dengan nama kontraktor Samwon Heavy Industries, Ltd. Rencana awalnya, kegiatan INA-21 ini akan membiayai pengadaan 5 kapal (3 kapal akan dibuat di Korea dan 2 kapal akan dibuat di Indonesia), namun dalam rapat koordinasi yang diadakan di Bappenas pada April 2018, POLRI menyampaikan bahwa melihat perkembangan dan kondisi di lapangan maka kelima kapal tersebut akan dibuat di Korea (3 kapal akan dibuat 100% di Korea dan 2 kapal lagi kerangkanya saja atau 80% dibuat di Korea). Untuk dua kapal, yang dibuat di Korea hanya 80%, sementara 20% (pekerjaan penyelesaiannya) akan dilakukan di Batam, Indonesia.

Tahap produksi 5 (lima) unit kapal FPB 48 meter Fast Patrol Boats dimulai dengan kegiatan *Kick Of Meeting* yang dilaksanakan tanggal 23 – 26 November 2016. Kegiatan ini merupakan persiapan pembangunan kapal dengan membahas item teknis yang berkaitan dengan standar dan ketentuan dalam produksi kapal seperti pola pengawasan berdasarkan ketentuan klasifikasi kapal yang digunakan yaitu *Korean Registered/KR* sesuai kaidah teknis yang berlaku secara internasional terhadap produksi kapal baru. Selanjutnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan produksi sesuai kaidah internasional untuk produksi kapal : kegiatan ulasan/reviu terhadap desain kapal, uji stabilitas kapal, pemotongan plat, peletakan lunas, *fabrican test acception* untuk mesin kapal.



Kemajuan total produksi kapal sebanyak 5 unit sampai dengan Juni 2018 adalah kapal pertama, kedua dan ketiga kemajuan fisiknya telah diatas 90% sementara untuk kapal keempat dan kelima hampir mencapai 80%. Polri merencanakan lima buah kapal tersebut sudah berada di Indonesia dengan kondisi tiga kapal mencapai kemajuan fisik 100% dan dua kapal lainnya 80% (pekerjaannya dilanjutkan di Batam Indonesia). Kapal pertama telah dilakukan uji laut (*sea trial*) dengan hasil baik pada tanggal 11 April 2018.



INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Korea	INA-18	14/02/2012 s/d	KRW	42.731,6	499,4	1,2	42.232,2	-96,2	0,0	0,0	0,0
		22/11/2018	USD	38,2	0,4		37,7		0,0	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Kalimantan, Indonesia

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, *Training, Operation and Management*)
- Jasa Konsultasi (Survei lapangan, *Basic Design*, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Integrated Trunking Radio Communication for INP (INA-18) ini dilaksanakan oleh Sarpras Polri. Kegiatan ini masih dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Kontrak Paket untuk proyek INA-18 efektif pada tanggal 19 Juni 2014. Pembayaran uang muka dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014.

Pada tanggal 28 Oktober 2016 POLRI telah mengirimkan draf Dokumen Lelang kepada EDCF Korea. Pada tanggal 5 April 2017 EDCF Korea mengirimkan tanggapan terkait draf Dokumen Lelang Barang/Jasa. Tanggal 14 Agustus 2017 konsultan proyek (Daeyong Ubitec) menyampaikan kembali draf Dokumen Lelang kepada PMU (POLRI). Pada bulan April 2018 EDCF bersurat kepada POLRI perihal perubahan dokumen lelang, dan POLRI telah menjawab surat EDCF tersebut. POLRI mengharapkan agar EDCF memberikan jawaban/persetujuan draf dokumen *bidding* tersebut secara formal/tertulis. Setelah jawaban/persetujuan draf dokumen tersebut diterima, maka proses lelang akan segera dilaksanakan. POLRI akan menunggu persetujuan draf dokumen tersebut sampai dengan masa berlaku pinjaman kegiatan ini, apabila tidak ada jawaban maka pinjaman ini akan ditutup/berakhir.



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA




CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8336-ID	05/06/2014 s/d 30/06/2020	USD	47,4	21,1	44,5	26,3	-22,5	1,5	0,8	54,1

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)		Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
				(Juta)	%	(Juta)	%	
Bank Dunia	TF-15470	05/06/2014 s/d 30/06/2019	USD	10,0	2,39 ¹	23,90	7,61	

Catatan: Pada LPKPHLN Triwulan II 2018 tidak tercatat adanya penyerapan untuk hibah, data yang digunakan adalah data LPKPHLN Triwulan III 2017.

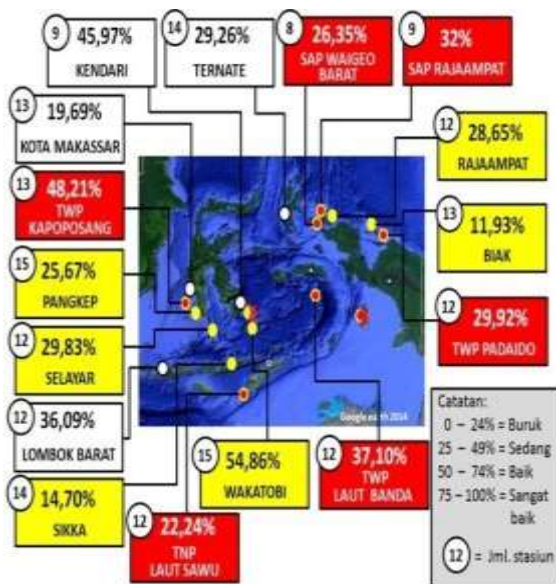

Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

❖ Instansi Pelaksana

Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi DKI Jakarta
- 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/ Kota)
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gili Matra National MPA di Kabupaten Lombok)

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penguatan Kelembagaan untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir
- Dukungan untuk Penelitian Ekosistem Pesisir
- Memperkuat Sistem Kelembagaan untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek
- b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan
- c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas
- d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI
- e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan
- f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Proyek. Pada tanggal 9 – 16 Mei 2018 telah dilaksanakan *Implementation Support Mission* untuk kegiatan COREMAP. Misi tersebut bertujuan untuk :

- a. Meninjau kemajuan proyek sampai saat ini tentang pencapaian target dan sasaran proyek, dengan fokus utama pada kegiatan infrastruktur.
- b. Meninjau kemajuan pada identifikasi dan pemilihan siswa potensial untuk jenjang S2 dan universitas dimana mereka akan berencana untuk mendaftarkan di tahun 2018 dan 2019.
- c. Menilai pengadaan dan kinerja manajemen keuangan, termasuk menindaklanjuti audit/penggantian biaya luar negeri dari masalah pengeluaran yang tidak memenuhi syarat.
- d. Mengevaluasi kinerja dari *safeguards*.
- e. Mendiskusikan restrukturisasi dari GEF yang sedang berlangsung untuk proyek-proyek Bank Dunia.

Berkaitan dengan pelaksanaan misi dari Bank Dunia tersebut serta adanya rencana pemindahan *capacity building* dari LIPI ke Bappenas, Bappenas mengusulkan anggaran untuk kegiatan COREMAP di tahun 2019. Usulan tersebut berupa penambahan pinjaman luar negeri Pusbindikatren sebesar Rp 15.000.000.000,- untuk kegiatan *Capacity Building* yang nantinya akan dimanfaatkan untuk beasiswa pendidikan gelar S2 Luar Negeri bagi 20 karyasiswa yang sampai saat dalam proses seleksi. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut tetap menunggu hasil misi Bank Dunia serta proses administrasi pemindahan PIU sesuai ketentuan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.



PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)




INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF)

Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8192-ID	12/06/2013 s/d 31/12/2018	USD	4,6	3,7 ²⁾	79,6	0,9	-11,3	0,9	0,0	0,0

Keterangan :

1) Berdasarkan data LPKPHLN Triwulan II 2018, belum terdapat kemajuan nilai penyerapan untuk tahun 2018.

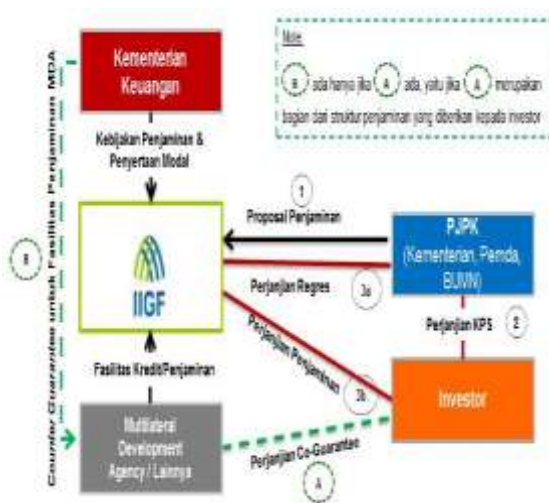

Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII

Sumber: www.iigf.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Penjaminan IIGF yang didukung oleh Bank Dunia
- Pendampingan Teknis

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan II 2018, pelaksana kegiatan belum menargetkan adanya penyerapan untuk proyek IIGF. Adapun target penyerapan baru mulai dialokasikan pada triwulan III dan triwulan IV mendatang. Adapun untuk triwulan III dan triwulan IV mendatang target penyerapan yaitu masing-masing USD 0,464 juta.

Pelaksanaan Kegiatan. Terkait dengan proyek KPBU untuk infrastruktur sosial saat ini proyek gedung olah raga dan balai latihan kerja tidak masuk ke dalam *pipeline* tahun 208 karena terdapat masalah komitmen calon PJPk. Untuk proyek kesehatan yang akan berjalan di tahun ini, yaitu proyek Rumah Sakit Krian Sidoarjo, namun sampai saat ini belum dapat dilakukan karena masih menunggu usulan penjaminan. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut diperlukan proses koordinasi dengan konsultan dan segera melakukan mobilisasi konsultan setelah usulan penjaminan masuk.

Sementara itu, proses *appraisal* untuk masalah lingkungan, sosial dan pengadaan tanah juga masih menunggu usulan penjaminan untuk beberapa proyek antara lain, SPAM Semarang Barat, Rumah Sakit Krian Sidoarjo, Jalan Nasional Lintas Timur dan proyek infrastruktur Kereta Api Makassar ke Pare-Pare. Sebagai tindak lanjut maka diperlukan proses koordinasi dengan konsultan dan segera melakukan



PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

mobilisasi konsultan setelah usulan penjaminan masuk. Terkait dengan proses *appraisal* untuk proyek satelit multifungsi pemerintah belum dapat dilakukan karena masih menunggu usulan penjaminan. Perkiraan proses *appraisal* akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut diperlukan proses koordinasi dengan konsultan dan segera melakukan mobilisasi konsultan setelah usulan penjaminan masuk.



PT. PERTAMINA






GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT

Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8082-ID	29/06/2012 s/d	USD	175,0	139,5	79,7	35,5	-12,5	0,6	0,4	66,1
	TF-10407	31/12/2018		125,0	101,32	81,06	23,68		0,56	0,0	0,0

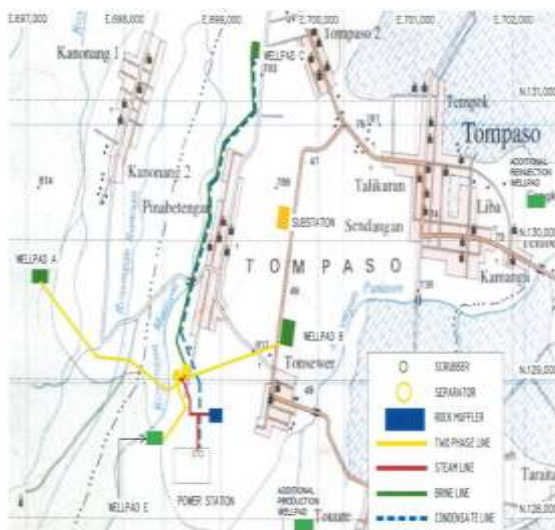

Layout pembangunan Lahendong 5&6
Sumber: project appraisal document

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Lampung/Tanggamus
- Provinsi Sulawesi Utara/Lahendong

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Steam gathering system
- Power plant and transmission line
- Project management

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pekerjaan. Pekerjaan *Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC)* untuk Ulubelu 3&4 dan Lahendong 5&6 sampai dengan Triwulan II 2018 sudah mencapai 100%. Sementara itu, pada tanggal 9 – 13 Juli 2018 dilaksanakan *Implementation Support Mission* untuk proyek ini. Misi ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan proyek sebelum proyek tutup pada 31 Desember 2018 serta untuk memulai persiapan dalam penyusunan *Project Completion Report*. Adapun lokasi yang akan dikunjungi adalah Lahendong Geothermal di Sulawesi Utara,

Pemasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Terdapat penyesuaian format laporan *Inspection Report*.

Tindak Lanjut

Meminta kontraktor untuk dapat segera merevisi dan menyampaikan *Inspection Report*

LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT

Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-557	25/10/2011 s/d	JPY	26.966,0	6.552,7	24,3	20.413,3	-61,9	2.748,6	1.189,6	43,3
		25/10/2019	USD	244,1	59,3		184,8		24,9	10,8	



Pekerjaan Penyambungan Pipa di Lumut Balai
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. Pertamina Geothermal Energy

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Jasa Konsultasi untuk Persiapan Pekerjaan
- Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC
- Pemboran Sumur

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket *Consulting Services and Project Management Consultan* (PMC) dan Paket *Engineering Procurement and Construction* (EPC).

Hingga periode laporan Triwulan II 2018 ini pelaksanaan fisik Paket *Consulting Services and Project Management Consultan* (PMC) telah mencapai 88,8%, dan Paket *Engineering Procurement and Construction* (EPC) sebesar 89,33%. Untuk Paket *Engineering Procurement and Construction* (EPC) terdapat kemajuan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya walaupun masih dibawah target (97,44%).

Proses penanganan longsor di *area power plant* dan *area switchyard* dilakukan dengan tiga tahap. Kontraktor melakukan penyusunan *detail design* namun pekerjaan penanganan longsor telah dimulai secara parsial sejak September 2016. PGE telah mengambil alih tahap ketiga pekerjaan penanganan longsor untuk menjaga waktu penyelesaian proyek Lumut Balai Unit 1 dengan target COD pada bulan Agustus 2018.

Kegiatan Pemboran, Target pemboran dalam kegiatan ini sebanyak 30 sumur, sampai dengan Juni 2018 sudah menyelesaikan pemboran 27 sumur (22 sumur produksi dan 5 sumur reinjeksi). Sisa 3 sumur akan dikerjakan di sisa tahun anggaran 2018. Sisa 3 sumur tersebut adalah:



- a. LMB 19 : Sumur LMB-19/2 telah berhasil dengan *injection rate* 1.040,5 ton/hour.
- b. LMB 18 : Proses pengeboran sumur LMB-18/1 sedang dilakukan dan akan dilanjutkan dengan pengeboran sumur LMB-18/2.
- c. LMB 17 (sumur *back up*): Proses revisi amdal masih di Kementerian Lingkungan Hidup (diajukan pada Maret 2018).

Kegiatan Proyek LMB Unit 2. Proses *re-tender* EPCC proyek PLTP LMB unit 2 dapat dimulai kembali sesuai dengan JICA *concurrency letter* tanggal 27 April 2018. PGE telah mengirimkan *Bidding Document* EPCC proyek PLTP LMB Unit 2 kepada JICA pada tanggal 11 Mei 2018 untuk mendapatkan rewiu dan persetujuan.



PT. PLN



**ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT III**

Pembangunan PLTA Asahan 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-532	26/06/2008 s/d	JPY	27.642,0	1.141,6		26.500,4		1.000,2	0,0	
		31/12/2022	USD	250,2	10,3		239,9	-66,4	9,1	0,0	0,0



Sumber : PT PLN

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I

❖ **Lokasi Proyek**

- Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Pembangunan PLTA Asahan 3
- Consulting Services
- Contingencies

❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III hingga periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket *Consulting/Engineering Services*. Capaian fisik paket *Consulting/Engineering Services* sampai dengan Triwulan II 2018 sebesar 31,36%.

Pada periode laporan Triwulan II 2018, pelaksana proyek telah menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan, ditargetkan tahun ini akan terkontrak. Dengan memperhatikan perkiraan durasi penyelesaian proyek selama 50 bulan, maka konstruksi proyek PLTA Asahan III diperkirakan selesai akhir 2022 dan dilanjutkan dengan masa garansi selama 12 bulan.

Proses penyediaan lahan pembangkit telah selesai. *Concurrence* dari JICA untuk pelaksanaan *re-bidding* telah terbit pada 20 April 2018. Proses *re-bidding* pada minggu pertama bulan Mei 2018 adalah penyusunan proposal oleh *bidders*, untuk selanjutnya dilakukan *pre-bid meeting* dan *site visit* di Minggu kedua dan ketiga Mei 2018. Dijadwalkan *bid submission* pada tanggal 18 Juli 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Terkait lahan Inalum seluas 12,5 ha, dibutuhkan MoU antara PT. PLN dan Inalum. Diharapkan prosesnya tidak membutuhkan waktu lama karena sesama BUMN.

Tindak Lanjut

Dalam proses penyusunan draf MoU.



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION

Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-555	31/03/2010 s/d	JPY	3.886,0	1.572,9	40,5	2.313,1	-53,6	7,2	0,0	0,0
		31/03/2019	USD	35,2	14,2		20,9		0,1	0,0	



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk IV

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pekerjaan HVDC Sumatera – Jawa
- Pekerjaan Supervisi Konstruksi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line hingga akhir Juni 2018 sebesar 39,55%.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Ditunda sementara oleh Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan suspend).

Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PT. PLN UIP ISJ agar menanggihkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut


Masih menunggu kebijakan manajemen (kebijakan dari Direksi PT. PLN).

Dalam rapat koordinasi di Bappenas, JICA mengingatkan bahwa *loan* HVDC memiliki *Commitment Charge* (semakin banyak *loan* yang tidak tertarik maka semakin besar bayarannya), agar dipertimbangkan kelanjutan proyek ini.



GDAP (HULULAIS GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S))

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-572	14/10/2016	JPY	657,0	70,2	10,7	586,8	-10,7	126,9	24,1	19,0
		s/d 14/10/2025	USD	5,9	0,6		5,3		1,1	0,2	

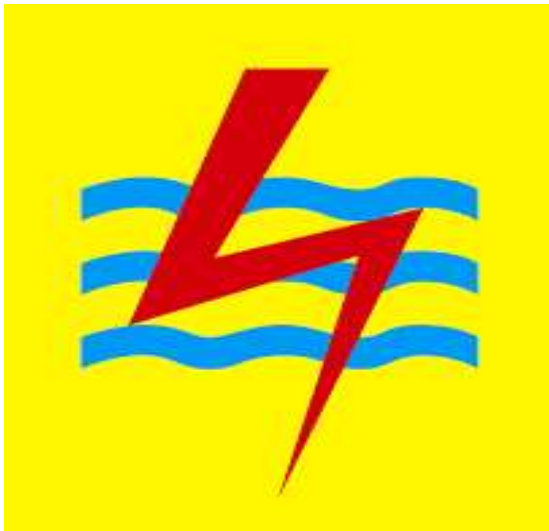

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Bengkulu

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering Consulting Services for Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-572 (*Engineering Consulting Services for Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*) tanda tangan kontrak tanggal 11 November 2016. Nama kontraktor terpilih adalah *ELC Electroconsult S.p.A joint venture with NEWJEC Inc.* Capaian fisik pekerjaan pada Triwulan II 2018 ini sebesar 18,51%. Konsultan telah menyelesaikan *feasibility study* dan telah disampaikan ke PT. PLN. Salah satu syarat persetujuan dari *Official Development Assistance (ODA) Loan* Konstruksi selaku Lender proyek adalah *approval AMDAL*, AMDAL pembangkit telah mencapai 80% dan AMDAL transmisi masih dalam proses.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Pembebasan lahan menunggu ijin penetapan lokasi.

Tindak Lanjut

Masih menunggu ijin penetapan lokasi.

**INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)**

Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	7940-ID	30/05/2011 s/d 31/10/2019	USD	205,0*)	159,0	77,6	46,0	-6,5	0,0	18,5	0,0

Keterangan : *)Perpanjangan masa laku pinjaman menjadi 31 Oktober 2019 berdasarkan surat dari Kemenkeu per tanggal 5 Juli 2018

**Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016



Travo Eksisting Gardu Induk Krpyak-Kota Semarang
Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Pulau Jawa dan Sumatera

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java
- Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java
- Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java
- Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation
- Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation
- Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera
- Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatera Region
- Package 1 Lot 2 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region
- Package 1 Lot 3 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Central & East Java Region
- Package 2 Lot 1 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Sumatera Region
- Package 2 Lot 2 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region
- Package 2 Lot 3 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Central & East Java Region



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan per tanggal 5 Juli 2018, pelaksanaan kegiatan untuk pinjaman IPTD I diperpanjang masa lakunya menjadi 31 Oktober 2019. Sebelumnya, Bank Dunia melalui suratnya pada tanggal 28 Juni 2018 telah memberikan persetujuan atas perpanjangan masa laku pinjaman tersebut.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Juli 2018, pekerjaan fisik untuk Paket J1, J2, J3, S1, S2, S3, Paket 1 Lot 1, dan Paket 2 Lot 1 semua lokasi sudah *energize*. Sedangkan paket yang lain, beberapa lokasi baru *energize*. Solusi permasalahan dari lokasi yang belum *energize* ini akan diadakan pertemuan bulanan antara pihak Bank Dunia dengan PT. PLN. Sedangkan untuk paket kontrak FS for Poko HEPP sampai saat ini sedang dalam tahap negosiasi dan finalisasi memorandum 01 (EOT- Apr 2019). Sedangkan untuk *consulting services*, masih dalam tahap penyusunan draf dokumen kumulatif *impact assessment* dan dokumen KA ANDAL.

Tabel Rencana Penyerapan Keuangan IPTD I Triwulan II 2018

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			TA 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	Package-J1	32,08	28,66	89,34	0,00	0,00	0,00	100	94,63
2	Package-J2	8,07	6,88	85,25	0,00	0,00	0,00	100	100
3	Package-J3	30,28	27,26	90,03	0,00	3,21	0,00	100	98,44
4	Package-S1	22,24	21,44	96,40	0,00	1,21	0,00	100	100
5	Package-S2	30,22	26,49	87,66	0,00	1,25	0,00	100	100
6	Package-S3	20,96	22,17	105,77	0,00	2,42	0,00	100	96,63
7	Package 1 Lot 1	3,78	2,45	64,81	0,00	0,18	0,00	0,00	92,82
8	Package 1 Lot 2	13,29	5,83	43,87	0,00	2,90	0,00	0,00	67,31
9	Package 1 Lot 3	7,96	4,26	53,52	0,00	0,70	0,00	0,00	82,28
10	Package 2 Lot 1	4,06	3,94	97,04	0,00	3,10	0,00	0,00	100
11	Package 2 Lot 2	9,13	17,23	188,72	0,00	1,50	0,00	0,00	95,5
12	Package 2 Lot 3	6,58	12,82	194,83	0,00	2,08	0,00	0,00	99,63
13	FS Level Design for Poko Hydropower Project	1,24	0,75	60,48	0,00	0,75	0,00	0,00	30,70
14	Consulting Services For Environment & Social Impact Assesment For Poko Hydropower Project	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

- **Paket 1 Lot 2**
Kontrak habis pada tanggal 16 Desember 2017 (belum ada kesepakatan terkait penerapan LD dan EOT Parsial).
- **Paket 1 Lot 3**
Terkendala pemadaman di kawasan industri.
- **Paket 2 Lot 2**
Menunggu kesiapan bay trafo (*Package 1 Lot 2*).
- **FS Level Design**
Terdapat perbedaan *Quantity Price* untuk pekerjaan Stage III A.
- **Consulting Services**
Adanya perubahan mekanisme ijin lingkungan yang berpengaruh terhadap mekanisme penyiapan dokumen lingkungan.


Tindak Lanjut

- **Paket 1 Lot 2**
Berkoordinasi dengan kontraktor untuk mencapai kesepakatan penerapan LD dan EOT Parsial.
- **Paket 1 Lot 3**
Koordinasi dengan APP, pemadaman bisa dilaksanakan setelah Siaga 17 Agustus dan sebagian pekerjaan akan menggunakan PDKB.
- **FS Level Design**
Negosiasi dan finalisasi perbedaan *Quantity Price* untuk pekerjaan Stage IIIA.
- **Consulting Services**
Berkoordinasi dengan KLHK.



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-561	23/10/2013	JPY	1.727,0	583		1.144,0		401,4	81,7	
		s/d 23/10/2022	USD	15,6	5,3	33,8	10,4	-20,7	3,6	0,7	20,4

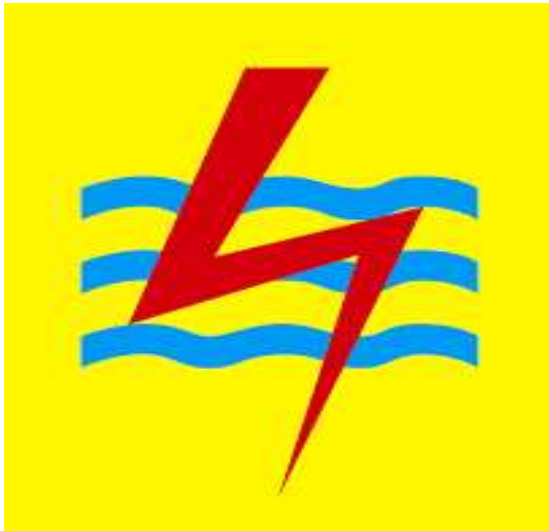

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Indramayu, Provinsi Jawa Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan *Engineering* *Services*
pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-561 (*Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)*) telah tanda tangan kontrak pada tanggal 28 Januari 2016. *Kick of meeting* dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang.

Adanya gugatan dari masyarakat Desa Mekarsari terhadap ijin lingkungan PLTU Indramayu yang diterbitkan Bupati Indramayu di PTUN Bandung. PT. PLN mengajukan permohonan untuk menjadi tergugat intervensi, saat ini dalam proses sidang. Gugatan mengenai ijin lingkungan sudah diputuskan pada tanggal 6 Desember 2017 dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menyatakan bahwa surat keputusan nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang ijin lingkungan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT. PLN (Persero) UIP VIII di Kab. Indramayu Prov. Jabar tidak sah. PT. PLN telah mengajukan banding. Hasil keputusan banding PTUN tanggal 9 April 2018 menjelaskan bahwa ijin lingkungan pembangunan PLTU di Indramayu dinyatakan sah. Implementasi LARAP PLTU Indramayu telah berjalan mulai tanggal 31 Oktober 2017 terkait dengan *Environmental* dan *Social Consideration* berupa pelatihan dan sertifikasi pengelasan, pelatihan peternakan dan pelatihan UMKM. Kegiatan IP- 561 ini adalah kegiatan E/S, kemajuan fisiknya pada periode laporan Triwulan II 2018 baru mencapai 24,05%.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Adanya Surat Keputusan bahwa ijin lingkungan pembangunan PLTU di Indramayu tidak sah.

Tindak Lanjut

PT. PLN telah mengajukan banding. Hasil keputusan banding PTUN tanggal 9 April 2018 bahwa ijin lingkungan pembangunan PLTU di Indramayu dinyatakan sah.

**JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT**

Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi*	%
ADB	3083-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	224,0	14,0	6,2	210,1	-68,7	3,6	0,3	9,1
AIF	8276-INO	29/09/2014 s/d 30/09/2019	USD	25,0	1,5	6,0	23,5	-68,9	0,4	0,0	10,0



Lahan lokasi SUTET di Kabupaten Banyuwangi yang telah dibebaskan

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Bali

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Expansion of 500 Kilovolt transmission network
- Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations
- Project management



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan						Fisik (%)	
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		%	Realisasi
Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
1	Lot 1: 500 KV Overhead Transmission Line Paiton-Watudodol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lot 2: 500 KV Overhead Transmission Line Gilimanuk-Antosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
3	Lot 1 : Extension of 500 KV GIS Paiton Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lot 2 : 500/150 KV, 2 x 500 MVA New Antosaro Substation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning										
5	Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60 MVA	17,32	14,68	84,76	-	2,88	-	95,18	-	95,18
6	PIC for Java Bali 500 KV Power Transmission Crossing Project	2,82	0,82	29,04	-	0,32	-	32,12	-	32,12

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Berdasarkan hasil dari *Special Project Administration Mission (SPAM)* ADB pada tanggal 12 Maret – 30 April 2018, PT. PLN dan ADB sepakat untuk melakukan *partial loan cancellation* untuk komponen terkait Paket 1 dan 2. *Explanatory notes* untuk *partial cancellation* masih dalam proses reviu di internal PT. PLN. Masa laku pinjaman akan tetap sampai dengan 30 September 2019 untuk penyelesaian 2 paket berjalan, yaitu konstruksi Paket 3 dan *Project Implementation Consultant (PIC)*.

Konstruksi Paket 3. Kontrak akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018. Saat ini dalam proses *addendum* kontrak penambahan biaya. *Completion Certificate* perlu dikeluarkan sebelum kontrak berakhir.

Project Implementation Consultant (PIC). Terdapat tambahan pekerjaan yaitu *preliminary study* dan *feasibility study* terkait *alternative crossing technical options*. PIC juga masih perlu menyusun dokumen *Project Completion Report (PCR)*. Amendemen penambahan pekerjaan telah memperoleh NOL dari ADB.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan

Penetapan lokasi di Pulau Bali belum diperoleh dikarenakan masih adanya oposisi dari pihak pemerintah setempat dan pemuka agama, serta adanya preferensi terkait "Bali mandiri energi".. Akibat adanya permasalahan tersebut, kegiatan ini tidak dapat mencapai output dan *outcome* yang diharapkan.

Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi perlu menjadi bahan evaluasi untuk penyiapan kegiatan berikutnya sehingga tidak terulang kembali.



JAVA-SUMATERA INTERCONNECTION TRANSMISSION LINE PROJECT

Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-556	26/03/2013 s/d	JPY	36.994	1.706,6	4,6	35.287,4	-55,7	7,2	0,0	0,0
		30/04/2022	USD	334,8	15,4		319,4		0,1	0,0	



Sumber : PT PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Lampung
- Provinsi Banten
- Pulau Jawa

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatera – Jawa dengan kapasitas 500 KV

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paket 1 (*Converter Station & Substation*), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (Administrasi dan Teknis). Paket 2 (*DC 500 KV Submarine Cable*), Evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan Lol paling lambat Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016. Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT. PLN. Paket-4 (*AC 500 KV Overhead Transmission Line*) dalam tahap *bidding document*. Paket-5 (*AC 500 KV Overhead Transmission Line*) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 dan 10.



Berikut adalah total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC ini :

Instalasi	Lokasi	Estimasi Lahan (Ha)
AC/DC Converter Station	Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan	60
	Kab. Bogor, Jawa Barat	55
Electrode Station	Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan	17
	Kab. Lebak, Banten	18
Landing Point & Submarine Cable Switching Stations	Kab.Lampung Selatan, Lampung	4
	Kab. Serang, Banten	3
HVDC Overhead Line (OHL) (± 481 km rute)	Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	84
HVAC OHL (Sumsel-8 & Jawa) (± 62 km rute)	Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat	15
HVAC OHL (Sumsel-9 dan 10) (estimasi 200 km rute)	Sumatra Selatan (estimated 200 kmr)	36
TOTAL		291

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Ditunda sementara oleh Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan suspend).

Berdasarkan surat dari DIRHCM nomor 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 September 2016 yang menginstruksikan PT. PLN UIP ISJ agar menangguhkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan HVDC.

Tindak Lanjut

Masih menunggu kebijakan manajemen (kebijakan dari Direksi PT. PLN).

Dalam rapat koordinasi di Bappenas, JICA mengingatkan bahwa *loan* HVDC memiliki *Commitment Charge* (semakin banyak *loan* yang tidak tertarik maka semakin besar bayarannya), agar dipertimbangkan kelanjutan proyek ini.



PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 330	03/06/2015 s/d 03/06/2020	USD	373,0	164,1	44,0	208,9	-21,9	123,2	44,9	36,4



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak Proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu ini efektif pada tanggal 3 Juni 2015. Sampai dengan Triwulan II 2018, kemajuan fisik kegiatan ini mencapai 85,50%. Total realisasi penyerapan pinjaman Proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu hingga Juni 2018 telah mencapai USD 164,07 juta atau 43,99% dari total pinjaman. Terhadap tahun anggaran 2018, penyerapan dana pinjaman dari Januari sampai dengan Juni 2018 mencapai USD 44,86 juta.

Tuntutan Masyarakat terkait Pengaspalan Jalan Masuk. Masyarakat menuntut agar jalan masuk/akses diaspal. Pengaspalan jalan terkendala adanya klaim dari pihak KAI, Pertamina, dan Pemkab Langkat bahwa jalan tersebut adalah miliknya. Sedangkan apabila PT. PLN akan mengaspal jalan tersebut PT. KAI meminta agar terdapat perjanjian sewa lahan terkait jalan tersebut. PT. PLN (Persero) terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait : Pemda Langkat, PT KAI, dan PT. Pertamina. Telah dilakukan proses mediasi melalui Kajati Sumut sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2017 dan 17 April 2017. Didalam rapat terakhir masing-masing pihak tidak dapat membuktikan adanya bukti hak yang kuat (sertifikasi tanah). Tindak lanjut hasil mediasi ini PT PLN meminta kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menerbitkan *Legal Opinion* yang memberikan legalisasi untuk pengaspalan akses jalan masuk PLTU Pangkalan Susu, dalam kaitan :



1. Kegiatan pengaspalan atas permintaan masyarakat untuk akses jalan masuk proyek PLTU Pangkalan Susu dapat dilakukan walaupun belum terdapat kejelasan status kepemilikan lahan.
2. Adanya rencana pengenaan biaya sewa oleh PT. KAI pada PT. PLN terdapat unsur ketidakadilan karena jalan tersebut digunakan secara bersama antara masyarakat, PT. Pertamina, dan PT. PLN.

Pengaspalan jalan masuk ini sudah tidak bermasalah lagi. Sudah tidak ada tuntutan dari masyarakat lagi. Pengaspalan jalan sedang dalam tahap konstruksi dengan capaian fisik sampai dengan Juni 2018 sebesar 88,62%. Tidak ada biaya untuk penggunaan lahan karena belum ada bukti kepemilikan lahan yang digunakan jalan masuk tersebut.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Permasalahan *interfacing* dengan *intake structure cooling water* PLTU Pangkalan Susu 1 dan 2 (eksisting) yang mengalami kebocoran menyebabkan potensi COD Unit 3 mundur dari target November 2018 menjadi awal tahun 2019.

Tindak Lanjut

Perbaikan kebocoran, PLTU Pangkalan Susu Unit 3 diupayakan dapat sinkron pada Desember 2018.

**PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	21661901	02/05/2013 s/d 02/05/2018	USD	132,2	101,8	77,0	30,4	-23	38,6	8,5	22,0



Trestle - rebar installation for slab

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Construction for Parit Baru Power Plant Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan fisik kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru sampai dengan periode laporan Triwulan II 2018, secara keseluruhan telah mencapai 97,89%. Terdiri dari dua unit, unit 1 rencana COD pada Juni 2018 (akan mundur) dan Unit 2 rencana COD bulan September 2018.

Realisasi penyerapan pinjaman hingga Juni 2018 sebesar USD 101,79 juta atau 77,01% dari total pinjaman, sementara pada tahun 2018 realisasi penyerapan pinjaman Januari sampai dengan Juni 2018 sebesar USD 8,49 juta. Dalam rapat PT. PLN menyampaikan bahwa sekitar 12% pekerjaan fisik tidak dapat ditagihkan melalui dana pinjaman, namun dibayar melalui APLN (anggaran PT PLN).

Ijin lokasi Terminal Khusus (Tersus) dari Menteri Perhubungan. Ijin lokasi Terminal Khusus dari Kementerian Perhubungan telah diperoleh Maret 2017. PT PLN Pusat telah mengirimkan surat ke Kemenhub dengan nomor surat 0053/KON.00.03/DITDAN/2017 tanggal 11 Januari 2017. Surat beserta dokumen telah disampaikan oleh PRABA HO ke Kementerian Perhubungan pada tanggal 18 Januari 2017. Kementerian Perhubungan melalui SK Menteri Perhubungan Nomor 398 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017, telah menerbitkan ijin lokasi (ijin lokasi telah terbit dan legal).



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain

- Sertifikat Hak Guna Bangunan masih dalam proses.
- Stok batubara saat ini tidak mencukupi untuk melaksanakan *reliability run* selama 30 hari.

Tindak Lanjut

- BPN Kanwil Kalbar telah melaksanakan pengukuran lahan pada *site* pada tanggal 26 Januari 2018 dan 22 Februari 2018.
- Berkoordinasi dengan PLTU Parit Baru *site* Bengkayang dan menegur kontraktor untuk segera menyelesaikan *Coal Unloading Jetty* agar dapat menerima batubara 5000 DWT (*Dead Weight Tonnage*).



PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Pembangunan PLTA Peusangan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-538	29/01/2009 s/d	JPY	26.016,0	18.673,9	71,8	7.342,1	-24,6	2.407,2	1.424,4	59,2
		29/01/2019	USD	235,5	169,0		66,5		21,8	12,9	



Power Station
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22.5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21.5 MW)
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-538 ini terdiri dari delapan paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 paket kontrak yaitu Paket Lot 2 *Distribution Line South Takengon* dan Paket Lot 3 *Distribution Line North Takengon*. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan.

Pembebasan lahan Transmisi 150 KV : hasil penilaian lahan telah didapatkan. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan, dengan fokus pada proses negosiasi dan pembayaran. Total tapak tower yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 203 tapak. Pada Triwulan II 2018, seluruh tapak tower tersebut telah bebas.

Pembebasan lahan area pembangkit *Detour Access Road* : terdapat sengketa keluarga di persil nomor 3. PT. PLN UIP KITSUM pada tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan konsinyasi ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Takengon. PT. PLN masih menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Takengon.

Area Proyek PLTA Peusangan 1 & 2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam zona *Great Sumateran Fault* (hasil studi setelah gempa bumi pada 2 Juli 2013). Dari hasil studi tersebut dan berdasarkan hasil penggalian *tunnel* (sekitar No. 1 *Powerhouse*) diketahui bahwa No. 1 P/H Cavern terletak diantara 2 *fault*. Oleh karena itu dilakukan perubahan desain untuk *Underground Power Station* No.1 dengan mengubah dimensi *Power Station* dan menambah penguatan pada dinding setebal 1 meter. Perubahan desain ini mengakibatkan perubahan *project completion schedule* No.1 P/S menjadi 30 Oktober 2022 dan penambahan biaya.



Penambahan biaya. Telah dikaji bahwa penyelesaian kegiatan ini memerlukan tambahan (diluar nilai *loan* + anggaran PT. PLN *original*) untuk penyelesaian proyek sebesar Rp 1,54 triliun. Usulan penambahan *loan* baru sudah diajukan ke Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 16 Maret 2018 (oleh DIRREGSUM) dan disusul surat usulan DIRREN pada tanggal 4 April 2018 agar dapat dimasukkan ke dalam revisi *blue book* 2015-2019 dan *green book* 2018. Dana tambahan ini telah masuk dalam revisi *green book* 2018 pada April 2018 . Saat ini PT. PLN sedang menunggu rekomendasi dari BPKP untuk nilai *loan* yang akan diajukan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Worse Geological Condition. Area Proyek PLTA Peusangan 1&2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam zona *Great Sumateran Fault* (hasil studi setelah gempa bumi pada 2 Juli 2013). Berdasarkan hasil studi tersebut dan hasil penggalian *tunnel* (sekitar No. 1 *Powerhouse*) diketahui bahwa No. 1 P/H *Cavern* terletak diantara 2 *fault*.

Landslide. *Landslide* terjadi di sisi kanan No. 2 *Penstock Line* pada tanggal 25 September 2015 yang berdampak pada pekerjaan galian No. 2 *Powerhouse*.

Tindak Lanjut

- Telah dilakukan perubahan desain No. 1 P/H *Cavern* dengan perubahan dimensi, pembuatan *side tunnels*, menghilangkan *loosened zone* dengan *PS Anchor* dan perubahan *concrete plan*. PT PLN menginformasikan bahwa dibutuhkan penambahan biaya terkait pemindahan P/H Nomor 1. Sumber tambahan biaya ini masih didiskusikan di internal PT PLN. Perubahan desain mengakibatkan perubahan *project completion schedule* No.1 P/S menjadi 19 April 2021 dan penambahan biaya.
- *Countermeassure* yang dilakukan adalah perbaikan lereng sisi kanan dengan penambahan pembebasan tanah 9.100 m². PT. PLN UIP KITSUM akan melakukan kontrak penugasan *National Board of Expert* untuk dapat mematangkan desain pada No. 2 *Penstock Line* sehingga kelanjutan pekerjaan di No. 2 *Penstock Line* dapat berjalan kembali. Paralel dengan hal tersebut, akan dilakukan juga pembebasan *Access Road* menuju No. 2 *Penstock Line* sebagai jalan akses untuk pekerjaan di *Upper Penstock*, *Head Pond*, *Lower Penstock* dan No. 2 *Powerhouse*. Berdasarkan reuiu konsultan, *project completion schedule* No. 2 P/S menjadi tanggal Agustus 2021.



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8280-ID	26/03/2014 s/d 31/12/2019*)	USD	159,6*)	41,4	25,9	118,2	-47,9	0,0	1,9	0,0

Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman dan perpanjangan masa laku proyek sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 8 November 2017 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan



Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 ke publik melalui Koran
Sumber: www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substation
 - Lot 1: Java- Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions
- Package 2: Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations:
 - Lot 1: Java-Bali Regions
 - Lot 2: Outside Java-Bali Regions

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pekerjaan. Telah dilaksanakan Implementation Support Mission pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 untuk kegiatan IPTD II. Misi tersebut dilaksanakan dengan tujuan mereviu implementasi dari status proyek dan mendiskusikan finalisasi dari rencana restrukturisasi kedua proyek IPTD II. Hasil misi mencatat bahwa hampir semua gardu pada paket pekerjaan Grup 1 sudah energized dengan jumlah kontrak yang akan berakhir diantaranya. Namun sayangnya, kemajuan dari pekerjaan Grup 2 sangat sedikit dan berisiko bahwa pekerjaan pada Grup 2 tidak akan selesai sebelum closing date. Beberapa rekomendasi secara spesifik telah disepakati yang tertuang dalam Aide Memoire, termasuk di dalamnya menggunakan perbaikan kontraktual.

Diharapkan untuk restrukturisasi kedua IPTD-II, PT. PLN segera melakukan permohonan ke Pemerintah Indonesia pada pertengahan Juli 2018. Restrukturisasi ini dilakukan oleh PT. PLN dengan menggunakan dana dari APLN untuk membiayai paket pekerjaan di Grup 2 dan dilakukan dengan melakukan partial



loan cancellation senilai USD 22 juta dan mengubah PDO serta indikator proyek. Kemudian, akan dilaksanakan *implementation support mission* lagi pada bulan Agustus 2018.

Sementara itu, untuk kemajuan pekerjaan fisik pada Grup 1 dan Grup 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kemajuan Pekerjaan Fisik IPTD – II Triwulan II 2018

No	Paket	Kontrak				Keterangan
		Nomor	Efektif	Expired	Progres	
1	G1 P1 Lot 1	0327- 1.Pj/DAN.02.02/DIVKONJAR/2015 19 Mei 2015	30 Okt 2015	08 Mei 2018	93,32%	Proses tandatangan Amd 05 (EoT – 8 May 2018) 19 dari 21 sudah energize
2	G1 P1 Lot 2	0327- 2.Pj/DAN.02.02/DIVKONJAR/2015 19 Mei 2015	30 Okt 2015	30 Apr 2018	86,66%	Proses tandatangan Amd 05 (EoT – 30 Apr 2018) 15 dari 16 sudah energize (GI Kiliranjao dijadwalkan Agustus 2018)
3	G1 P2 Lot 1	0327- 3.Pj/DAN.02.02/DIVKONJAR/2015 19 Mei 2015	30 Okt 2015	08 Mei 2018	90,14%	Proses Amd 05
4	G1 P2 Lot 2	0327- 4.Pj/DAN.02.02/DIVKONJAR/2015 19 Mei 2015	30 Okt 2015	31 Mei 2018	90,46%	Proses Amd 05
5	G2 P1 Lot 1	0153.Pj/DAN.02.02/DITDAN/2017 05 Mei 2017	6 Okt 2017	30 Mar 2019	0,00%	Proses <i>design engineering</i>
6	G2 P1 Lot 2	0154.Pj/DAN.02.02/DITDAN/2017 05 Mei 2017	6 Okt 2017	30 Mar 2019	0,65%	Proses <i>design engineering</i>
7	G2 P3	0155.Pj/DAN.02.02/DITDAN/2017 05 Mei 2017	21 Jul 2017	12 Jan 2019	2,30%	Proses <i>design engineering</i>
8	G2 P4 Lot 1	0385.Pj/DAN.02.02/DITDAN/2017 21 Jul 2017	21 Jul 2017	21 Jan 2019	0,00%	Proses <i>design engineering</i>
9	G2 P4 Lot 2	0386.Pj/DAN.02.02/DITDAN/2017 21 Jul 2017	6 Okt 2017	30 Mar 2019	0,00%	<i>Approval drawing</i>
10	G2 P4 Lot 3	0387.Pj/DAN.02.02/DITDAN/2017 21 Jul 2017	21 Jul 2017	12 Jan 2019	0,00%	<i>Approval drawing</i>



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Paket G1 P1 Lot 1

GI Penggilingan :

- Terkendala oleh pembangunan gedung 20 KV yang akan dikerjakan oleh Disjaya, saat ini masih proses *bidding*.
- 1 busbar dalam kondisi tidak dapat dioperasikan, menyebabkan kendala pada saat pemadaman.

GI Rembang : kendala sinkronisasi kontrol sistem.

- Pengujian HV *test kompartement* GIS belum dapat dilakukan karena *overhead crane* GIS eksisting dalam keadaan rusak.
- Penyambungan busbar ke busbar eksisting memerlukan pemadaman GIS eksisting.
- Gedung 20 KV yang dikerjakan oleh PT. PLN Disjaya untuk penempatan kubikel belum selesai.
- Panel *bus riser* dan kubikel *incoming* 20 KV yang dipinjam PT. PLN TJBB belum dikembalikan.

Paket G1 P1 Lot 2

Diperlukan pemadaman untuk *install* trafo ke pondasi permanen.

Paket G1 P2 Lot 1

Beberapa GI belum bisa dikerjakan dikarenakan pekerjaan Paket 1 belum selesai dikerjakan.

Paket G1 P2 Lot 2

Beberapa GI belum bisa dikerjakan dikarenakan pekerjaan paket 1 belum selesai dikerjakan.

Paket G2 P1 Lot 1

Approval drawing masih *on proses* sehingga progres konstruksi di lapangan masih kecil.

Paket G2 P1 Lot 2

Approval drawing masih *on proses* sehingga kemajuan konstruksi di lapangan masih kecil.

Paket G2 P3

Re-design Layout, menyesuaikan dengan Eksisting GITET Cirata.

Paket G2 P4 Lot 1

Ada potensi keterlambatan *energize* karena pekerjaan *trafo bay* (Paket 2) belum terkontrak.

Tindak Lanjut

Dikoordinasikan dengan distribusi dan transmisi dan Pusmankon untuk alternatif penyelesaian kontrak.

- Melaksanakan perkaitan trafo di pondasi sementara.
- Mempersingkat durasi penyelesaian pekerjaan.
- Menyampaikan revisi jadwal pemadaman secara detail.

CGPC diminta segera menyelesaikan pekerjaan Paket 1.

CGPC diminta segera menyelesaikan pekerjaan Paket 1.

Penyesuaian *design review*, target *energize*: Januari 2019.

Menunggu kontrak pekerjaan trafo bay (Paket 2).



Paket G2 P4 Lot 2

Ada potensi keterlambatan *energize* karena pekerjaan *trafo bay* (Paket 2) belum terkontrak.

Paket G2 P4 Lot 3

Ketidaksesuaian antara Pabrikasi *Core Material* dengan *TPG requirement*.

Menunggu kontrak pekerjaan *trafo bay* (Paket 2).

Amandemen kontrak.



SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jerman (KfW)	26180	05/12/2014 s/d 31/05/2019	18,9	0,0	0,0	18,9	-77,8	13,5	0,0	0,0



❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih—Gambir
- Pembangunan UGC Senayan Incomer
- Pembangunan UGC Semanggi Barat—Semanggi Timur

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	17,80	0,0
Total		18,31	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan II 2018, jumlah kumulatif pinjaman yang terserap adalah sebesar sebesar USD 12,1 juta atau sebesar 64% dari total pinjaman. Target penyerapan selama tahun 2018 sebesar USD 13,47 juta, dan pinjaman yang sudah terserap adalah USD 12,1 juta atau 89,8% dari target penyerapan di tahun 2018. Kemajuan pekerjaan fisik mencapai 55,6%. Hal-hal yang menyangkut perijinan di ketiga lokasi proyek (ijin *trace*, IPPJU dan STLAK) telah diselesaikan/telah terbit. Masih terdapat material yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dikarenakan terhambatnya proses *custom clearance*.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Adanya perbaikan data NIK terhadap API PT. PLN mengakibatkan terjadinya pemblokiran terhadap barang PT. PLN. Ini menyebabkan terhambatnya proses *custom clearance* yang berakibat pada peningkatan biaya storage dan *demorage*.
- Surat dari Dinas Bina Marga yang menginstruksikan pemberhentian pekerjaan konstruksi selama *event* Asian Games 2018 dari 16 Juli – 30 September 2018 yang berdampak pada lokasi SKTT New Senayan *Incomer* dan SKTT Semanggi Barat.

Tindak Lanjut

- Koordinasi intensif dengan pihak bea cukai untuk membuka blokir sehingga proses *custom clearance* dapat terlaksana.
- Penyesuaian *schedule* konstruksi di kedua lokasi tersebut.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 7

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1039 01H	25/07/2014 s/d 30/06/2018	19,4	9,4	48,5	10,0	-51,5	8,8	8,3	94,7

**❖ Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- 500 KV GIS Kembangan Extension Substation
- 500 KV Conventional Muara Tawar Substation Extension
- 150 KV New Conventional Muara Tawar Substation

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	20,00	0,0
Total		20,00	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman *Scattered Transmission and Substation Package 7* yang dibiayai AFD telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Penyerapan kumulatif sampai dengan penutupan pinjaman adalah USD 9,41 juta dari total pinjaman sebesar USD 19,41 juta atau 48,5% dari total pinjaman. Dengan demikian masih terdapat sisa *loan* sebesar USD 10 juta yang tidak dapat dimanfaatkan karena pinjaman sudah berakhir dan kedua belah pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang. Adapun penyerapan pinjaman dari awal tahun 2018 hingga akhir Triwulan II 2018 adalah sebesar USD 8,33 atau sekitar 94,6 % dari total target penyerapan di tahun 2018.



Kemajuan fisik secara umum adalah sekitar 59% dari total pekerjaan. Saat ini banyak material yang diperlukan tidak datang tepat waktu sehingga pekerjaan menjadi tertunda. Pembiayaan proyek pasca penutupan pinjaman AFD akan menggunakan anggaran PT. PLN.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Pendanaan pinjaman AFD telah berakhir, sementara kemajuan fisik baru mencapai 59%.
- PT. PLN belum dapat melakukan amandeman pengalihan sumber pendanaan kontrak-kontrak dalam proyek ini karena masih menunggu surat pemberhentian pendanaan dari AFD .

Tindak Lanjut

- Menyelesaikan proyek dengan menggunakan pendanaan anggaran PT. PLN.
- Berkoordinasi dengan AFD untuk mempercepat proses keluarnya surat pemberhentian pendanaan.

**SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8**

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 8

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Nilai Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)	PV	TA 2018 (Juta USD)		
				(Juta USD)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JBIC)	28221000	19/11/2012 s/d 14/12/2018	18,7	6,7	35,7	12,0	-56,7	12,9	4,7	36,1



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear
- Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear
- Karet (Extension) 150 KV Substation
- 150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension)

❖ Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (Juta USD)	Dana Pendamping (Juta USD)
1	Pengadaan Peralatan dan Konstruksi	17,13	0,0
Total		17,13	0,0

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan akhir Triwulan II 2018, jumlah kumulatif pinjaman yang terserap pada *Scattered Transmission and Substation Project Package 8* adalah sebesar USD 6,68 juta atau 35,74% dari total pinjaman. Adapun pinjaman yang terserap dari bulan Januari hingga Juni 2018 adalah USD 4,66 juta atau 36,1% dari target pinjaman di tahun 2018. Proyek ini telah diperpanjang hingga 14 Desember 2018.

Kemajuan Pekerjaan:

1. Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear (GIS)

Rencananya akan menggunakan lahan milik PT. PLN di Udiklat Slipi, saat ini sertifikat asli sedang diurus oleh DIVUM sebagai syarat proses penerbitan IMB. Kajian kelayakan proyek (KKP) untuk alternatif penempatan GI Semanggi Barat di Udiklat Slipi sedang dievaluasi oleh P2B.



2. Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear (GIS)

Izin IMB dalam tahap kepengurusan di BPTSP. Lahan milik PLN yang awalnya diduduki oleh warga telah dilakukan penertiban dan pematangan lahan telah selesai dilaksanakan. Pemprov DKI akan membantu penerbitan IMB paralel dengan proses sertifikat.

**STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID**

Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Perancis (AFD)	CID 1024 01B	08/02/2013 s/d 30/06/2018	USD	49,5	32,3	65,3	17,2	-34,7	17,0	0,5	2,9



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Kalimantan Barat

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Substation
- Transmission Lines 275 KV
- Expansion of Existing Grid 150 KV SS+Lines
- ADSS Replacement Pontianak-Singayang
- Land Acquisition and Resettlement
- Environmental Cost
- Consulting Revoices
- Increasing Access to Power Grid
- Contingencies

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator KinerjaPelaksanaan pekerjaan telah selesai dan saat ini sedang menyusun *Project Completion Report (PCR)*.

**WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT**

Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
ADB	3015-INO	04/04/2014 s/d 30/11/2019	USD	49,5	33,6	67,8	16,0	-7,1	10,8	1,8	16,4

Catatan : Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016



Pembangunan Substation Bengkayang

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. PLN (Persero)

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network
- Construction of new distribution network in West Kalimantan
- New connections to households in West Kalimantan



❖ Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

No	Paket Kontrak/ Komponen	Nilai Kontrak	Keuangan					Fisik (%)		
			Realisasi Kumulatif		TA 2018			Realisasi Kumulatif	TA. 2018	
			Nilai	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
1	Consulting Services for Project Implementation	0,89	0,86	97,2		0,21		100		
2	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang (Paket 1)	10,16	10,16	100		0,47		100		
3	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275/150 KV Bengkayang Substation (Paket 2)	8,84	8,84	100		1,31		100		
4	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 150 Kv Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3)	11,42	10,27	89,95		1,54		98,2		
5	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4)	2,45	2,31	94,70		0,28		100		
6	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 150/20 KV Substation at Tayan, Sanggau, Sekadau (Paket 5)	4,52	0	0		0		1,2		
7	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission Lines Tayan-Sanggau. (Paket 6)*	5,60	0,65	11,7		0,65		39,3		
8	Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission Lines Sanggau-Sekadau (Paket 7)*	3,80	0,44	11,7		0,44		38,7		

Keterangan : *Paket tambahan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Usulan perpanjangan pinjaman ADB dan penggunaan mekanisme *front-loading* pinjaman AFD telah disetujui melalui surat nomor 6003/D.8/06/2018 tanggal 5 Juni 2018.

Pembebasan Lahan. Pengadaan tanah untuk tower Paket 6 (235), Paket 7 (118 dari total 125) dan Gardu Induk Paket 5 telah selesai. Sedangkan untuk kompensasi ROW, kemajuan pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- Paket 1 (Bengkayang – Ngabang) dan Paket 3 (Ngabang – Tayan) telah selesai.
- Paket 6 (Tayan – Sanggau) dan Paket 7 (Sanggau – Sekadau) identifikasi penerima ROW dilakukan pada bulan April – Oktober 2018. Pembayaran ROW direncanakan pada bulan September 2018 – Februari 2019.
- Income Restoration Program* (IRP). P1 – P4 telah dilaksanakan, dengan tambahan IRP terkait mitigasi *payment gap* dari *land use restriction* P1 akan dilaksanakan pada bulan Juni – Desember 2018.



Untuk P5 – P7 akan mulai implementasi pada bulan September – Oktober 2018 (*affected households* untuk *towers, substations*) dan Januari - Maret 2019 (*affected households* untuk ROW).

Konstruksi. Kemajuan pelaksanaan konstruksi untuk masing-masing paket yaitu:

- Paket* 1 dan 2 sudah selesai dan tersambung.
- Paket* 3 dan 4 konstruksi sudah selesai, namun *Operational Acceptance Certificate* belum diterbitkan. Selanjutnya akan ada proses penyelesaian *claim overhead* sehingga akan diusulkan amendemen kontrak untuk kedua paket.
- Paket* 5. Konstruksi sudah dimulai, saat ini dalam proses *cut and fill*. Target penyelesaian konstruksi di seluruh lokasi yaitu pada bulan Desember 2018 dengan akhir kontrak pada bulan Juli 2019.
- Paket* 6 dan 7. Pekerjaan konstruksi telah dimulai dengan kemajuan pembangunan 30 pondasi untuk P6 dan 14 pondasi untuk P7. Pembangunan pondasi tower ditargetkan selesai seluruhnya pada bulan Desember 2018. Secara paralel, akan dilaksanakan pula *tower erection* pada bulan Juni 2018 – Januari 2019 dan *stringing* pada bulan September 2018 – April 2019. Kontrak P6 akan berakhir pada 11 Mei 2019 dan P7 pada 11 April 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

PT. PLN telah mengirimkan *Environmental Safeguards Monitoring Report* untuk Semester 1 dan 2 tahun 2017 kepada ADB, namun masih belum memenuhi standar pelaporan ADB.

Tindak Lanjut

Konsultan *Environmental Safeguards* ADB melakukan pendampingan perbaikan pelaporan secara intensif pada tanggal 8 – 10 Agustus 2018.



TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
RR Tiongkok	EXIM PBC 329	29/04/2015 s/d 29/04/2020	USD	241,0	197,0	81,7	44,0	14,0	60,9	27,7	45,4



Sumber : PT. PLN

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2 x 100 MW

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak Proyek Takalar efektif tanggal 29 April 2015. Durasi kontrak untuk *Construction Takalar Coal Fired Power Plant* adalah 1.826 hari. Pembukaan L/C Proyek Takalar tanggal 28 September 2015. Sampai dengan Triwulan II 2018, kemajuan fisik kegiatan di lapangan sebesar 95,57%. Realisasi penyerapan dana pinjaman hingga Juni 2018 sebesar USD 196,95 juta. Untuk tahun 2018 dari Januari sampai dengan Juni realisasi penyerapan dana pinjaman mencapai USD 27,65 juta. Pekerjaan Unit 1 telah melakukan COD pada tanggal 19 Desember 2017.



Berikut perkembangan *Project Milestone* :

No	Milestone	Plan Unit #1*	Actual	Plan Unit #2*	Actual
1	Ground Breaking	4 Mei 2015	4 Mei 2015	4 Mei 2015	4 Mei 2015
2	First Piling	28 Nov 2015	NA	-	NA
3	Erection Steel Structure	28 Jan 2016	28 Jan 2016	28 April 2016	25 Mar 2016
4	Steam Drum Lifting	10 Juli 2016	28 Mei 2016	10 Okt 2016	25 Juni 2016
5	Hydrostatic Test	28 Jan 2017	23 Des 2016	28 April 2017	28 Des 2016
6	Back Feeding	15 Mar 2017	30 Mar 2017	15 Jun 2017	28 Mei 2017
7	First Firing	20 Juli 2017	10 Juli 2017	20 Okt 2017	16 Okt 2017
8	Steam Blow	29 Jul 2017	21 Juli 2017	29 Okt 2017	20 Okt 2017
9	Synchronization	20 Sep 2017	8 Sept 2017	20 Des 2017	06 Des 2017
10	Load Rejection	25 Sep 2017	LR 100% Postponed	25 Des 2017	
11	RR (start)	5 Okt 2017	4 Okt 2017	5 Jan 2018	09 Feb 2018
12	Performance Test	11 Nov 2017	12 Des 2017	11 Feb 2018	14 Jan 2018
13	SLO	27 Nov 2017	23 Nov 2017	27 Feb 2018	
14	COD	28 Nov 2017	19 Des 2017	28 Feb 2018	14 Feb 2018

Pekerjaan fisik sudah selesai dan kedua unit telah COD, namun masih ada beberapa pekerjaan seperti pengiriman *sparepart* (masih ada dua kali pengiriman yang dilaksanakan di Triwulan III 2018).

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) belum terbit.

Tindak Lanjut

Telah dilaksanakan pembahasan dokumen di KLHK pada November 2017, sementara kementerian meminta pemasangan *flow meter*. *Flow meter* baru akan datang di *shipment* Juni 2018 dan estimasi pemasangan selesai pada Agustus 2018.



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-560	23/10/2013 s/d 23/10/2022	JPY	5.104,0	3.218,9	63,1	1.885,1	8,6	610,1	1.018,7	100
			USD	46,2	29,1	17,1	5,5		9,2		



Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Tulehu, Provinsi Maluku

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pekerjaan *Engineering Services* untuk pembangunan PLTP Tulehu dengan kapasitas 2 x 10 MW
- Pekerjaan *Drilling*
- Pekerjaan Konsultansi

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan *Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S) Loan JICA IP-560* terdiri dari 2 kontrak paket pekerjaan yaitu Paket *Engineering Services* dan Paket Kontrak *IPM Drilling*. Hingga periode akhir Maret 2018 capaian fisik masing-masing paket adalah Paket *Engineering Services* sebesar 20,36% dan Paket *IPM Drilling* sebesar 79,17%. Pekerjaan *IPM Drilling* tanda tangan kontrak pada tanggal 24 Januari 2017, dengan nomor kontrak 0038.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, kemajuan fisik sebesar 79,17%.

Pekerjaan Selesai :

1. Pengeboran:

- Pengeboran sumur TLU-D-01 dilakukan pada 27 Juni 2017-17 Agustus 2017 (52 hari) dengan kedalaman 1712 m, maksimum T 140°C, dan permeabilitas tinggi.
- Pengeboran sumur TLU-B-01 dilakukan pada 1 September 2017-28 September 2017 (27 hari) dengan kedalaman 1800 m, maksimum T 205°C, dan permeabilitas rendah.
- Pengeboran sumur TLU-C-01 dilakukan pada 12 Oktober 2017-15 November 2017 (35 hari) dengan kedalaman 1900 m, maksimum T 184°C, dan permeabilitas rendah.
- Pengeboran sumur TLU-B-02 dilakukan pada 28 Desember 2017-30 Januari 2018 (34 hari) dengan kedalaman 1800 m, maksimum T 213°C dan permeabilitas rendah.



2. Uji Produksi :

- a. Uji Produksi TLU-D-01 dilakukan pada 5-24 Februari 2018. Hasil uji tersebut adalah sumur dapat melakukan *discharge fluida* dengan *steam flow rate* 1 t/h dan *brine flow rate* 60 t/h pada tekanan *wellhead* 3 bara, namun terdapat *scaling kalsit* pada *flow lines*.
- b. Uji Produksi TLU-B-02 dilakukan pada 5 Maret - 3 April 2018. Hasil uji tersebut adalah sumur dapat melakukan *discharge fluida* dengan total *mass flow rate* 93,6 t/h pada tekanan *wellhead* 3 bara, *steam flow rate* 11,7 t/h dan *brine flow rate* 81,9 t/h.

Pekerjaan di lapangan saat ini adalah pekerjaan penyusunan amdal untuk pembangkit dan pengurusan ijin, dan pelaksanaan revidu studi tambahan geosains untuk memastikan titik target pengeboran selanjutnya.



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)

Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8057-ID	01/05/2012 s/d 31/12/2018	USD	44,0*)	33,3	75,7	10,7	-16,7	0,0	0,6	0,0

Keterangan : *) Terjadi perubahan nilai pinjaman berdasarkan surat dari Bank Dunia per tanggal 2 Mei 2017



Pembangunan PLTA Cisokan
Sumber : www.pln.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

❖ Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan
- Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan
- Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pekerjaan. Pelaksanaan paket pekerjaan *FS Level Design* Matenggeng mencapai 94,70% dan berakhir pada Februari 2018. Untuk finalisasi *FS Level Design Report* dalam proses emorandum 4 (EOT-31 Juli 2018) dan menunggu tandatangan PLH DIRDAN1 (DIRUT). Sementara itu, untuk pekerjaan *Consultant ESIA* Matenggeng tidak diperpanjang dan berakhir pada 28 Mei 2018 dan mencapai 30% dikarenakan pihak konsultan tidak *perform*. PT. PLN melakukan pengadaan kembali untuk konsultan namun sampai saat ini masih menunggu *procurement*. Sedangkan untuk pekerjaan *capacity building* mengalami *cancellation*. Pihak Bank Dunia meminta untuk dilakukan *assesment* global mengenai *hydropower* kemudian menentukan *design* yang akan digunakan selanjutnya dengan *budget* sebesar USD 9 juta.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- a. *Pre-FS Update and Feasibility Level Design Matenggeng Pumped Storage Power Project*
 - Pembahasan revisi *Optimization Report* dan *Draft Feasibility Level Design* sudah dilakukan dengan PT. PLN, Bank Dunia, dan Konsultan.
 - Konsultan sedang menyiapkan *Final Optimization Report* dan *Revised Feasibility Level Design (FLD)*.
 - Penyampaian Final FLD akan mundur dari yang semula direncanakan pada akhir Mei 2018 menjadi akhir Juli 2018.
- b. *Consulting Services for ESIA for Matenggeng Pumped Storage Project*
 - Konsultan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harapan.
- c. *Capacity Building*
 - Perlu ada kajian internal terkait kebutuhan implementasi *Capacity Building*.
- d. PRP dan ESP MATENGGENG
 - Syarat dan mekanisme pembayaran atau administrasi yang membutuhkan waktu
 - Mr. Martin ter Woort tidak bisa mendapatkan cap dan tanda tangan dari Otoritas Pajak Kanada untuk pengisian formulir DGT-1 dan *Certificate of Residence*.

Tindak Lanjut

- Kontrak ESIA tidak diperpanjang
- Dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait teknis pelaksanaan *Capacity Building*.
- Berkoordinasi dengan DIVTRE, Bank Dunia dan KPPN terkait syarat-syarat pembayaran dan bagaimana penyelesaiannya jika ada syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh Otoritas Pajak Negara Lain.
- Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk syarat pembayaran.



PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)



**ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY PROJECT**

Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrastruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8715-ID	26/09/2017 s/d 28/02/2022	USD	200	0,0	0,0	200	-17,1	0,0	0,0	0,0

❖ **Instansi Pelaksana**

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi DKI Jakarta

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)***Establishment of Non-bank Financial Institution*❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

Kemajuan pekerjaan. Belum terdapat kemajuan yang signifikan dari proyek IIFF hingga Triwulan II 2018.
Anggaran. Pada tahun 2018, tidak terdapat DIPA untuk penerusan pinjaman.

REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (RIDF)

Bantuan modal untuk pembiayaan infrastruktur dan pengembangan kapasitas serta pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang layak memenuhi kriteria

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Bank Dunia	8714-ID	25/09/2017 s/d 31/12/2020	USD	100,0	12,5	12,5	87,5	-10,7	12,5	0,0	0,0


❖ Instansi Pelaksana

PT. Sarana Multi Infrastruktur

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Capital Support for RIDF
- RIDF Project Development Facility

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pekerjaan. Hingga Triwulan II 2018, belum terdapat kemajuan pekerjaan dari proyek RIDF.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Administrasi

Menunggu selesainya revisi PMK 121/PMK.05/2016 yang memungkinkan lembaga pembiayaan seperti PT. SMI menggunakan mekanisme pencairan Pembiayaan Langsung (PL).

Tindak Lanjut

Revisi PMK 121/PMK.05/2016 telah ditetapkan menjadi PMK 84/PMK.05/2018 pada tanggal 28 Juni 2018.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA





CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT

Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-554	28/07/2009 s/d	JPY	48.150,0	48.053,3	99,8	96,7	8,4	0,0	0,0	0,0
		28/07/2019	USD	435,8	434,9		0,9		0,0	0,0	



Pekerja sipil bawah tanah
Sumber : Kunjungan lapangan Bappenas

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- **Paket CP-101.** Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Juni 2018 sebesar 95,7%.
- **Paket CP-102.** Capaian fisik pekerjaan sampai dengan Juni 2018 sebesar 91,1%. Tersisa beberapa bidang lahan yang sedang dalam proses penelitian berkas oleh BPN. Namun, bidang lahan yang belum bebas ini tidak mengganggu aktivitas dan jadwal konstruksi.
- **Paket CP-103.** Capaian fisik pekerjaan sampai dengan Juni 2018 sebesar 89,3%. Terkait pembebasan lahan area Stasiun Haji Nawi dan Stasiun Blok A, sebagian pembebasan lahan sudah dibayarkan pada tahun 2016. Keputusan kasasi telah terbit dengan nomor 2544K/PDT/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dengan keputusan mengabulkan permohonan kasasi para pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Juni 2017. Dari bidang-bidang lahan yang dikonsinyasikan, terdapat 5 pemilik yang statusnya adalah 1) satu bidang lahan di Stasiun Haji Nawi, bangunan telah dimundurkan; 2) dua bidang lahan di stasiun Haji Nawi, sebagian dapat diakses; 3) satu bidang lahan di Stasiun Haji Nawi, lahan belum dapat diakses dan bangunan belum dibongkar; 4) satu bidang lahan di Stasiun Blok A, bangunan belum dibongkar.



- **Paket CP-104.** Kemajuan fisik di lapangan sampai dengan Juni 2018 adalah 95,2%. Terkait pekerjaan area stasiun, MRT berkoordinasi dengan Bina Marga.
- **Paket CP-105.** Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Juni 2018 sebesar 95,8%.
- **Paket CP-106.** Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Juni 2018 sebesar 98,5%.
- **Paket CP-107.** Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan detail desain dan sistem pemasangan rel. Capaian fisik sampai dengan Juni 2018 sebesar 85,8%.
- **Paket CP-108.** Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir Juni 2018 sebesar 86,9%. Pada pekerjaan paket ini terjadi keterlambatan pengiriman kereta kedua ke Depo Lebak Bulus.
- Realisasi penyerapan dana *loan* IP-554 telah mencapai 99,8% dari total pinjaman. Pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan dengan dana pinjaman dari IP-571.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- **Paket CP-107.** Keterlambatan instalasi *track*, Keterlambatan konstruksi *joint pit*, keterlambatan software AFC (*Automatic Fare Collection*).
- **Paket CP-105.** Pekerjaan CT/VT di Setiabudi terlambat karena adanya penyelesaian akibat kecelakaan runtuhnya *strut* dan *waller*.

Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan kontraktor untuk melakukan percepatan pekerjaan.
- Melakukan pekerjaan secara paralel, menambah tenaga kerja dan berkoordinasi dengan kontraktor untuk memantau produktifitas dan percepatan pekerjaan.



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE II

Tambahan Biaya Pembangunan MRT Daerah Jakarta Tahap I (Jalur Selatan-Utara, Korider Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia)

Lender	Kode Loan	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Pinjaman (Juta)	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik (Juta)	PV	TA 2018 (Juta)		
					(Juta)	%			Target	Realisasi	%
Jepang (JICA)	IP-571	31/03/2016	JPY	75.218,0	23.991,6		51.226,4		28.530,1	4.515,6	15,8
		s/d									
		31/03/2022	USD	680,8	217,1		463,7		258,2	40,9	



Sumber : www.jakartamrt.co.id

❖ Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

❖ Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman dengan *Loan Agreement* nomor IP-571 ini merupakan pendanaan lanjutan yang berdampak kepada keberlanjutan pembangunan konstruksi MRT Tahap I (yang didanai dengan *Loan Agreement* nomor IP-554). IP-571 efektif pada tahun 2016. Kumulatif penarikan pinjaman hingga periode Triwulan II 2018 sebesar JPY 23.991,59 juta.

Construction Management Consulting Services (CMCS)

Saat ini masih dilakukan *review technical design* dan metoda pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diusulkan kontraktor, serta pengawasan pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan hingga selesainya pekerjaan konstruksi. Kontrak *Construction Management Consulting Services (CMCS)* berakhir bulan Mei 2018, dalam proses perpanjangan sampai dengan April 2019.

Pada tanggal 24 Juni 2018, telah dimulai beberapa diklat untuk kesiapan operasi berupa:

1. *Training OCC dispatcher batch I* di Prasarana, Malaysia yang diikuti oleh 2 depo *dispatcher trainee*, 2 *chief dispatcher*, dan *Head of Train Operation Department*.
2. *Training Train Driver batch VI* di Prasarana, Malaysia yang diikuti oleh 9 *train driver trainee*.
3. *Training diklat dasar perkeretaapian* di API Madiun yang diikuti oleh 11 *train driver trainee batch VII*, 1 *chief dispatcher*, dan *Head of Train Driver Department*.

Engineering Study Fase - 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan)

Untuk pengadaan konsultan *Engineering Study (E/S) Fase II*, berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Teknis, konsultan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan adalah *Oriental Consultant JV*. PT MRT Jakarta telah memberikan tanggapan kepada hasil *probity audit* BPKP atas proses lelang tersebut. Secara paralel, PT. MRT Jakarta saat ini sedang menyiapkan Kontrak Konsultan E/S Fase II untuk penandatanganan.

Telah dibentuk tujuh *Joint Working Group (JWG)* internal PT. MRT Jakarta untuk mengawal proses penyusunan *Basic Engineering Design (BED)* oleh *Oriental Consultant Global Joint Venture (OCG JV)*.

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING

1 Kementerian Pertahanan

2 Kepolisian RI



KEMENTERIAN PERTAHANAN





PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Unit Organisasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2018 (Juta USD)	
				Target *	Realisasi
Mabes TNI	30,0	25,4	2,6		0,0
TNI AD	1.461,1	1.227,3	542,0	875,9	228,4
TNI AL	1.790,8	1.782,3	1.333,5		117,7
TNI AU	568,1	607,6	342,6		50,4
Total	3.850,0	3.642,7	2.220,7	875,9	396,5

Keterangan : *) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Pertahanan

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat 47 kegiatan pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) di Kementerian Pertahanan yang menjadi obyek pemantauan pada Triwulan II 2018. Total komitmen pinjaman luar negeri dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah USD USD 3.642,7 juta. Sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2018, total penarikan kumulatif pinjaman luar negeri yang terserap adalah sebesar USD 2.220,7 juta. Adapun jumlah pinjaman yang terserap dari bulan Januari hingga Juni tahun 2018 adalah sebesar USD 396,5 juta atau sebesar 45,3% dari target penyerapan di tahun 2018.

Selama bulan Januari-Juni 2018, Kementerian Pertahanan berhasil menyelesaikan 5 (lima) kegiatan Alutsista, yaitu:

1. Pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (TNI AL).
2. Pengadaan Helikopter *Full Combat SAR Mission* (TNI AU).
3. Rudal Pengganti *Rapier* (TNI AD)
4. Pengadaan Pesawat Pengganti OV-10 dan dukungannya (TNI AU).
5. Pengadaan dan Perbaikan *Sucad Avionic Hawk 109/209*.

Pada Triwulan II 2018 terdapat 31 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 6.276,7 juta. Dari 31 kegiatan tersebut, 23 kegiatan sedang dalam proses lelang, 3 kegiatan dalam proses *loan agreement*, dan 5 kegiatan menunggu untuk masuk *Green Book*.

Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Kegiatan (Juta USD)	Unit Organisasi
2015-2019	4	135	MABES TNI
	7	754,5	TNI AD
	10	2.476,7	TNI AL
	10	2.910,5	TNI AU
Total	31	6.276,7	



KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA





PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber Pinjaman	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi (Juta USD)	Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)	Penarikan Kumulatif (Juta USD)	TA 2018 (Juta USD)	
					Target	Realisasi
LPKE/KSA	2004	3,6	3,1	0,1		0,0
LPKE/KSA	2008	16,9	14,4	0,0		0,0
LPKE/KSA	2009	110,4	94,4	46,6	244,6	8,8
LPKE/KSA	2011	252,9	219,2	115,5		14,8
Total		383,8	331,1	162,2	244,6	23,6

❖ Instansi Pelaksana

Kepolisian Republik Indonesia

❖ Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada akhir Triwulan II 2018 terdapat 23 kegiatan Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi obyek pemantauan dengan total komitmen pinjaman sebesar USD 328,0 juta. Pada triwulan ini, jumlah kumulatif pinjaman yang terserap adalah sebesar USD 158 juta. Adapun realisasi pinjaman yang terserap dari bulan Januari-Juni 2018 adalah sebesar USD 19,4 juta atau 7,9% dari target penyerapan pinjaman di tahun 2018. Sampai dengan akhir Triwulan II 2018, POLRI berhasil menyelesaikan 7 (tujuh) kegiatan yakni:

1. Harsucad Pesawat.
2. Peralatan Polair.
3. Pengadaan *Amoured Water Canon*.
4. Pengembangan Industri Teknologi Kepolisian.
5. Pengadaan *Amoured Personnel Carrier (APC)* Multifungsi.
6. Pengadaan Peralatan Nubika/KBR.
7. Helikopter dengan Perlengkapan Pendukung.

Dari 16 kegiatan yang masih berjalan sampai akhir pada Triwulan II 2018 terdapat 6 kegiatan dalam proses FAT, 1 kegiatan dalam proses produksi, 2 kegiatan dalam proses persiapan lokasi, 1 kegiatan dalam persiapan distribusi, 1 kegiatan dalam proses pengiriman, 2 kegiatan dalam proses *site preparation*, 1 kegiatan dalam proses *anname/inname* peralatan 3 kegiatan dalam proses penyelesaian.

Pada triwulan ini terdapat 14 kegiatan yang belum efektif yang terdiri atas: 4 kegiatan dalam proses revisi anggaran dan 10 kegiatan dalam proses *loan agreement*. Berikut adalah rincian dari alokasi dana dari kegiatan-kegiatan yang dimaksud:

Tahun Alokasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Alokasi (USD)
2009	2	34.932.210
2011	1	7.000.000
2016	11	269.734.861
Total	14	311.667.071

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2 Kementerian PPN/Bappenas



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM

Pengelolaan Ekosistem Gunung Leuser untuk Menurunkan Deforestasi dan Merestorasi Hutan

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta EUR)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2018 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KFW	2AHFU6NL	28/11/2016 s/d 31/07/2020	8,46	1,72	20	N/A	0,9	0	0



Technical Coordination Meeting Kegiatan FIP 1

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ **Lokasi Proyek**

Provinsi Aceh

❖ **Tujuan**

Memastikan ekosistem Gunung Leuser berkelanjutan, dalam rangka menurunkan deforestasi dan merestorasi hutan yang terdegradasi, sehingga berkontribusi pada konservasi di kawasan yang memiliki salah satu cadangan karbon terbesar di Asia.



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

R1 : Mendukung pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat di 3 kabupaten dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi konservasi dan penyelesaian konflik dengan Ekosistem Gunung Leuser (minimal 40 desa), melalui kegiatan:

1. Perencanaan penggunaan lahan dan tata batas area konservasi.
2. Penerapan pendekatan pembangunan yang berorientasi konservasi termasuk Hutan Rakyat dan agroforestry.
3. Pembangunan pusat GIS untuk mendukung MRV dan perencanaan penggunaan lahan.

Pelaksana : **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh dan GFA Konsultan**

R2 : Meningkatkan kapasitas instansi terkait dalam hal konservasi, melalui kegiatan:

1. Pembentukan tambahan Unit Pengendalian Konflik CRU dan dukungan terhadap CRU yang ada.
2. Pengelolaan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.
3. Pembangunan Stasiun Rehabilitasi Orang Utan dan penelitian Orang Utan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.
4. Dukungan terhadap Taman Nasional Gunung Leuser infrastruktur dan pengembangan koridor Trumon
5. Penetapan kajian penyelesaian konflik harimau.

Pelaksana : **Balai KSDA Aceh dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan GFA Konsultan**

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- Melaksanakan *Parsipatif Rural Appraisal (PRA)*, *Partisipatory Land Use Planning (PLUP)* dan Rencana Pembangunan Desa (RPD) di 20 desa.
- Operasi 24 Kebun Bibit Rakyat dengan kapasitas 950.000 bibit.
- Membina 3 produk non-kayu (rotan/kerajinan, madu, gula aren/nipah).
- Melaksanakan patroli di 40 desa.
- Pengadaan barang dan jasa akan menggunakan *guideline* dari KfW Jerman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
<p>Pengadaan barang dan jasa Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Kawasan Konservasi, KLHK, masih memerlukan amandemen <i>Separate Agreement (SA)</i> dan amandemen kontrak konsultan.</p> <p>Lain-lain Terlambatnya penetapan penganggaran APBD/A (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Aceh) pada tahun anggaran 2018 (April 2018).</p>

Tindak Lanjut
<p>Pelaksanaan amandemen SA dan kontrak konsultan sedang didiskusikan bersama KfW Jerman.</p> <p>Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan waktu disahkannya APBD/A.</p>



FOREST PROGRAMME I

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta USD)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2018 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2007 66 089	19/10/2011 s/d 30/12/2020	20	11,5	57,5	N/A	4,1	0,9	22



Panen Semangka Kampung Pandan Sari, Kabupaten Berau
Sumber : birocan.dephut.go.id

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

- a. Provinsi DKI Jakarta
- b. Kabupaten Berau
- c. Kabupaten Malinau
- d. Kabupaten Kapuas Hulu

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan
- b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi
- c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring
- d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan
- e. REDD+ dan perhitungan karbon
- f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- a. Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Berau
 - 13 desa telah mendapatkan SK batas desa
 - Persemaian bibit : 2.514.414 bibit
 - Penanaman tanaman : 1.892.097 tanaman
 - Pemeliharaan tanaman : 1.555.456 tanaman
 - Luas area terpatroli : 153.962,24 Ha dengan frekuensi 84 kali patroli
 - Perhutanan sosial : 2 hutan desa telah mendapatkan SK dan 1 hutan desa sedang dalam verifikasi
 - HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah gaharu
- b. Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu
 - 6 batas desa telah ditandatangani oleh Bupati
 - Persemaian bibit : 730.546 bibit
 - Penanaman tanaman : 727.657 tanaman
 - Pemeliharaan tanaman : 299.815 tanaman
 - Luas area terpatroli : 128.595,93 Ha dengan frekuensi 124 kali patroli
 - Perhutanan sosial : 5 hutan desa telah mendapatkan SK dan 4 hutan desa sedang dalam proses
 - HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah madu, bambu, dan rotan
- c. Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Malinau
 - 6 desa telah menyepakati batas desa
 - Penanaman dan pemeliharaan tanaman : 124.759 tanaman
 - Luas area terpatroli : 98.136,24 Ha dengan frekuensi 90 kali patroli

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi

Invoice belanja jasa konsultan bulan April 2018 belum dibayarkan karena terdapat kesalahan kode KPPN di dalam DIPA dan DIPA dalam proses revisi di Kanwil Perbendaharaan Jakarta.

Tindak Lanjut

Follow up proses revisi DIPA di Kanwil Perbendaharaan.



FOREST PROGRAMME II

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta EUR)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2018 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KfW	2011 66 255	01/01/2016 s/d 31/12/2022	23	3,64	15,8	N/A	2,9	0,24	8,2



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Jambi:
- a. Kabupaten Merangin
 - b. Kabupaten Sarolangun
 - c. Kabupaten Bungo
 - d. Kabupaten Kerinci

❖ Tujuan

- a. Berkurangnya tekanan terhadap sumber daya hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan penguatan kapasitas kelembagaan TNKS
- b. Terehabilitasinya lahan kritis yang berada di bagian hulu dan tengah sub-sub DAS Merangin
- c. Memantapkan penggunaan lahan oleh masyarakat yang berbatasan dengan TNKS melalui fasilitasi yang dilakukan atas kerjasama antara BPDAS Batanghari dan TNKS, serta melalui perencanaan penggunaan lahan yang partisipatif dan implementasi terhadap rencana penggunaan lahan tersebut.



❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Tutupan lahan berhutan di areal proyek, peningkatan sedikitnya 7.500 Ha di lokasi 1 dan 2 yang menjadi sasaran program inti rehabilitasi DAS
- b. Keberhasilan penanganan atau penyelesaian konflik-konflik manusia – satwa di areal kunci program
- c. Populasi khususnya Harimau Sumatera di lokasi 1 dan Gajah di lokasi 2 distabilkan
- d. 90% bantuan mata pencaharian dan penanaman akan mencapai target di dalam rencana usaha pada masa proyek
- e. Jumlah dan mutu air di areal terpilih untuk rehabilitasi dan konservasi distabilkan
- f. Inovasi yang diperoleh dari program/proyek akan digunakan untuk memperkuat program pemerintah/alat efektif pengelolaan

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

- a. BPDASHL Batanghari
 - Melakukan kegiatan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) seperti pemodelan dan membuat forum pembahasan tentang DAS
 - Melakukan koordinasi seperti rapat, *workshop* (teknis dan manajemen), dan pelatihan kepada masyarakat serta fasilitator desa
- b. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat
 - Membangun sarana dan prasarana Taman Nasional Kerinci Seblat
 - Melakukan kegiatan kapasitas gerak taman
 - Melakukan koordinasi seperti rapat, *workshop* dan mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk meningkatkan ekowisata
- c. Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
 - Persiapan daerah kehutanan sosial untuk akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan
 - Penguatan kewirausahaan masyarakat terhadap usaha kehutanan
 - Melakukan koordinasi seperti rapat dan *workshop* untuk resolusi konflik di BPSKL Sumatera



FOREST PROGRAMME III

Pengembangan dan Implementasi Keanekaragaman Hayati dan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Tengah

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Nilai Hibah (Juta EUR)	Penarikan Kumulatif		PV	TA 2018 (Juta EUR)		
				(Juta EUR)	%		Target	Realisasi	%
KFW	2012 67 004	28/11/2016 s/d 31/12/2023	13,5	9,0	65	N/A	5,0	0,2	4,0



Kick Off Project Forest Programme III- Sulawesi
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

❖ Lokasi Proyek

- Provinsi Sulawesi Tengah:
- Kabupaten Sigi
 - Kabupaten Poso

❖ Tujuan

Implementasi pengelolaan kerjasama yang terpadu di Taman Nasional Lore Lindu, sehingga mendukung Indonesia dalam mengembangkan strategi dan implementasi terhadap tindakan-tindakan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan DAS dalam rangka strategi REDD+ di Sulawesi Tengah.

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati
- Perbaikan dan rehabilitasi DAS sebagai bagian hulu di bentang alam Lore Lindu
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar batas kawasan konservasi
- Mendukung kerjasama untuk penelitian dalam lingkup keanekaragaman hayati dan iklim



❖ **Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja**

- a. Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati
 - Sudah mencapai 20 CCA (*Community Carbon Accounting*) dari 40 target CCA
 - Sudah melakukan demarkasi batas di 5 desa dari total target 40 desa
- b. Rehabilitasi DAS
 - Sudah melakukan RPE (Rencana Pemulihan Ekosistem)
 - Dari rehabilitasi lahan 700 Ha sudah tercapai pada tahun 2017 : 120 Ha dan pada tahun 2018 : 300 Ha
 - Pembangunan DAM sudah dilakukan, tahun 2017 : 20 DAM, tahun 2018 : 5 DAM dan 20 SPAS
- c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 - Telah dilakukan penyuluhan sejak 2017 oleh 14 fasilitator
 - Pembangunan desa dari target 40 desa telah dicapai 2 desa pada tahun 2018
- d. Meningkatnya Kerjasama Stakeholder
 - Bekerjasama dengan IPB dan Universitas Gottingen dalam *workshop* penelitian
 - Dalam proses membuat forum Cagar *Biosphere*, forum DAS, dan forum REDD+



SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO

Peningkatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	8548-INO	07/04/2014 s/d 28/02/2018	USD	4,5	1,9	41	2,6



Wrap-up Meeting Kegiatan Midterm Review Mission

❖ **Instansi Pelaksana**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem - Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi,

❖ **Lokasi Proyek**

- a. Desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Desa Punan Long Adiu, Kabupaten Malinau

❖ **Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)**

- a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan
- b. Penyelenggaraan REDD+ di tingkat subnasional
- c. Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan
- d. Pengelolaan proyek berjalan efektif

❖ **Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	Climate Change Fund	1.250.000
2	RCIF	700.000
3	GE Facility	2.527.273
Total		4.477.273



❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Pinjaman telah berakhir pada tanggal 28 Februari 2018. Laporan akhir konsultan dalam proses finalisasi. Beberapa capaian besar selama pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Telah dilakukan sekitar 25 pelatihan tentang Pengelolaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati untuk Pemda dan Pemprov lingkup HOB, TN Betung Kerihun Danau Sentarum, TN Kayan Mentarang, Desa Nanga Lauk dan Desa Punan Adui.
 - b. Fasilitasi rapat persiapan mendukung *HoB 10th & 11th trilateral meeting*.
 - c. Laporan survei keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi di TN BKDS dan TNKM, Hutan Desa Nanga Lauk, Hutan wilayah adat Desa Punan Adui.
 - d. *Project Document Design* untuk *Plan Vivo* Desa Nanga Lauk dan Desa Punan Adui telah disetujui oleh *Plan Vivo foundation*.
 - e. *Management Plan* untuk *Verified Conservation Areas* telah disetujui oleh *VCA board*.
 - f. Draft Perda tentang Pembayaran Jasa Lingkungan di Kab. Kapuas Hulu dan Malinau.
 - g. Pelatihan dan *small investment* untuk *livelihood* Desa Nanga Lauk dan Punan Adui (rotan, bokar, ekowisata, agroforestry).
2. *Output 1: Strengthening Capacity and Institutions for Sustainable Forest and Biodiversity Management*
Program peningkatan kapasitas melingkupi pelatihan-pelatihan baik teknis maupun non teknis dan rapat-rapat koordinasi antar instansi terkait *Heart of Borneo (HoB)*. Hingga Triwulan IV 2017 mayoritas kegiatan telah teralisasi sesuai *work plan*. Selama Triwulan I 2018, beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Pelatihan *Sustainable Financing and Business Planning* untuk KPH dan TN BKDS dan TNKM.
 - b. Survei keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi di TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum dan TN Kayan Mentarang.
3. *Output 2: Exercise the REDD+ Implementation at Local Level*
Beberapa kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2018 meliputi:
 - a. Kunjungan penilaian tim RSPO ke Desa Nanga Lauk pada tanggal 13 – 14 Maret 2018.
 - b. Pelatihan pembibitan pohon untuk Desa Nanga Lauk.
 - c. Studi banding pengelolaan hutan desa ke LPHD Lamatsatong dan LPHD Pelang – untuk LPHD Nanga Lauk.
 - d. Pengadaan peralatan patroli hutan, pembangunan 2 menara api dan 1 rumah patroli.
 - e. Pelaksanaan patroli hutan di hutan desa Nanga Lauk dan desa Punan Adui pada bulan Februari 2018.
4. *Output 3: Establish Pilot Area for Payment Ecosystem Services (PES) and Sustainable Financing Schemes for Forest and Biodiversity Management*
Beberapa kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2018 meliputi:
 - a. Raperda Pembayaran Jasa Lingkungan Kab. Kapuas Hulu difinalisasi di Biro Hukum Provinsi dan menunggu nomor registasi peraturan.
 - b. Pembangunan rumah Taman Baca di Desa Nanga Lauk.
 - c. Studi banding pengelolaan ekowisata ke TN Tanjung Putting untuk Desa Nanga Lauk.
 - d. Penanaman 4000 bibit *agroforestry* (mangga, petai, gaharu, durian, rambutan, ulin) di Muara An dan Muara Aren - Desa Punan Adui pada bulan Februari 2018.
5. *Output 4: Effective Project Management Delivered*
Beberapa kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2018 meliputi:
 - a. Fasilitasi Direktorat PJLHK untuk percetakan 700 buku tentang pemanfaatan jasa lingkungan air.
 - b. Fasilitasi pengembangan *website* Direktorat PJLHK.
 - c. Pembuatan video promosi tentang sertifikasi *plan vivo* di Desa Nanga Lauk dan Desa Punan Adui.
 - d. Penyampaian kembali *final reports* oleh PMC pada bulan April 2018.



Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain

- Proyek telah berakhir pada bulan Februari 2018, namun masih diperlukan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan konservasi dan patroli serta audit dalam rangka sertifikasi *plan vivo* dan VCA pada akhir tahun 2018.
- Beberapa kegiatan *livelihood* (seperti pemasangan pipa air bersih di Desa Punan Adiu dan pembuatan pembibitan di Desa Nanga Lauk) belum terealisasi yang dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat desa terhadap proyek selanjutnya.

Tindak Lanjut

Berdasarkan saran dari ADB, kegiatan yang belum terlaksana dimasukkan ke dalam hibah *Forest Investment Program* (FIP) 1. Dari hasil diskusi lebih lanjut, Desa Nanga Lauk telah masuk menjadi salah satu Desa target FIP 1. Proses koordinasi antara Dit. PJKLHK dan *executing agency* FIP 1 akan terus ditingkatkan. Namun untuk keberlanjutan di Desa Punan Adiu belum ada kepastian dan tidak bisa dimasukkan ke dalam porsi FIP 1 karena perbedaan lokasi kegiatan. Perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk mencari alternatif pelaksanaan kegiatan di Desa Punan Adiu.



COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1)

Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan melalui intervensi kegiatan proyek

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0510-INO	06/12/2016 s/d 30/06/2022	USD	17	0	0	0



Technical Coordination Meeting Kegiatan FIP 1

❖ Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- a. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
- b. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- c. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

❖ Lokasi Proyek

- a. Kabupaten Sintang
 - KPHP Sintang/Merakai
- b. Kabupaten Kapuas Hulu
 - KPHP Kapuas Hulu
 - KPHK Betung Kerihun Danau Sentarum

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- a. Terlaksananya “Community-focused and Gender Responsive REDD+ Pilots” di 17 desa di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Terlaksananya strategi REDD+ secara efektif di Provinsi Kalimantan Barat
- c. Penyelarasan kebijakan fiskal REDD+ antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hibah. Penandatanganan hibah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2016. *Project Management Unit* (PMU) Pusat akan dibentuk melalui SK Sekjen KLHK yang saat ini masih dalam proses, dan Tim Teknis daerah melalui SK Gubernur/Kepala Dinas Kehutanan. Dokumen perencanaan seperti *Overall Work Plan* (OWP) dan *Annual Work Plan* (AWP) telah disusun dan disampaikan ke ADB. Pada tanggal 11-17 Juli 2018, ADB telah melakukan *inception mission* hibah dan melakukan kunjungan lapangan serta pertemuan dengan pihak-pihak terkait, baik di pusat maupun daerah. Hasil misi tersebut dituangkan kedalam *aide memoire*.

Konsultan. Konsultan *Project Implementation Supporting Unit* (PISU) sudah terkontrak pada 14 Desember 2017.

Lainnya. Terdapat rencana penambahan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari hibah *Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo* di Desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu.



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	8548-INO	19/06/2013 s/d 30/06/2018	USD	1,5	1,14	7,6	0,37



Konsultasi Publik (*Output 1 Country Safeguard Review*)



Launching Manual Project Readiness Criteria (*Output 3*) pada ADB Country Portfolio Review Mission

❖ Instansi Pelaksana

- Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan - Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang-BPN

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

- Harmonisasi ADB's *Safeguard Policy Statement* dengan *Safeguard System* di Indonesia
- Harmonisasi prosedur pengadaan (*procurement system*) antara ADB dengan Indonesia
- Penguatan persiapan proyek
- Pembangunan kapasitas (*capacity building*)



❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	Consultants	1.014.000
2	Equipment	20.000
3	Training/Seminar	305.000
4	Administration	20.000
5	Contingency	141.000
Total		1.500.000

Catatan: Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi pendampingan dalam bentuk staf pendamping, pengkajian keluaran, ruang kerja, bantuan konsultasi, dan bentuk pendampingan lainnya

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Keluaran 1 : Komponen Upaya Sistem Perlindungan (Safeguard).

Sejak pertengahan 2017, ADB bersama dengan PT. PLN melaksanakan penilaian kesetaraan dan akseptabilitas penggunaan *Country Safeguards System (CSS)* untuk perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela di tingkat Lembaga (PT. PLN). Adapun keluaran yang dihasilkan sampai dengan saat ini antara lain: (i) laporan akhir terhadap penilaian kesetaraan dan akseptabilitas untuk perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela; (ii) rencana aksi (*action plan*) untuk mengisi kesenjangan yang telah teridentifikasi melalui penilaian tersebut; (iii) laporan konsultasi perihal hasil penilaian dan rencana aksi dengan berbagai kepentingan yang telah diselenggarakan oleh PT. PLN, Kementerian PPN/Bappenas, dan ADB.

a. **Laporan Penilaian Kesetaraan untuk Upaya Sistem Perlindungan Lingkungan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.** Revisi draf laporan penilaian kesetaraan CSS PT. PLN terkait upaya perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela telah dilakukan dengan memperimbangan berbagai masukan dari konsultasi pada akhir 2017 dan awal 2018, serta masukan tertulis dari beberapa organisasi masyarakat sipil. Terdapat beberapa perubahan hasil penilaian kesetaraan, dimana beberapa elemen yang sebelumnya *full equivalence* menjadi *partial equivalence*. Revisi laporan ini akan dikonsultasikan lebih jauh dengan elemen organisasi masyarakat sipil (CSO). Laporan final penilaian kesetaraan akan diselesaikan pada bulan Agustus 2018.

b. **Laporan Penilaian Akseptabilitas untuk Upaya Sistem Perlindungan Lingkungan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.** Draft laporan penilaian akseptabilitas terhadap PT. PLN untuk penggunaan CSS telah disiapkan dan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan pada akhir 2017 hingga awal 2018. Laporan akseptabilitas memuat penilaian kapasitas institusi PT. PLN, baik di tingkat pusat maupun unit, prosedur dan praktik-praktik pelaksanaan kebijakan, hasilnya (*output*), dan juga manfaatnya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan serta mata pencaharian warga terkena dampak. Masukan selama konsultasi dan masukan tertulis dari organisasi masyarakat sipil (CSO) serta pendalaman kajian pelaksanaan proyek telah digunakan untuk merevisi laporan yang kemudian dikonsultasikan kembali dengan CSO. Laporan penilaian final akseptabilitas akan diselesaikan pada bulan Agustus 2018.

c. **Rencana Aksi untuk Upaya Sistem Perlindungan Lingkungan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.** Rencana aksi untuk mengisi dan menindaklanjuti temuan kesenjangan (*gap*) untuk kesetaraan dan peningkatan kapasitas dan prosedur pelaksanaan CSS oleh PT. PLN telah disiapkan dan dikonsultasikan bersamaan dengan konsultasi penilaian kesetaraan dan akseptabilitas. Revisi



rencana aksi telah dilakukan berdasarkan berbagai masukan serta pendalaman penilaian. Rencana aksi final juga telah didiskusikan dan disepakati antara ADB, PT. PLN, dan Kementerian PPN/Bappenas. Rencana aksi ini nantinya akan dibuat menjadi legal formal melalui Surat Keputusan Direksi PT. PLN, sehingga penggunaan sistem upaya perlindungan negara (CSS) untuk proyek-proyek PT. PLN mendatang yang akan didanai melalui pinjaman ADB memiliki dasar aturan. draf Surat Keputusan Direksi PT. PLN telah disiapkan dan diharapkan akan dilegalisasikan pada bulan Agustus 2018.

2. Keluaran 2 : Komponen *Procurement*.

- a. **Laporan Penilaian Risiko pada Sektor Pengadaan Barang/Jasa.** Laporan Penilaian Risiko telah diselesaikan dan akan diperbaharui untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru ADB terkait pengadaan.
- b. **Pengembangan Dokumen dan Sistem lelang terstandarisasi untuk dipergunakan oleh proyek-proyek yang didanai oleh ADB.**
 - i. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) *International Competitive Bidding* (ICB) untuk seleksi jasa konsultan yang sesuai dengan standar prosedur ADB sudah diaplikasikan di Kementerian PUPR untuk beberapa proyek yang dibiayai ADB. Kedepannya akan ditingkatkan penggunaannya untuk proyek ADB lainnya yang masuk dalam *pipeline* 2018-2020.
 - ii. SPSE ICB untuk pekerjaan sipil telah dikembangkan dan diterapkan dalam proyek ADB di Kementerian PUPR.
 - iii. SPSE ICB untuk pengadaan barang sedang dikembangkan, termasuk juga untuk jasa konsultan dengan metode seleksi lain. Ditargetkan dokumen ini telah selesai di Triwulan III 2018.
 - iv. Draf SBD (*Standard Bidding Document*) ICB untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah selesai. Finalisasi dokumen terkait akan dikonsultasikan terlebih dahulu oleh LKPP dengan Kementerian Keuangan sebagai calon pengguna.
 - v. Dokumen SBD untuk NCB (*National Competitive Bidding*) telah diharmonisasikan dan digunakan dalam proyek-proyek pendidikan yang didanai oleh ADB.

3. Keluaran 3 : Komponen Penguatan Kesiapan Proyek (*Project Readiness Criteria*).

- a. **Panduan untuk persiapan kriteria kegiatan** telah selesai disusun. *Soft launch* dilakukan dalam acara ADB *Country Portfolio Review Mission* tanggal 17 April 2018 yang dibuka oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
- b. **Panduan dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia** (*softcopy*) sudah diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk keperluan *disclosure* pada situs resmi Kementerian PPN/Bappenas.



SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)

Donor	Kode Hibah	Masa Laku	Mata Uang	Nilai Hibah (Juta)	Penarikan Kumulatif*		Hibah Belum Ditarik (Juta)
					(Juta)	%	
ADB	0013-INO	17/06/2013 s/d 30/06/2019	USD	16,6	7,9	47,6	8,7

Keterangan : *Berdasarkan data Triwulan I 2018



❖ Instansi Pelaksana

Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana - Direktorat Transportasi

❖ Lokasi Proyek

Nasional

❖ Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Technical Assistance (TA) dan Capacity Building untuk meningkatkan kesiapan kegiatan dan pengembangan rencana kegiatan di sektor energi, perkotaan, air dan sanitasi, infrastruktur desa, transportasi, dan reformasi infrastruktur melalui layanan kebijakan dan konsultasi; penguatan kapasitas lembaga; membantu persiapan proyek infrastruktur; dan membagi pengetahuan dan pembelajaran selama implementasi SIAP. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh suatu tim manajemen kecil.

❖ Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Alokasi Dana (USD)
1	TA 8484 Technical Assistance Cluster Management Facility	3.500.000
2	TA 8508 IKK Water Supply Sector (closed)	626.969
3	TA 8506 Scaling Up Hydropower Development Project (closed)	382.263
4	TA 8518 Green Cities: A Sustainable Urban Future in Indonesia (closed)	839.483
5	TA 8530 Strengthening Community Participation in Project Design, Implementation and Monitoring in Regional Roads Development Projects	1.000.000
6	TA 8666 Capacity Development for the Metropolitan Sanitation Management Investment Project	2.272.000
7	TA 9116 Improving Multimodal Connectivity to Support Integrated Land and Sea Tollway (closed)	933.796
8	TA 9133 Strengthening Verification in Results-Based Programs in Indonesia's Power Sector	935.000



9	TA 9109 Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery	1.000.000
10	TA 9362 Strengthening Results-Based Lending Independent Monitoring in Irrigation	800.000
11	TA 9361 Facilitating Regional Cooperation and Integration between Indonesia and Timor-Leste through Enhanced Cross-border Cooperation	200.000
12	Preparation of the Enhanced Water Security Investment Project	1.000.000
13	Energy Sector Assessment and Priorities, 2010-2024	1.000.000
14	Strengthening Procurement for Faster Infrastructure Delivery (endorsed; pending approval)	750.000
15	Supporting Sustainable and Universal Electricity Access in Indonesia (endorsed; pending approval)	1.500.000
16	Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services (proposed; pending endorsement)	750.000
17	Municipal Bond Issuance and Infrastructure Finance (proposed; pending endorsement)	500.000
Total		19.047.510

❖ Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. SIAP merupakan hibah dari Pemerintah Australia (DFAT) kepada Pemerintah Indonesia yang diadministrasikan melalui ADB. Nilai hibah ini mulanya sebesar USD 16,6 juta yang bersumber dari Pemerintah Australia (AUD 20 juta/USD 16,37 juta) dan *the Bill and Melinda Gates Foundation* (USD 0,27 juta). Terdapat tambahan hibah dari DFAT sebesar USD 5 juta sehingga total nilai hibah menjadi USD 21,6 juta.
2. TA SIAP dimanfaatkan untuk membiayai 17 *subprojects* (4 tutup, 9 *on-going*, dan 4 rencana) senilai USD 19,05 juta dan untuk membiayai 19 *quick response advisory services* (13 tutup, 5 *on-going*, dan 1 rencana). 2 rencana *subprojects* yang masih menunggu persetujuan rencananya akan mulai efektif pada Triwulan III 2018.
3. Pada beberapa pertemuan *steering committee* yang diadakan selama tahun 2017 dan 2018, dilakukan pembahasan terkait rencana hibah baru SIAP 2. Saat ini rencana hibah masih dalam pembahasan dan akan diusulkan untuk masuk ke dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH). *Executing Agency* untuk SIAP 2 rencananya masih sama dengan SIAP, yaitu Kementerian PPN/Bappenas (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana).
4. Terdapat rencana perpanjangan masa laku hibah untuk mengakomodasi penyelesaian kontrak beberapa *subprojects* yang saat ini masih berjalan. Usulan tersebut perlu dibahas lebih lanjut.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id
